

Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise

Restauration de l'ancienne Sambre au Nouvion en Thiérache



compte rendu n° 1

réunion du 27 07 2016

Rédacteur : Jérôme LINDEKENS

Version du document : 1

Diffusé le : 05/08/2016

Titre / société	Abré.	Noms	Tel	Fax	Mail	P	A.E.	A.N.E.	A.C.	D.	Procha in rdv
MAITRISE D'OUVRAGE											
Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise	MO	Mr PACAUD Geoffrey	03 23 20 36 74	03 23 20 36 76	union-des-syndicats@griv.fr	X				X	X
SIBOBA		Mr DUDIN José	06 70 05 31 52			X				X	X
MAITRISE D'ŒUVRE											
Verdi Ingénierie Picardie	MOE	Jerome LINDEKENS	03 23 05 72 41 06 89 82 29 96	09 72 13 45 60	jlindekens@verdi-ingenierie.fr	X				X	X
ENTREPRISES TITULAIRE DES TRAVAUX											
IDverde	IDV	Christophe BRUYERRE	03 27 67 58 09 06 76 86 68 43	03 27 67 58 33	Christophe.bruyerre4@orange.fr	X				X	X

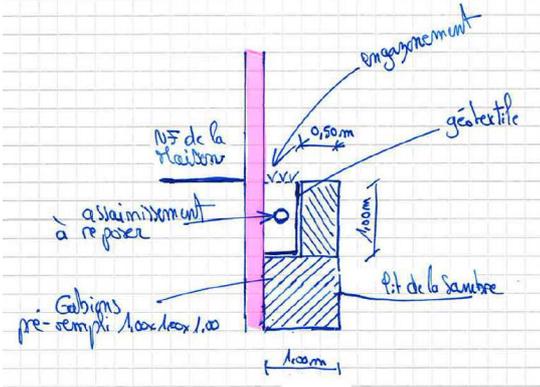
PROCHAINES REUNIONS

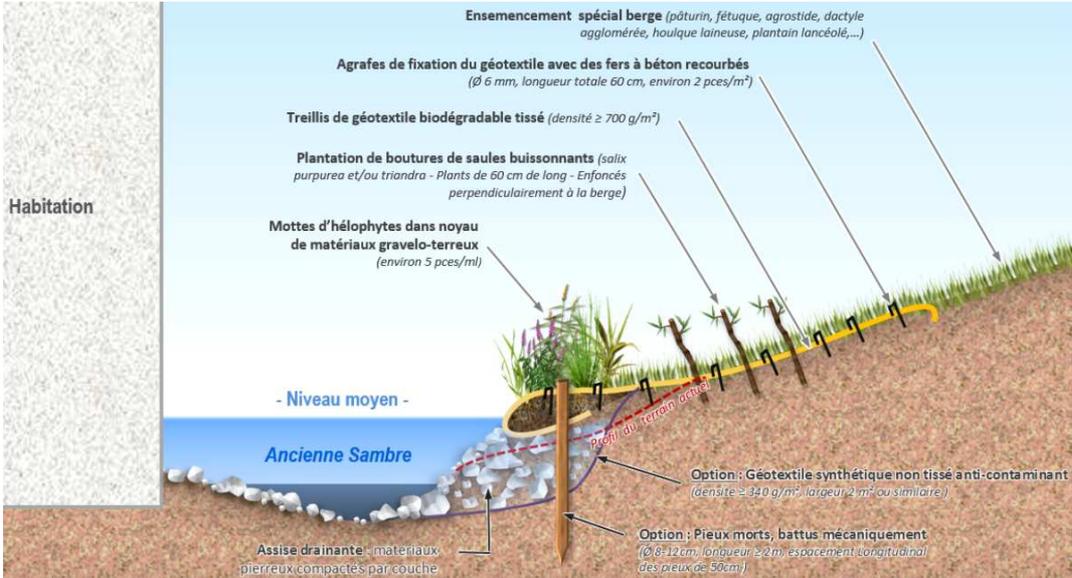
N°	DATE	HEURE	LIEU	OBJET	CONVOCATIION
2	19/08/2016	9h00	Site des travaux	Réunion de démarrage	Cf. tableau ci-dessus

Le compte-rendu de chantier est considéré comme accepté sans réserve s'il n'a pas fait l'objet d'observation écrite avant ou pendant le rendez-vous de chantier suivant.
R1 : premier rappel, **R2** : deuxième rappel, **R3** : troisième rappel. A l'issue du 3eme rappel, la relance est faite par courrier ; PM : Pour Mémoire

P :	Présent
A.E. :	Absent excusé
A.N.E. :	Absent Non Excusé
A.C. :	Absence Cumulée
D. :	Diffusion

Emetteur	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
Etat administratif			
MO	Notification le 07/07/2016 Période de préparation 1 mois Délai de réalisation des travaux : 6 mois		
MOE	OS n°1 de démarrage de la période de préparation des travaux au 22/07/2016		MO IDV
Planning / Avancement			
Documents remis			
MO	CD sur lequel il y a : <ul style="list-style-type: none"> • Projet de SINBIO • Carto et profils d'IDVERDE • DCE • DE et BPU d'IDVERDE 		MOE
Documents à fournir			
MOE	Demandes d'agrément des matériaux et des types de plantations Planning des travaux	12/08	IDVERDE
Points Validés			
MOE	IDVERDE propose de créer les banquettes végétalisées à l'aide d'une natte biodégradable en fibres de coco, plantée d'hélophytes. Ce procédé déjà réalisé sur un autre chantier a été accepté par le MO.	27/07	IDVERDE MO
MOE	<p>Au niveau du profil n°4, coté rive gauche le long de la maison il était prévu 4 boudins ensemencé et planté d'hélophytes. Sur cette portion il a été décidé de réaliser un enrochement au pied de la maison n°18 de la rue du rejet suivant le croquis ci-dessous.</p>	27/07	IDVERDE MO

Emetteur	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
Points à valider lors de la prochaine réunion			
MOE	<p>Le procédé qui consistait à réaliser 4 boudins ensemencés et plantés d'hélophytes n'est pas adapté le long de la maison cf. photo ci-dessous.</p>  <p>Nous proposons de réaliser à la place la mise en place de Gabion suivant croquis ci-dessous.</p>  <p>IDVERDE devra rendre un chiffrage de la solution proposée.</p>		TOUS
MOE	<p>MO demande à IDVERDE de ne pas réaliser du TD15 et TG9 jusqu'en amont de la Sambre les bouturages et les plantations d'hélophytes dans les zones où il est indiqué :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bouturage (1u/ml) et entretien préalable • Bouturage en poquet (5u/5ml) et entretien préalable • Plantations d'hélophytes (3u/ml) et entretien préalable 		IDVERDE

Emetteur	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
MOE	<p>MO souhaite réaliser la partie amont qui n'était pas initialement prévu dans les travaux notamment en :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyant la Sambre de ses détrituf cf. photo ci-dessous  <ul style="list-style-type: none"> • Aménageant la rive gauche suivant plan type ci-dessous 		

Sans remarques de la part des participants durant 6 jours, ce compte rendu devient contractuel.
