

# Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise

## Restauration de l'ancienne Sambre au Nouvion en Thiérache



compte rendu n° 2

réunion du 19 08 2016

Rédacteur : Jérôme LINDEKENS

Version du document : 1

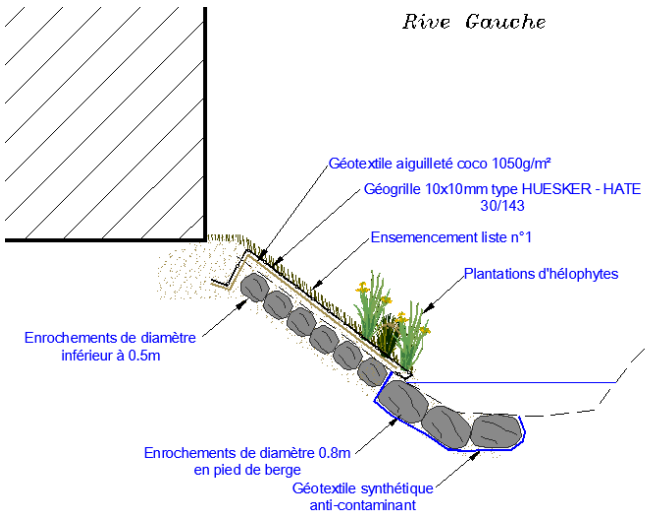
Diffusé le : 19/08/2016


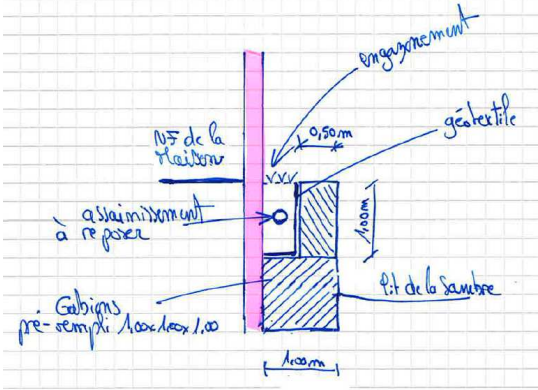
Titre / société	Abré.	Noms	Tel	Fax	Mail	P	A.E.	A.N.E.	A.C.	D.	Procha in rdv
<b>MAITRISE D'OUVRAGE</b>											
Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise	MO	Mr Geoffrey PACAUD	03 23 20 36 74	03 23 20 36 76	union-des-syndicats@griv.fr	X				X	
		Mr Guillaume FELZINGER				X					X
SIABOA	SIA	Mr José DUDIN	06 70 05 31 52		Syndic.siaboa@akeonet.com	X				X	X
		Mr Raymond PREDHOMME				X					X
		Mr Guy MAILLET				X					X
<b>COMMUNE</b>											
Adjointe à la mairie	COM	Mme Roselyne CAIL				X					X
Service technique		Mr Francis DURAND			Francis.durand@lenouvion.com	X				X	X
<b>MAITRISE D'ŒUVRE</b>											
Verdi Ingénierie Picardie	MOE	Jerome LINDEKENS	03 23 05 72 41 06 89 82 29 96	09 72 13 45 60	jlindekens@verdi-ingenierie.fr	X				X	X
<b>ENTREPRISES TITULAIRE DES TRAVAUX</b>											
IDverde	IDV	Christophe BRUYERRE	03 27 67 58 09 06 76 86 68 43	03 27 67 58 33	Christophe.bruyerre4@orange.fr		X			X	X
		Mr Laurent RICQUE	03 27 21 71 00 06 76 12 83 29		Laurent.ricque@idverde.com	X				X	
<b>PROCHAINES REUNIONS</b>											
N°	DATE	HEURE	LIEU	OBJET	CONVOCAION						
<b>3</b>	<b>09/09/2016</b>	<b>10h00</b>	<b>Site des travaux</b>	<b>Avancement des travaux</b>	<b>Cf. tableau ci-dessus</b>						


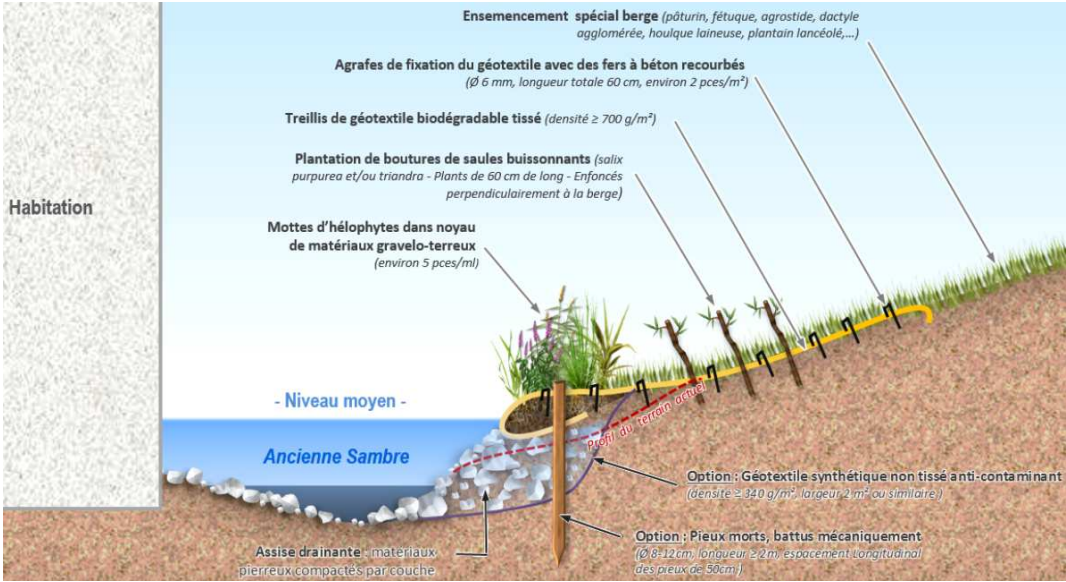
Le compte-rendu de chantier est considéré comme accepté sans réserve s'il n'a pas fait l'objet d'observation écrite avant ou pendant le rendez-vous de chantier suivant.

R1 : premier rappel, R2 : deuxième rappel, R3 : troisième rappel. A l'issue du 3eme rappel, la relance est faite par courrier ; PM : Pour Mémoire

P :	Présent
A.E. :	Absent excusé
A.N.E. :	Absent Non Excusé
A.C. :	Absence Cumulée
D. :	Diffusion

Emetteur	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
<b>Etat administratif</b>			
MO	Notification le 07/07/2016 Période de préparation 1 mois Délai de réalisation des travaux : 6 mois		
MOE	OS n°1 de démarrage de la période de préparation des travaux au 22/07/2016 <b>OS n°2 de démarrage des travaux à réaliser au 02/09</b>		MO IDV
<b>Planning / Avancement</b>			
MOE	<b>Pour ne pas empiéter sur la fête foraine de la commune et pour des raisons de sécurités le démarrage des travaux est repoussé au 02 septembre 2016.</b>		TOUS
<b>Documents remis</b>			
<b>Documents à fournir</b>			
MOE	Demandes d'agrément des matériaux et des types de plantations : <b>Rappel du 19/08</b> Planning des travaux : <b>Rappel du 19/08</b>	26/08	IDV
MOE	<b>Chiffrage en plus et en moins des adaptations demandées.</b>	09/09	IDV
<b>Points Validés</b>			
MOE	IDVERDE propose de créer les banquettes végétalisées à l'aide d'une natte biodégradable en fibres de coco, plantée d'hélophytes. Ce procédé déjà réalisé sur un autre chantier a été accepté par le MO.	27/07	IDVERDE MO
MOE	<p>Au niveau du profil n°4, coté rive gauche le long de la maison il était prévu 4 boudins ensemencé et planté d'hélophytes. Sur cette portion il a été décidé de réaliser un enrochement au pied de la maison n°18 de la rue du rejet suivant le croquis ci-dessous.</p> 	27/07	IDVERDE MO

Emetteur	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
MOE	<p>Le procédé qui consistait à réaliser 4 boudins ensemencés et plantés d'hélophytes n'est pas adapté le long de la maison cf. photo ci-dessous.</p>  <p>Nous proposons de réaliser à la place la mise en place de Gabion suivant croquis ci-dessous.</p> 		IDV MO
MOE	<p>MO demande à IDVERDE de ne pas réaliser du TD15 et TG9 jusqu'en amont de la Sambre les bouturages et les plantations d'hélophytes dans les zones où il est indiqué :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bouturage (1u/ml) et entretien préalable</li> <li>• Bouturage en poquet (5u/5ml) et entretien préalable</li> <li>• Plantations d'hélophytes (3u/ml) et entretien préalable</li> </ul>		IDV MO

Emetteur	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
MOE	<p>MO souhaite réaliser la partie amont qui n'était pas initialement prévu dans les travaux notamment en :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyant la Sambre de ses détritux cf. photo ci-dessous</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aménageant la rive gauche suivant plan type ci-dessous</li> </ul> 		IDV MO
COM	<p>La commune propose à l'entreprise :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'installer sa base vie au niveau de la Place de la République,</li> <li>- de stocker ses déblais et ses matériaux à côté de l'ancienne Gare.</li> </ul> <p>La commune demande à l'entreprise de prendre contact avec les riverains de l'ancienne Sambre avant d'intervenir au droit de leur propriété.</p>		IDV MO
IDV	Constat d'huissier sera réalisé le mercredi 24 aout.		TOUS

Points à valider lors de la prochaine réunion

MOE	Avancement des travaux		TOUS
-----	------------------------	--	------

Sans remarques de la part des participants durant 6 jours, ce compte rendu devient contractuel.
