

Programme de mise en défens du Vilpion et de ses affluents

Programme n°2

Compte-rendu des réunions de chantier 12 janvier 2017

• Lieu :	Devant la pisciculture, commune de Voulpaix à 09h30			
• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :		
Syndicat intercommunal d'Aménagement et de Gestion du Vilpion amont et de ses affluents	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques <i>(mise à disposition du Syndicat)</i>	Mascitti Nino S.A		
• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
LE ROUX Patrice	Président par intérim du syndicat			✓
LEFEBVRE Jean-Luc	Commune de Saint-Pierre-les-Franqueville	✓		
MOULIERE Pierre-Jacques	Délégué de la commune de Hary	✓		
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
MASCITTI Dominique	Entreprise Mascitti			✓
BARBIER Mickaël		✓		
FAVRESSE Thierry	Exploitants	✓		
DUNTZE Martin	Fédération de Pêche et Milieux Aquatiques de l'Aisne			✓
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓
RAFFIN Vanessa	Communauté de communes Thiérache du Centre			✓

Ce second programme de mise en défens du Vilpion et de ses affluents a été confié, après appel d'offres, à l'entreprise Mascitti Nino S.A – (siège : Villers-Cotterêts / 02.)

- **SITUATION ACTUELLE :**

- Les travaux de mise en défens se poursuivent. Les températures négatives associées aux faibles niveaux d'eau permettent d'avancer dans les travaux sans dégrader les pâtures.
- L'entreprise se situe actuellement chez Monsieur Fauchoux (pâture 11), sur la commune de Gercy, rivière le Chertemps.

- **DETAILS DES TRAVAUX :**

- La vérification des pâtures 12 (D. SERENT) et 13 (Th. FAVRESSE) a été réalisée ce jour.
- Dans la pâture 12, l'abreuvoir est en cours de finalisation. Les lisses horizontales de 4m seront prochainement fixées. La pose des baillages et la tension de la clôture a légèrement tordu deux poteaux. Il est demandé à l'entreprise de renforcer ces zones de tension en ajoutant une jambe de force sur les poteaux affaiblis.
- Dans la pâture 13, la totalité des poteaux a été posée. La clôture est en cours de réalisation. Deux zones de sources ont été mises en défens. Cette protection évite ainsi le piétinement de ce secteur par les animaux et permettra un développement naturel de la végétation herbacée (iris, joncs, carex, ...).

Le passage à gué permettant la traversée des animaux d'une pâture à l'autre est en cours de finalisation. La descente a été empierrée et stabilisée. Les lisses horizontales seront posées en même temps que celles de l'abreuvoir de la pâture 12 et 13.



JAMBE DE FORCE A AJOUTER – PATURE 12



ZONE DE SOURCE PROTEGEE – PATURE 13



PASSAGE A GUE ET ABREUVOIR A FINALISER – FIXATION DES LISSES HORIZONTALES A VENIR - PATURE 12



<u>Pâture 14</u>	<u>Commune</u> : Saint-Gobert	<u>Aménagements réalisés</u> 1 pompe de prairie
<u>Exploitant</u> : D. DUVAL	<u>Cours d'eau</u> : le Vilpion	

- Le piquetage de cette zone a été réalisé le 07 décembre 2016.
- La pose de la pompe sera effectuée dans la continuité des travaux de la pâture 12 et 13.

<u>Pâture 11</u>	<u>Commune</u> : Gercy	<u>Aménagements réalisés</u> 1 abreuvoir rustique 1 100 ml de clôtures (électrique avec alimentation)
<u>Exploitant</u> : E.FAUCHEUX	<u>Cours d'eau</u> : le Chertemps	

- Le piquetage de la canalisation de gaz a été réalisé en présence d'un agent du réseau. La distribution des poteaux été effectué. La fixation de ces deniers est en cours.
- Les travaux de terrassement de l'abreuvoir rustique sont terminés. Comme sur les aménagements précédents, les lisses horizontales seront prochainement fixées.

<u>Pâture 15, 16, 17 et 18</u>	<u>Commune</u> : Bray-en-Thiérache	<u>Aménagements réalisés</u> 2 abreuvoirs rustiques 2 passages à gué 1 225 ml de clôtures (4 fils)
<u>Exploitant</u> : P. HERBERT	<u>Cours d'eau</u> : ruisseau du Ponceau	

- Le piquetage de ces 4 pâtures a été effectué en toute fin de réunion, en présence de l'exploitant.
- Les zones d'abreuvement ont été identifiées.
- La présence de vieux saules en bordure de rivière nécessitera un étêtage ou abattage selon l'état sanitaire des sujets. Un léger faucardage du lit est également prévu dans le cadre du marché afin de restaurer la dynamique d'écoulement et limiter l'envasement du ruisseau
- Les travaux sur cette zone débiteront dans la continuité des travaux de la pâture 11.



ETAT INITIAL DU RUISSEAU DU PONCEAU

• REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Le secteur de Braye-en-Thiérache constitue la dernière grosse zone de travaux de ce programme.
- Des reprises doivent cependant être réalisées sur la commune de Voulpaix (pâture 6). La pâture étant alimentée par de nombreuses zones de sources, il peut être proposé de reporter ces travaux en période estivale pour limiter les dégâts occasionnés à la pâture.

• REUNIONS DE CHANTIER

- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de mise en défens, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. MASCITTI Dominique – entreprise Mascitti..... 06.12.43.28.43

M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74

• FINANCEMENTS :


- La réalisation de ces travaux est possible grâce au soutien financier de :



• LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

La prochaine réunion aura lieu
le jeudi 02 février 2017

à **09h30**, au hameau de la Corrière, commune de
Braye-en-Thiérache

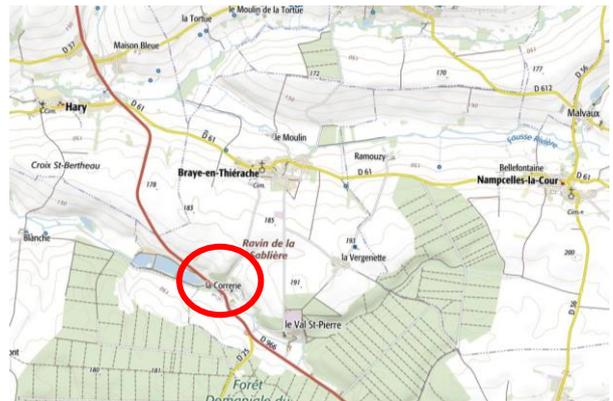

Le service technique,

