

Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise
Effacement du seuil de Cœuvres-et-Valsery

Ru de Retz

Continuité écologique

**Compte-rendu de la réunion de chantier
17 juillet 2018**

Lieu :	Rue de l'Abbaye, 02600 Cœuvres-et-Valsery à 9H30
---------------	--

Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :
Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	MASCITTI NINO

Nom, Prénom :	Organisme :	Présent	Absent	Excusé
GERAULT Nicolas	Président du Syndicat			✓
REBEROT Nicolas	1 ^{er} Vice-président du Syndicat	✓		
CHAUVET Eric	2 ^{ème} Vice-président du Syndicat			✓
HUGE Maurice	Président d'honneur du Syndicat			✓
PETIT Xavier	Membre du bureau du Syndicat	✓		
BRABANT Pierre	Délégué du Syndicat	✓		
BRUYANT Monique	Maire de Cœuvres-et-Valsery	✓		
MASCITTI Dominique	MASCITTI Nino	✓		
HUCHET William	Union des syndicats	✓		
DUGUET Bernard	Riverain	✓		
DUGUET Philippe	Riverain	✓		
LEFEVRE Philippe	Propriétaire du seuil			✓
MOIRE Pascal	Agence Française pour la Biodiversité			✓
	Agence de l'eau Seine-Normandie			✓
	Direction Départemental des Territoires de l'Aisne			✓

Cette réunion concerne la réunion de chantier des travaux pour l'effacement du seuil de Cœuvres-et-Valsery, ROE 39406. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise MASCITTI NINO (Siège Social : Rue des Bûcherons, 02600 VILLERS-COTTERETS).

DETAIL DES TRAVAUX :

- *Secteur amont de l'ouvrage :*

Pendant la phase de rééquilibrage du profil en long du ru de Retz, l'entreprise MASCITTI NINO réalise actuellement :

- la remise en état de la passerelle.

L'assise de la passerelle a été maçonnée pour garantir une meilleure stabilité. Pour rappel l'armature métallique est conservée. Le changement du plancher bois est en cours de réalisation.



Passerelle avant travaux



Remise en état de la passerelle en cours de réalisation

- La préparation pour la futur prise d'eau

L'entreprise MASCITTI NINO a réalisé un entretien des abords du fossé préexistant (100 ml) ainsi que sur la rive droite du ru de Retz (140 ml) pour la mise en place de la futur prise d'eau.



Entretien du fossé préexistant



Entretien de la berge en rive droite du ru de Retz

SUITE DES TRAVAUX :

- Un apport de matériaux graveleux sera réalisé dans l'objectif de recréer un lit naturel sur l'ensemble du linéaire travaillé (270 ml).
- Au fur et à mesure de la création du matelas graveleux dans le lit de la rivière, les banquettes d'hélophytes seront réalisées.

FINANCEMENT

La réalisation de ce programme de travaux est possible grâce au soutien financier de :




REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'effacement du seuil de Cœuvres-et-Valsery, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :
 - M. William HUCHET / Geoffrey PACAUD – Union des syndicats 03.23.20.36.74 – 06.07.71.26.60
 - M. Dominique MASCITTI – Entreprise MASCITTI NINO SA 06.12.43.28.43

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

- La prochaine réunion de chantier se déroulera **le mardi 24 juillet 2018 à 09h30, rue de l'Abbaye 02600 Cœuvres-et-Valsery.**

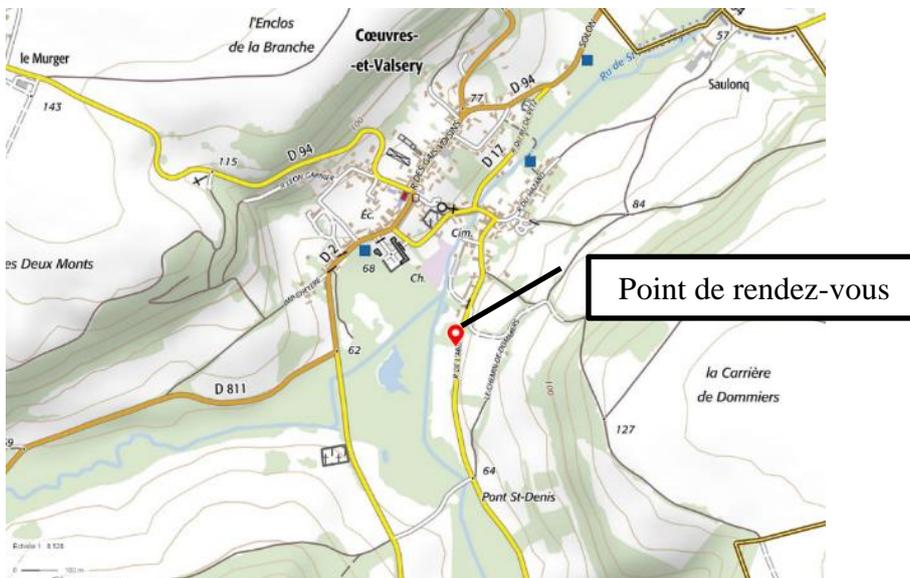

Le service technique,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.
