

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT AMONT DE LA SERRE ET DU VILPION

Travaux d'arasement du seuil de l'ancien moulin de Chaourse

Compte-rendu n° 11 de la réunion du 27 novembre 2019

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Lieu : Mairie de Chaourse | |
| <ul style="list-style-type: none"> Maître d'ouvrage (MO) : Syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion M. LEFEBVRE : Président | |
| <ul style="list-style-type: none"> Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) : Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques M PACAUD : 03.23.20.36.10 g.pacaud@griv.fr | <ul style="list-style-type: none"> Maître d'œuvre (MOE) Bureau d'études ECAA M. DANIEL : 07.70.29.68.53 gdaniel@ecaa02.fr |
| <ul style="list-style-type: none"> Contrôleur extérieur SOCOTEC Damien Religieux : 06 13 40 01 81 damien.religieux@socotec.com | <ul style="list-style-type: none"> Coordonnateur SPS SOCOTEC Laurent Goujart : 06 18 94 41 71 Laurent.GOUJART@socotec.com |
| <ul style="list-style-type: none"> Entreprise Lot 1 : Génie-civil CGCR Conduite de travaux : Amandine De Barba : 06 47 82 94 17 amandine.debarba@cgcr.fr | <ul style="list-style-type: none"> Entreprise Lot 2 : Travaux en rivière CGCR Conduite de travaux : Amandine De Barba : 06 47 82 94 17 amandine.debarba@cgcr.fr Sous-traitant : SARL HOURRIER Hourrier Alexandre 06 40 23 48 52 hourrier-entreprise@wanadoo.fr |
| <p align="center">EXPERTISE JUDICIAIRE – REFERE PREVENTIF PHILIPPE VERHAEGHE Por : 06 45 37 66 99 - philippe.verhaeghe7@orange.fr</p> | |

**PROCHAINE REUNION – A définir
à 9h00 sur site – accès côté « bras mort »**

Les personnes convoquées aux réunions sont indiquées dans le tableau ci-après (en dernière colonne).

Les travaux d'arasement du seuil de l'ancien moulin de Chaourse sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie et de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie



Région
Hauts-de-France

| • Nom, Prénom : | • Fonction : | Présent | Absent | Excusé | Convocation prochaine réunion |
|-----------------|--|---------|--------|--------|-------------------------------------|
| M. Lefebvre | Président Syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion Mail : jean.luc.lefebvre.st02@gmail.com | v | | | v |
| M. Le Roux | Vice-président Syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion Mail : pafler@aol.com | v | | | v |
| M. Charpentier | Maire de Chaourse mairiechaourse@orange.fr - 03 23 21 36 33 | v | | | v |
| M. Delbaere | Adjoint au maire de Chaourse | v | | | v |
| M. Girardot | Chef de service eau et biodiversité Communauté de Communes des portes de la Thiérache lgirardot@portes-de-thierache.fr | v | | | |
| Mme TUAUX | Agence Française pour la Biodiversité Mail : sophie.tuaux@afbiodiversite.fr | | v | | |
| M. ALAVOINE | Agence Française pour la Biodiversité Mail : jean-francois.alavoine@afbiodiversite.fr | | v | | |
| Mme FALCONNET | Agence de l'eau Seine Normandie – Vallées d'Oise FALCONNET.MADISONE@aesn.fr | | v | | |
| M. GOUJARD. | CSPS – SOCOTEC Laurent.GOUJART@socotec.com | | | | |
| M. RELIGIEUX | Bureau de contrôle – SOCOTEC damien.religieux@socotec.com | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LELIEVRE Anne-France | Direction Départementale des Territoires – Unité Police de l'Eau - 03.23.24.65.21 Mail : ddt-env@aisne.gouv.fr Mail : anne-france.lielievre@aisne.gouv.fr | | v | |
| SIRON Anne | FEDEER – REGION HAUT DE FRANCE Anne.SIRON@hautsdefrance.fr | | | v |
| VERHAEGHE Philippe | Expert judiciaire Mail : philippe.verhaeghe7@orange.fr | | | |
| PACAUD Geoffrey | USAGMA – Assistant à maîtrise d'ouvrage Mail : g.pacaud@griv.fr | v | | |
| DANEL Guillaume | ECAA – Maître d'œuvre gdanel@ecaa02.fr | v | | v |
| AMANDINE De Barba | CGCR – ENTREPRISE LOT 1 et 2 Amandine.debarba@cgcr.fr | v | | v |
| HOURRIER Alexandre | HOURRIER – Sous-traitant CGCR LOT 2 hourrier-entreprise@wanadoo.fr | | v | |
| LOIZEAUX Jean-Claude LOIZEAUX Sébastien Propriétaire parcelle ZH 14 | Sebastien.loizeaux@orange.fr Loizeaux0687@orange.fr | | | |
| ROCOURT Philippe M. BIBE Propriétaire parcelles Zh19, B 1519, 1517, 1160 et 1159 | philipperocourt@sfr.fr | | | |
| M. CHOAIN Propriétaire parcelle B1509 Exploitant parcelle B 1163 | choain02@orange.fr | | | |
| M. ROCOURT Christian Propriétaire parcelle B1163 | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| M. PICARD Patrick Propriétaire parcelle ZH16 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Les travaux d'arasement du seuil de l'ancien moulin de Chaourse sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie et de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie



Région
Hauts-de-France

MO : Maitre d'ouvrage
 MOE : Maitre d'œuvre
 BC : Bureau de Contrôle

● ADMINISTRATIF:

Marché notifié le 27/05/2019.

L'entreprise CGCR a déclaré en sous-traitance pour le lot 2 l'entreprise SARL HOURRIER.

Définition des droits de passages et des travaux par parcelles acté sur le CR n°2.

Envoi des conventions de passage et de travaux prévu le 26/09/2019 – en attente du retour des propriétaires.

● PHASE DE PREPARATION DES TRAVAUX:

Il est demandé à l'entreprise de transmettre en fin de phase de préparation :

- Les études de dimensionnement et de conception de la passerelle – plans V5 - **Fait et validé MOE 05/08/2019 + BC 18/07/2019**
- Les notes de calculs des bétons armés pour l'abaissement du seuil – **Fait et validé MOE 29/07/2019 + BC 06/09/2019**
- La note de calcul de la stabilité du talus renforcé en génie végétale (stabilité au glissement) **Fait et reçu le 09/10/2019 – en attente VISA SOCOTEC**
- Les fiches d'agrément des fournitures et matériaux pour l'ensemble des lots 1 et 2 – **fait et validé MOE le 24/09/2019**
- Le phasage de réalisation de l'abaissement du seuil respectant l'obligation primordiale de maintenir la stabilité des ouvrages riverains (murs des culées et murs de la mairie) – **Fait et Validé MOE dans le VISA du 06/09/2019 SOCOTEC et du 29/07/2019 MOE**
- Un plan montrant les zones pour les installations de chantiers et de stockage des matériaux, Les accès aux chantiers, les routes empruntées pour les livraisons des matériaux et autres fournitures, zones de manutention pour la passerelle – **Fait et validé MOE/MOA**
- Une copie des conventions d'accès par des parcelles privées – **transmis aux propriétaires et exploitants le 26/09/2019 – en attente de retour des propriétaires.**
- Calcul de stabilité des talus renforcés : **transmis à SOCOTEC le 09/10/2019 – VISA reçu le 28/10.**

● DOCUMENTS A TRANSMETTRE :

MOE >CGCR :

CGCR >MOE :

SOCOTEC > MOE et CGCR :

• **TRAVAUX:**

Planning prévisionnel :

Extrait du planning général des travaux

| OPERATIONS | PERI | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|------|------------|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|------------|----|----|----|---|------------|---|---|---|---|------------|----|----|----|----|--|
| | | Semaine 42 | | | | | Semaine 43 | | | | | Semaine 44 | | | | | Semaine 45 | | | | | Semaine 46 | | | | | |
| | | Octobre | | | | | | | | | | | | | | | Novembre | | | | | | | | | | |
| TRAVAUX PREPARATOIRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demande de DICT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remise des plans d'exécution et documents administratifs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAVAUX DE GENIE CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installation de chantier et amenée des matériels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pose de panneaux d'information - Piquetage repérage des réseaux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aménagement du déversoir de crue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation des batardeaux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation des rampes d'accès | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maintenance de service des réseaux existants | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démontage de la passerelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolition des piles centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arasement du radier (par passe de 1m de large) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réfection du radier (par passe de 1m de large) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reprise en sous œuvre en cas de besoins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agrandissement du radier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obstruction du canal de dérivation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réfection des chevêtres des culées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rénovation des maçonneries existantes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pose de la passerelle métallique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remise en eau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raccordement de la passerelle métallique y compris enrobés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nettoyage et repli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAVAUX EN COURS D'EAU - DU SEUIL JUSQU'AU DEVERSOIR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Débroussaillage et abattage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Déblais y compris évacuation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remblais en craie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enrochement de pieds de talus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remblais renforcé végétalisé - Remblai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remblais renforcé végétalisé - Géonatte coco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation de la banquette | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation de la banquette - Géonatte coco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recharge granulaire du lit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Travaux de plantation et d'aménagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAVAUX EN COURS D'EAU - EN AMONT DU DEVERSOIR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Débroussaillage et abattage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Déblais y compris évacuation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remblais issus de déblais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Travaux de plantation et aménagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Epis en fagots et pieux de bois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMENAGEMENT DE LA FOSSE DE DISSIPATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Débroussaillage et abattage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remblais issus de déblais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation de banquettes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation de banquettes - Géonatte coco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Protection de talus (enrochements) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aménagement des talus, protection et plantation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tranche optionnelle n°1 : CLOTURE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réalisation de clôture fils ronce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tranche optionnelle n°2 : ABREUVOIRS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aménagement d'un abreuvoir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pose d'une pompe à nez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Avancement des travaux :


Le comblement de la prise d'eau est réalisé, il reste à poser le clapet anti-retour.

Les réfections de maçonnerie côté rive gauche sont terminés.

Les travaux d'arasement du seuil de l'ancien moulin de Chaourse sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie et de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie



Région Hauts-de-France

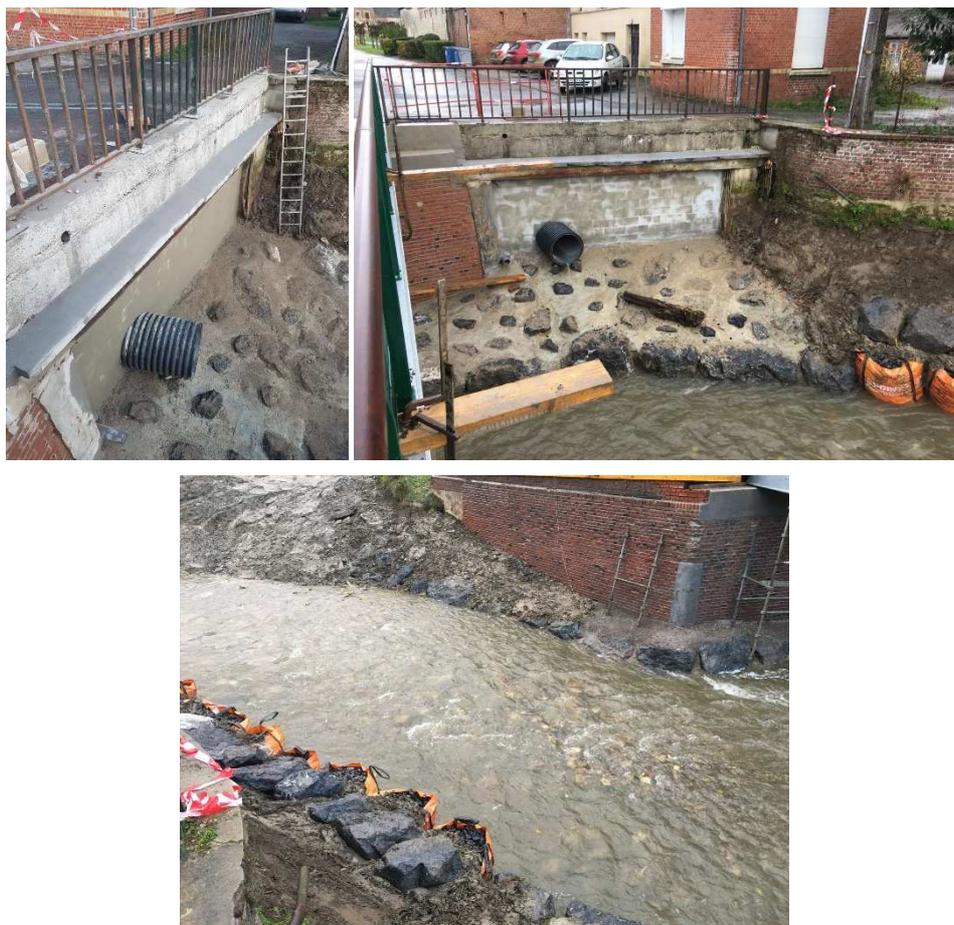

La commune termine le comblement en sable de l'ancienne prise d'eau.

Travaux en cours et points techniques validés en réunion :

A la vue des conditions météorologiques actuelles, l'idée d'une interruption des travaux durant la période hivernale est envisagée.

Les bigs bags de GNT ayant servi de batardeau à l'aval ont été mis en défense temporaire en pied de berge rive droite pour anticiper une trêve durant l'hiver.

Point technique à voir la mairie :

Adapter les descentes de gouttières pour ne plus avoir de ruissellement le long du mur et ainsi préserver le bon état du mur.

Les travaux d'arasement du seuil de l'ancien moulin de Chaourse sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie et de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie



Région Hauts-de-France

Travaux à venir :

- réalisation de la pièce de maintien de la conduite EU et sa pose,
- arasement du massif en maçonnerie selon la fissure, décalage à l'été 2020 ?

Prochaine réunion :**A définir – Rdv sur site par l'accès de chantier coté bras mort**
