

Lieu:

# SYNDICAT DU BASSIN VERSANT AMONT DE LA SERRE ET DU VILPION

# Travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion

Bassin versant du ruisseau de Landouzy

# Compte-rendu n°9 de la réunion du 10 janvier 2018

Mairie de Landouzy-la-Cour à 9h30

Maîtro d'auvrago (MO)			
Maître d'ouvrage (MO) :			
Syndicat	du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion		
	M. LEFEBVRE: 06.11.92.55.79		
	jeanluc.lefebvre@free.fr		

• Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO): • Maître d'œuvre (MOE)

Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques

Melle BAUDRIER: 07.85.21.13.37 union-des-syndicats@griv.fr

Bureau d'études ECAA M. DANEL : 07.70.29.68.53 gdanel@ecaa02.fr

Coordonnateur SPS

SOCOTEC

M. DE TIMMERMAN: 06.18.94.41.71 Benoit.detimmerman@socotec.com

 Entreprise Lot 1 : Terrassements, aménagements hydrauliques et enrochements

CGCR

M. BAUDRY: 06.30.52.73.48 mederic.baudry@orange.fr

• Entreprise Lot 2 : Plantations de haies, enherbement et clôtures

POTEAU Espaces Verts
M. CHOULETTE: 07.84.24.95.92
direction@poteau-espacesverts.fr

# PROCHAINE REUNION LE 24 JANVIER 2018 A 9H – MAIRIE DE LANDOUZY-LA-COUR

Les personnes convoquées à la prochaine réunion sont indiquées dans le tableau ci-après (en dernière colonne).











Nom, Prénom :	Prénom : • Fonction :				Convocation prochaine réunion
LEFEBVRE Jean-Luc	Président du syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion	٧			٧
LE ROUX Patrice	Vice-Président du syndicat - pafler@aol.com		٧		٧
DEBESSE Laurent	Vice-Président du syndicat - laurent.debesse664@orange.fr		٧		٧
PAYAN Claude	Maire de Landouzy-la-Cour 06.32.99.85.20 - claude.payan@laposte.fr				٧
BAURIN Véronique	Adjointe et propriétaire à Landouzy-la-Cour				
DHUYGELAERE Albert	Délégué suppléant pour la commune de Landouzy-la- Cour au syndicat				
BERNARD Alain	Délégué suppléant pour la commune de Landouzy-la- Cour au syndicat				
BRUGGEMAN Jean-Claude	Adjoint au maire de Landouzy-la-Cour		٧		٧
BOURY Christophe	Maire et délégué titulaire de Thenailles - maire.thenaille@wanadoo.fr				
PINCKERS Christiane	Maire d'Origny-en-Thiérache - <u>origny02@orange.fr</u>				
DUBREUIL Lionel	Délégué titulaire d'Origny-en-Thiérache au syndicat - lionel.dubreuil@cegetel.net				
BRANQUART Marinella	Maire de Landouzy-la-Ville – <u>landouzylaville-mairie@wanadoo.fr</u>				
PELLET Claude	Délégué titulaire de Landouzy-la-Ville au syndicat - claudepellet@orange.fr				
STEVENOT Cyrille	Maire et délégué titulaire de La Bouteille - mairiedelabouteille@wanadoo.fr				
BLARY René	Maire de Plomion - mairie.plomion@wanadoo.fr				
BERNAILLE Vincent	Délégué titulaire de Plomion au syndicat				
PRINCE Jean-Marc	Maire de Vervins - <u>vervins@free.fr</u>				
MOULIERE Michel	Délégué titulaire de Vervins au syndicat				
FEREZ Pascal	CD 02- Voirie Départementale 06.07.12.82.52 - <u>pferez@aisne.fr</u>	٧			٧
RAFFIN Vanessa	Communauté de communes de la Thiérache du Centre 06 38 25 18 30 - v.raffin@cc-tc.com		٧		٧











Nom, Prénom :	Nom, Prénom : • Fonction :			Excusé	Convocation prochaine réunion	
QUENTIN Damien	Direction Départementale des Territoires Aisne – Unité Police de l'Eau				٧	
AMBROSINO Stéphanie	Mission érosion -Chambre d'Agriculture 02 03.23.22.51.08 – <a href="mailto:stephanie.ambrosino@ma02.org">stephanie.ambrosino@ma02.org</a>		٧		٧	
DE TIMMERMAN Benoit	SOCOTEC – coordination SPS 06.18.94.41.71- <a href="mailto:benoit.detimmerman@socotec.com">benoit.detimmerman@socotec.com</a>		٧		٧	
SIRON Anne	Conseil Régional des Hauts de France (Fonds FEDER) 03.22.97.27.97 - <u>Anne.SIRON@hautsdefrance.fr</u>		٧		٧	
MARTINET Fabrice	Agence de l'Eau Seine-Normandie 03.44.30.41.38- <u>martinet.fabrice@aesn.fr</u>		٧		٧	
HERBERT Thomas	Exploitant concerné par des aménagements 06.74.58.68.28 – thomas herbert@orange.fr			٧	٧	
HERBERT Pascal	Exploitant concerné par des aménagements 06.08.03.49.62 – pascal.herbert2@wanadoo.fr	٧			٧	
CAMUS Xavier	Exploitant concerné par des aménagements 06.73.30.29.27 – xavier.camus02@orange.fr				٧	
JAUQUET Philippe	Exploitant concerné par des aménagements 03.23.98.03.61					
BRAIDY Hervé	Exploitant concerné par des aménagements 06.32.38.83.11 – <u>braidy.herve@wanadoo.fr</u>					
BAURIN Francis	Exploitant concerné par des aménagements 06.82.32.01.36					
BRAIDY Marc	Exploitant concerné par des aménagements 06.07.39.13.02 – marc.braidy@laposte.net					
DUPONT Alain	Exploitant concerné par des aménagements 06.44.14.49.75					
LINDEKENS Jean-Luc	Exploitant concerné par des aménagements 03.23.98.46.73					
STEVENOT Bertrand	Exploitant – 06.86.22.56.21					
DERUELLE Philippe	Exploitant					
BAUDRY Médéric	CGCR 06.30.52.73.48 - mederic.baudry@orange.fr				٧	
POTEAU Jean-François	POTEAU Espaces Verts 03.23.58.47.36 — contact@poteau-espacesverts.fr	٧			٧	
CHOULETTE Jérémy	POTEAU Espaces Verts 07.84.24.95.92 — <u>direction@poteau-espacesverts.fr</u>	٧			٧	
BAUDRIER Mathilde	USAGMA – Assistant à maitrise d'ouvrage	٧			٧	
DANEL Guillaume	NEL Guillaume ECAA – Maître d'œuvre					











#### • Presentation des entreprises:

# LOT N°1:

CGCR - M. BAUDRY: 06.30.52.73.48

mederic.baudry@orange.fr

# LOT N°2:

POTEAU Espaces Verts - M. CHOULETTE: 07.84.24.95.92

direction@poteau-espacesverts.fr

#### ADMINISTRATIF:

#### Lot 1:

Notification du marché le 28/07/2017

Ordre de service n°1 de démarrage de la période de préparation à émettre – fait le 28/09 Ordre de service n°2 de démarrage des travaux au 23/10 - en attente de retour de l'entreprise.

#### Lot 2:

Notification du marché le 28/07/2017

Ordre de service n°1 de démarrage de la période de préparation à émettre – fait le 28/09 Ordre de service n°2 de démarrage des travaux au 25/10 – OK.

## Planning général:

Démarrage travaux du lot 1 : 23 octobre – option gabion en août 2018

Démarrage des plantations lot 2 : 24 octobre

#### Documents à remettre par les entreprises des lots 1 et 2 :

- Planning Lot 1 avec l'ensemble des travaux sur les fossés

#### Documents à transmettre aux entreprises :

Modèle de panneau de chantier à mettre en place avant les travaux (AMO>CGCR) – Fait et transmis,
 en attente de la pose.

#### Documents à remettre par les entreprises des lots 1 et 2 :

- Conventions avec la voirie départementale signées par toutes les parties











#### TRAVAUX:

#### Organisation des travaux :

- Base vie installée sur la commune de Landouzy la cour,
- PPSPS à transmettre au coordinateur SPS,
- Stockage de matériaux : l'entreprise CGCR réalisera ses apports en matériaux depuis le dépôt de la société à Buire,
- Réalisation des ouvrages en gabion : fabrication sur le site, pas de recours à la préfabrication
- Abattage d'arbres pour réalisation des accès aux ravines où sont situés les gabions, marquage sur site et selon avis des propriétaires.

#### Points techniques vus en reunion : Lot 1

Travaux en arrêt pour cause d'intempérie.

#### **RAPPELS:**

- Ouvrages gabions n° 212 :
- Après visite du site, il apparait que le terrain devant accueillir les gabions à fait l'objet depuis le conventionnement de l'ouvrage en 2015 de remblais rendant impossible la réalisation des ouvrages.
- Une implantation est possible en aval à cheval sur les parcelles de M. JAUQUET et M. DERUELLE qui tamponnerait uniquement les eaux des deux sources présentes au Gravier Chardon.
- M. DERUELLE s'oppose à cette réalisation sur son terrain puisqu'il ne veut pas qu'on endommage les sources qui permettent actuellement à ses vaches de s'abreuver et il affirme également que ce fossé ne fait pas l'objet de ruissellements importants.











- En effet, nous avons remarqué lors de cette visite que suite aux remblais de la zone, un écoulement d'eau plus localisé arrive en amont de cette zone, emprunte le chemin communal et créé sur celuici une forte érosion.













# - Ouvrages gabions n° 209 et 210 :

Après visite du site, il apparait que le terrain devant accueillir les gabions à fait l'objet de remblais divers imposant une modification de l'implantation des gabions vers l'aval de la ravine.

Vue sur l'encombrement de la ravine – Implantation du gabion 209 avant l'arbre



Vue de l'implantation en aval de la ravine du gabion 210 au droit des 2 arbres centraux















# Points techniques vus en reunion: Lot 2

# Travaux en cours sur les haies 1023, 116 et 1024

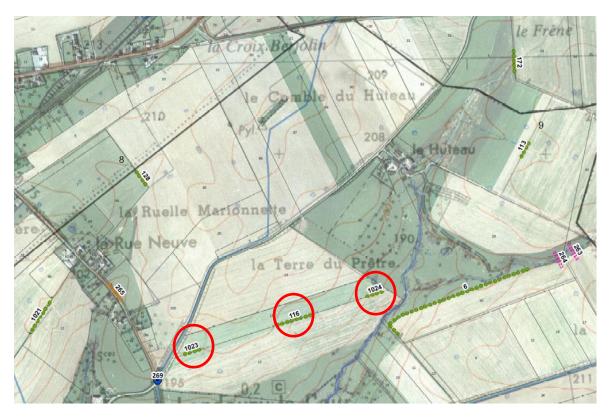

Plantations à venir : 6 (engrais vert), 113 et 172

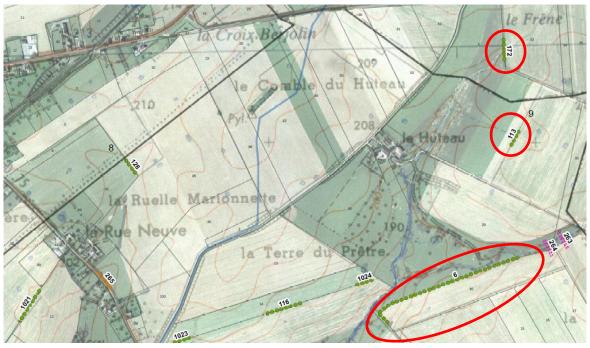











- Piquetage de la haie 1008 fait avec Pascal FEREZ (voirie départementale) et Pascal HERBERT : 105 ml au lieu de 90 ml
- Piquetage des haies avec Pascal HERBET:

Haie 1006: 93 ml au lieu de 60ml

Haie 1007: 140 ml

Allongement de la haie 161 de 20 ml suivant constat fait sur site ce jour (voir photographies ciaprès)

## A faire pour le Lot 2 :

- Piquetage à prévoir des deux dernières haies 1037 et 1054
- Reprise à prévoir des milieux de haies arrachées ou couchées

#### **RAPPELS:**


- Sont plantées à ce jour, les haies : 1021, 146, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 1002, 1005, 1009 et 1046 soit un linéaire de 702 m.
- Il est nécessaire de réaliser le paillage à l'avancement des plantations afin de libérer les terres pour les labours par les exploitants.

Vues des dégâts suite aux intempéries des mois de décembre 2017 et janvier 2018

Ravinement au droit de la haie 161 – Allongement prévu sur 20 m.





















Vue sur les dégâts des haies 166 et 146 - redressement/repiquage des plants















# Tableau récapitulatif de l'avancée du piquetage et des plantations des haies

#### **Avancée haies**

Numéro identifiant ouvrage	Туре	Dimensions conventionnées	Dimensions piquetées	Parcelle concernée	Piquetage réalisé	Plantation réalisée
6	Haie	100	149	ZC 0030	Х	
113	Haie	74	50	ZC 0028	Х	
116	Haie	273	286	ZB 0015	Х	En cours
172	Haie	50	26	ZA 0033 ZA 0005	Х	
1023	Haie	124	128	ZB 0015	Х	En cours
1024	Haie	80	80	ZB 0014	Х	En cours
128	Haie	15	30	ZB 107 ZB 0065	Х	
1021	Haie	162	125	ZA 0012 ZA 0084	Х	Х
180	Haie	100	100	ZH 013 ZH 0006	Х	
1037	Haie	110		ZI 0043		
1054	Haie	98		ZH 0009		
146	Haie spéciale pâture	15	10	ZI 0006 ZI 0005	Х	х
160	Haie	50	40	ZI 0005	Х	Х
161	Haie	40	36+20	ZI 0025	Х	Х
163	Haie	40	40	ZI 0004	Х	Х
165	Haie	47	65	ZI 0001	Х	X
166	Haie	55	55	ZI 0003	Х	X
167	Haie	57	47	ZI 0081	Х	Х
1002	Haie	95	95	ZI 0028	Х	X
1005	Haie	130	130	ZI 0003	Х	X
1006	Haie	60	93	ZI 0001	Х	
1007	Haie	140	140	ZI 0025	Х	
1008	Haie	90	105	RD 1850	Х	
1009	Haie	20	9	ZI 0001	Х	Х
1046	Haie	53	50	ZI 0003	Χ	Х

Exploitants

Marc Braidy

Hervé Braidy

Alain Dupont

Jean-Luc
Lindekens

Thomas
Herbert

Pascal Herbert

Xavier Camus
Philippe
Jauquet

Francis Baurin

Terminée = Plantation + paillage réalisés











# **Prochaine réunion :**

Le mercredi 24 janvier 2018 à 9h00 en mairie de Landouzy-la-Cour pour le suivi des travaux de plantations et planning lot 1

# Objet:

Suivi des travaux du lot 1 et lot 2
Piquetage à prévoir lors de la réunion du 24/01/2018 pour les haies 1037 (M. Jauquet)
et 1054 (M.Lindekens).







