

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT AMONT DE LA SERRE ET DU VILPION

Travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion

Bassin versant du ruisseau de Landouzy

Compte-rendu n°11 de la réunion du 14 Février 2018

• Lieu :	Mairie de Landouzy-la-Cour à 9h	
• Maître d'ouvrage (MO) :	Syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion M. LEFEBVRE: 06.11.92.55.79 jeanluc.lefebvre@free.fr	
• Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO):	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques Melle BAUDRIER : 07.85.21.13.37 union-des-syndicats@griv.fr	• Maître d'œuvre (MOE) Bureau d'études ECAA M. DANIEL : 07.70.29.68.53 gdaniel@ecaa02.fr
• Coordonnateur SPS	SOCOTEC M. DE TIMMERMAN : 06.18.94.41.71 Benoit.detimmerman@socotec.com	
• Entreprise Lot 1 : Terrassements, aménagements hydrauliques et enrochements	CGCR M. BAUDRY : 06.30.52.73.48 mederic.baudry@orange.fr	• Entreprise Lot 2 : Plantations de haies, enherbement et clôtures POTEAU Espaces Verts M. CHOULETTE : 07.84.24.95.92 direction@poteau-espacesverts.fr

PROCHAINE REUNION LE 28 FEVRIER 2017 A 9H – MAIRIE DE LANDOUZY-LA-COUR

Les personnes convoquées à la prochaine réunion sont indiquées dans le tableau ci-après (en dernière colonne).

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



• Nom, Prénom :	• Fonction :	Présent	Absent	Excusé	Convocation prochaine réunion
LEFEBVRE Jean-Luc	Président du syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion			✓	✓
LE ROUX Patrice	Vice-Président du syndicat - pafler@aol.com		✓		✓
DEBESSE Laurent	Vice-Président du syndicat - laurent.debesse664@orange.fr		✓		✓
PAYAN Claude	Maire de Landouzy-la-Cour 06.32.99.85.20 - claud.payan@laposte.fr				
BAURIN Véronique	Adjointe et propriétaire à Landouzy-la-Cour				
BRUGGEMAN Jean-Claude	Adjoint au maire de Landouzy-la-Cour				
BOURY Christophe	Maire de Thenailles - mairie.thenaille@wanadoo.fr				
PINCKERS Christiane	Maire d'Origny-en-Thiérache - origny02@orange.fr				
BRANQUART Marinella	Maire de Landouzy-la-Ville – landouzylaville-mairie@wanadoo.fr				
STEVENOT Cyrille	Maire de La Bouteille - mairiedelabouteille@wanadoo.fr				
BLARY René	Maire de Plomion - mairie.plomion@wanadoo.fr				
PRINCE Jean-Marc	Maire de Vervins - vervins@free.fr				
MALOT Delphine	Communauté de Communes des Trois Rivières d.malot@cc3r.fr				
RAFFIN Vanessa	Communauté de communes de la Thiérache du Centre 06 38 25 18 30 - v.raffin@cc-tc.com				
FEREZ Pascal	CD 02- Voirie Départementale 06.07.12.82.52 - pferez@aisne.fr				
QUENTIN Damien	Direction Départementale des Territoires Aisne – Unité Police de l'Eau				
AMBROSINO Stéphanie	Mission érosion -Chambre d'Agriculture 02 03.23.22.51.08 – stephanie.ambrosino@ma02.org				
DE TIMMERMAN Benoit	SOCOTEC – coordination SPS 06.18.94.41.71- benoit.detimmerman@socotec.com				
SIRON Anne	Conseil Régional des Hauts de France (Fonds FEDER) 03.22.97.27.97 - Anne.SIRON@hautsdefrance.fr				

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



• Nom, Prénom :	• Fonction :	Présent	Absent	Excusé	Convocation prochaine réunion
DELANGE Claire	Agence de l'Eau Seine-Normandie 03.44.30.41.38- delange.claire@aesn.fr				
HERBERT Thomas	Exploitant concerné par des aménagements 06.74.58.68.28 – thomas_herbert@orange.fr				
HERBERT Pascal	Exploitant concerné par des aménagements 06.08.03.49.62 – pascal.herbert2@wanadoo.fr		✓		
CAMUS Xavier	Exploitant concerné par des aménagements 06.73.30.29.27 – xavier.camus02@orange.fr		✓		
JAUQUET Philippe	Exploitant concerné par des aménagements 03.23.98.03.61		✓		✓
BRAIDY Hervé	Exploitant concerné par des aménagements 06.32.38.83.11 – braidy.herve@wanadoo.fr			✓	
BAURIN Francis	Exploitant concerné par des aménagements 06.82.32.01.36				
BRAIDY Marc	Exploitant concerné par des aménagements 06.07.39.13.02 – marc.braidy@laposte.net		✓		
DUPONT Alain	Exploitant concerné par des aménagements 06.44.14.49.75				
LINDEKENS Jean-Luc	Exploitant concerné par des aménagements 03.23.98.46.73		✓		✓
STEVENOT Bertrand	Exploitant – 06.86.22.56.21				
DERUELLE Philippe	Exploitant				
BAUDRY Médéric	CGCR 06.30.52.73.48 - mederic.baudry@orange.fr	✓			✓
POTEAU Jean-François	POTEAU Espaces Verts 03.23.58.47.36 – contact@poteau-espacesverts.fr	✓			✓
CHOULETTE Jérémy	POTEAU Espaces Verts 07.84.24.95.92 – direction@poteau-espacesverts.fr			✓	✓
BAUDRIER Mathilde	USAGMA – Assistant à maîtrise d'ouvrage	✓			✓
DANEL Guillaume	ECAA – Maître d'œuvre	✓			✓

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



- **PRESENTATION DES ENTREPRISES :**

LOT N°1:

CGCR - M. BAUDRY: 06.30.52.73.48
mederic.baudry@orange.fr

LOT N°2 :

POTEAU Espaces Verts - M. CHOULETTE : 07.84.24.95.92
direction@poteau-espacesverts.fr

- **ADMINISTRATIF:**

Lot 1 :

Notification du marché le 28/07/2017

Ordre de service n°1 de démarrage de la période de préparation à émettre – fait le 28/09

Ordre de service n°2 de démarrage des travaux au 23/10 – fait le 16/10/2017

Lot 2 :

Notification du marché le 28/07/2017

Ordre de service n°1 de démarrage de la période de préparation à émettre – fait le 28/09

Ordre de service n°2 de démarrage des travaux au 25/10 – fait le 18/10/2017.

Planning général :

Démarrage travaux du lot 1 : 23 octobre – option gabion en août 2018

Démarrage des plantations lot 2 : 24 octobre

Travaux actuellement en arrêt pour intempérie pour le lot 1 et 2.

Documents à remettre par les entreprises des lots 1 et 2 :

- **Planning Lot 1 avec l'ensemble des travaux sur les fossés**

Documents à transmettre aux entreprises :

- Modèle de panneau de chantier à mettre en place avant les travaux (AMO>CGCR) – **Fait et transmis, en attente de la pose.**

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



● **TRAVAUX :**

Organisation des travaux :


- Base vie installée sur la commune de Landouzy la cour,
- PPSPS à transmettre au coordinateur SPS,
- Stockage de matériaux : l'entreprise CGCR réalisera ses apports en matériaux depuis le dépôt de la société à Buire,
- Réalisation des ouvrages en gabion : fabrication sur le site, pas de recours à la préfabrication
- Abattage d'arbres pour réalisation des accès aux ravines où sont situés les gabions, marquage sur site et selon avis des propriétaires.

● **POINTS TECHNIQUES VUS EN REUNION : LOT 1**

- **Travaux en arrêt pour cause d'intempérie.**

Prairie inondable :

- Prise des dimensions ce jour des ouvrages hydrauliques à poser en traversée de chaussée au droit de la prairie inondable.
- L'implantation du fossé exutoire de la prairie est à voir sur site avec les 2 propriétaires riverains car à ce jour deux clôtures sont présentes et l'espace intérieur est boisé.

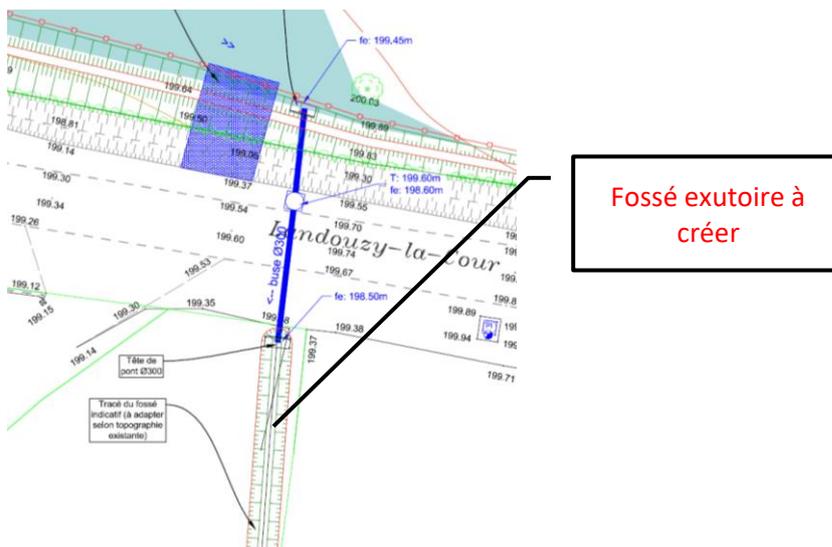


- Réfection des entrées de champs par la pose de cadre BA de section 1m * 0,4m. Les cadres vont être remplacés par la pose de canalisation BA de diamètre 600 mm. Des têtes de sécurité seront posées en amont et aval. De plus, la largeur du fossé actuel ne permet pas la pose d'un cadre tel que défini au marché et il n'y n'existe pas des têtes de sécurité pour cadre.

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



• **POINTS TECHNIQUES VUS EN REUNION : LOT 2**

- Plantations terminées sur les haies 1023, 116, 1024, 113 et n°6

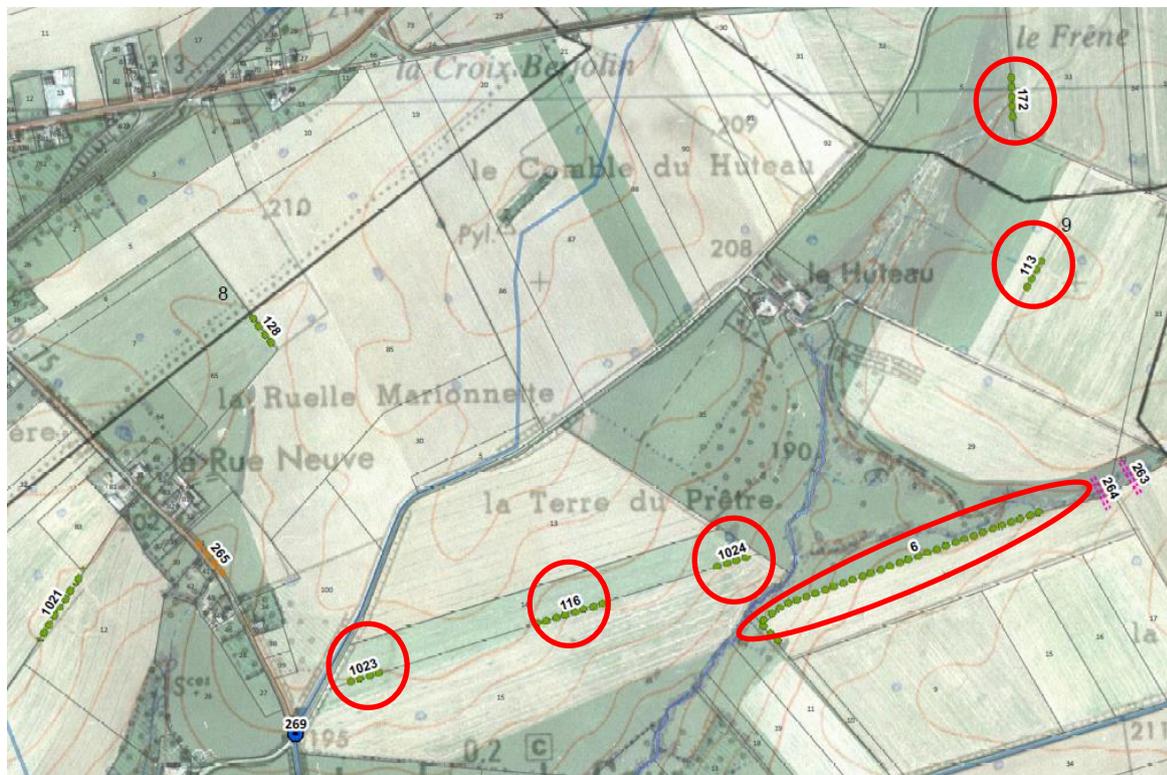

- Travaux à terminer sur les haies 1006, 1007, 1008 et 172 : Paillage et plantation

Chantier actuellement en intempéries



Haie 1006



Haie 1007

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.





Vues des dégâts suite aux intempéries des mois de décembre 2017 et janvier 2018

Ravinement au droit de la haie 161 – Allongement prévu sur 20 m.

Essayer d'intervenir semaine 08 par le labour.



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Vue sur une des plantations de la haie n°6 compris paillage.

Il reste à pailler les autres secteurs de cette haie.



Vue sur le tronçon de la haie 172 où passe actuellement un écoulement d'eau important et à ce jour gelé

Reste 40 plants à planter sur la 172 au droit de l'écoulement d'eau actuellement en cours.

La plantation ne peut être actuellement terminée.

Un renforcement des plants par tuteurage sera nécessaire pour assurer le maintien des plants durant leurs premières années de croissance afin d'éviter tout déracinement par le flux d'eau.



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



RAPPELS :

- Sont plantées à ce jour, les haies : 6, 113, 116, 172 (sauf 10m au droit du talweg), 1023, 1024, 1021, 146, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 1002, 1005, 1008, 1009 et 1046 soit un linéaire de 1 516 m.
- En cours de plantation : 1006 et 1007

Il est nécessaire de réaliser le paillage à l'avancement des plantations afin de libérer les terres pour les labours par les exploitants.

A faire pour le Lot 2 :

- **Plantations à venir sur les haies 128 et 180**
- Piquetage à prévoir des deux dernières haies 1037 et 1054
- Allongement de la haie 161 de 20 ml
- **Reprise à prévoir des milieux de haies arrachées ou couchées à cause des intempéries**
- **Un plant a disparu dans la 1007, reste les tuteurs....**



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Tableau récapitulatif de l'avancée du piquetage et des plantations des haies

Avancée haies							Exploitants
Numéro identifiant ouvrage	Type	Dimensions conventionnées	Dimensions piquetées	Parcelle concernée	Piquetage réalisé	Plantation réalisée	
6	Haie	100	149	ZC 0030	X	X	Marc Braidy
113	Haie	74	50	ZC 0028	X	X	Hervé Braidy
116	Haie	273	286	ZB 0015	X	X	Alain Dupont
172	Haie	50	26	ZA 0033 ZA 0005	X	X (sauf milieu)	Jean-Luc Lindekens
1023	Haie	124	128	ZB 0015	X	X	Thomas Herbert
1024	Haie	80	80	ZB 0014	X	X	Pascal Herbert
128	Haie	15	30	ZB 107 ZB 0065	X		Xavier Camus
1021	Haie	162	125	ZA 0012 ZA 0084	X	X	Philippe Jauquet
180	Haie	100	100	ZH 013 ZH 0006	X		Francis Baurin
1037	Haie	110		ZI 0043			Terminée = Plantation + paillage réalisés
1054	Haie	98		ZH 0009			
146	Haie spéciale pâture	15	10	ZI 0006 ZI 0005	X	X	
160	Haie	50	40	ZI 0005	X	X	
161	Haie	40	36 + 20	ZI 0025	X	A allonger	
163	Haie	40	40	ZI 0004	X	X	
165	Haie	47	65	ZI 0001	X	X	
166	Haie	55	55	ZI 0003	X	X	
167	Haie	57	47	ZI 0081	X	X	
1002	Haie	95	95	ZI 0028	X	X	
1005	Haie	130	130	ZI 0003	X	X	
1006	Haie	60	93	ZI 0001	X	X (en cours)	
1007	Haie	140	140	ZI 0025	X	X (en cours)	
1008	Haie	90	105	RD 1850	X	X	
1009	Haie	20	9	ZI 0001	X	X	
1046	Haie	53	50	ZI 0003	X	X	

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Prochaine réunion :

**Le mercredi 28 février 2018 à 9h00 en mairie de Landouzy-la-Cour
pour le suivi des travaux de plantations et planning lot 1**

Objet :**Suivi des travaux du lot 1 et lot 2**

- Piquetage à prévoir pour les haies 1037 (M. Jauquet) et 1054 (M. Lindekens).
- Tracé du fossé exutoire de la prairie inondable avec les propriétaires

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Région
Hauts-de-France

