

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT AMONT DE LA SERRE ET DU VILPION

Travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion

Bassin versant du ruisseau de Landouzy

Compte-rendu n°12 de la réunion du 28 Février 2018

• Lieu :	Mairie de Landouzy-la-Cour à 9h
-----------------	---------------------------------

• Maître d'ouvrage (MO) : Syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion M. LEFEBVRE: 06.11.92.55.79 jeanluc.lefebvre@free.fr	
• Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) : Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques Melle BAUDRIER : 07.85.21.13.37 union-des-syndicats@griv.fr	• Maître d'œuvre (MOE) Bureau d'études ECAA M. DANIEL : 07.70.29.68.53 gdaniel@ecaa02.fr
• Coordonnateur SPS SOCOTEC M. DE TIMMERMAN : 06.18.94.41.71 Benoit.detimmerman@socotec.com	
• Entreprise Lot 1 : Terrassements, aménagements hydrauliques et enrochements CGCR M. BAUDRY : 06.30.52.73.48 mederic.baudry@orange.fr	• Entreprise Lot 2 : Plantations de haies, enherbement et clôtures POTEAU Espaces Verts M. CHOULETTE : 07.84.24.95.92 direction@poteau-espacesverts.fr

PROCHAINE REUNION LE 14 MARS 2018 A 9H – MAIRIE DE LANDOUZY-LA-COUR

Les personnes convoquées à la prochaine réunion sont indiquées dans le tableau ci-après (en dernière colonne).

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Nom, Prénom :	Fonction :	Présent	Absent	Excusé	Convocation prochaine réunion
LEFEBVRE Jean-Luc	Président du syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion	✓			✓
LE ROUX Patrice	Vice-Président du syndicat - pafler@aol.com		✓		✓
DEBESSE Laurent	Vice-Président du syndicat - laurent.debesse664@orange.fr		✓		✓
PAYAN Claude	Maire de Landouzy-la-Cour 06.32.99.85.20 - claud.payan@laposte.fr				
BAURIN Véronique	Adjointe et propriétaire à Landouzy-la-Cour				
BRUGGEMAN Jean-Claude	Adjoint au maire de Landouzy-la-Cour				
BOURY Christophe	Maire et délégué titulaire de Thenailles - maire.thenaille@wanadoo.fr				
PINCKERS Christiane	Maire d'Origny-en-Thiérache - origny02@orange.fr				
BRANQUART Marinella	Maire de Landouzy-la-Ville – landouzyville-mairie@wanadoo.fr				
STEVENOT Cyrille	Maire et délégué titulaire de La Bouteille - mairiedelabouteille@wanadoo.fr				
BLARY René	Maire de Plomion - mairie.plomion@wanadoo.fr				
PRINCE Jean-Marc	Maire de Vervins - vervins@free.fr				
MALOT Delphine	Communauté de Communes des Trois Rivières d.malot@cc3r.fr				
RAFFIN Vanessa	Communauté de communes de la Thiérache du Centre 06 38 25 18 30 - v.raffin@cc-tc.com				
FEREZ Pascal	CD 02- Voirie Départementale 06.07.12.82.52 - pferez@aisne.fr				
QUENTIN Damien	Direction Départementale des Territoires Aisne – Unité Police de l'Eau				
AMBROSINO Stéphanie	Mission érosion -Chambre d'Agriculture 02 03.23.22.51.08 – stephanie.ambrosino@ma02.org				
DE TIMMERMAN Benoit	SOCOTEC – coordination SPS 06.18.94.41.71- benoit.detimmerman@socotec.com				

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



• Nom, Prénom :	• Fonction :	Présent	Absent	Excusé	Convocation prochaine réunion
SIRON Anne	Conseil Régional des Hauts de France (Fonds FEDER) 03.22.97.27.97 - Anne.SIRON@hautsdefrance.fr				
DELANGE Claire	Agence de l'Eau Seine-Normandie 03.44.30.41.38- delange.claire@aesn.fr				
HERBERT Thomas	Exploitant concerné par des aménagements 06.74.58.68.28 – thomas_herbert@orange.fr				
HERBERT Pascal	Exploitant concerné par des aménagements 06.08.03.49.62 – pascal.herbert2@wanadoo.fr				
CAMUS Xavier	Exploitant concerné par des aménagements 06.73.30.29.27 – xavier.camus02@orange.fr				
JAUQUET Philippe	Exploitant concerné par des aménagements 03.23.98.03.61	✓			✓
BRAIDY Hervé	Exploitant concerné par des aménagements 06.32.38.83.11 – braidy.herve@wanadoo.fr				
BAURIN Francis	Exploitant concerné par des aménagements 06.82.32.01.36				
BRAIDY Marc	Exploitant concerné par des aménagements 06.07.39.13.02 – marc.braidy@laposte.net				
DUPONT Alain	Exploitant concerné par des aménagements 06.44.14.49.75				
LINDEKENS Jean-Luc	Exploitant concerné par des aménagements 03.23.98.46.73		✓		
STEVENOT Bertrand	Exploitant – 06.86.22.56.21				
DERUELLE Philippe	Exploitant				
BAUDRY Médéric	CGCR 06.30.52.73.48 - mederic.baudry@orange.fr			✓	✓
POTEAU Jean-François	POTEAU Espaces Verts 03.23.58.47.36 – contact@poteau-espacesverts.fr			✓	✓
CHOULETTE Jérémie	POTEAU Espaces Verts 07.84.24.95.92 – direction@poteau-espacesverts.fr	✓			✓
BAUDRIER Mathilde	USAGMA – Assistant à maîtrise d'ouvrage	✓			✓
DANEL Guillaume	ECAA – Maître d'œuvre	✓			✓

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



- **PRESENTATION DES ENTREPRISES:**

LOT N°1:

CGCR - M. BAUDRY: 06.30.52.73.48
mederic.baudry@orange.fr

LOT N°2 :

POTEAU Espaces Verts - M. CHOULETTE : 07.84.24.95.92
direction@poteau-espacesverts.fr

- **ADMINISTRATIF:**

Lot 1 :

Notification du marché le 28/07/2017

Ordre de service n°1 de démarrage de la période de préparation à émettre – fait le 28/09

Ordre de service n°2 de démarrage des travaux au 23/10 – fait le 16/10/2017

Lot 2 :

Notification du marché le 28/07/2017

Ordre de service n°1 de démarrage de la période de préparation à émettre – fait le 28/09

Ordre de service n°2 de démarrage des travaux au 25/10 – fait le 18/10/2017.

Planning général :

Démarrage travaux du lot 1 : 23 octobre – option gabion en août 2018

Démarrage des plantations lot 2 : 24 octobre

Travaux actuellement en arrêt pour intempérie pour le lot 1 et 2.

Documents à remettre par les entreprises des lots 1 et 2 :

- **Urgent : Planning Lot 1 avec l'ensemble des travaux sur les fossés à transmettre**

Documents à transmettre :

- Modèle de panneau de chantier à mettre en place avant les travaux (AMO>CGCR) – **Fait et transmis, RAPPEL : en attente de la pose.**
- **Courrier à l'ensemble des exploitants pour une validation de la mise en place des haies. (AMO>exploitants)**

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



• TRAVAUX:

Organisation des travaux :

- Base vie installée sur la commune de Landouzy la cour,
- PPSPS à transmettre au coordinateur SPS,
- Stockage de matériaux : l'entreprise CGCR réalisera ses apports en matériaux depuis le dépôt de la société à Buire,
- Réalisation des ouvrages en gabion : fabrication sur le site, pas de recours à la préfabrication
- Abattage d'arbres pour réalisation des accès aux ravines où sont situés les gabions, marquage sur site et selon avis des propriétaires.


• POINTS TECHNIQUES VUS EN REUNION : LOT 1

- Travaux en arrêt pour cause d'intempérie (gel). **Redémarrage semaine 10 à confirmer.**

Prairie inondable :

Prise des dimensions ce jour des ouvrages hydrauliques à poser en traversée de chaussée au droit de la prairie inondable.

L'implantation du fossé exutoire de la prairie est à voir sur site avec les 2 propriétaires riverains car à ce jour deux clôtures sont présentes et l'espace intérieur est boisé. **En attente RDV avec les 2 propriétaires**

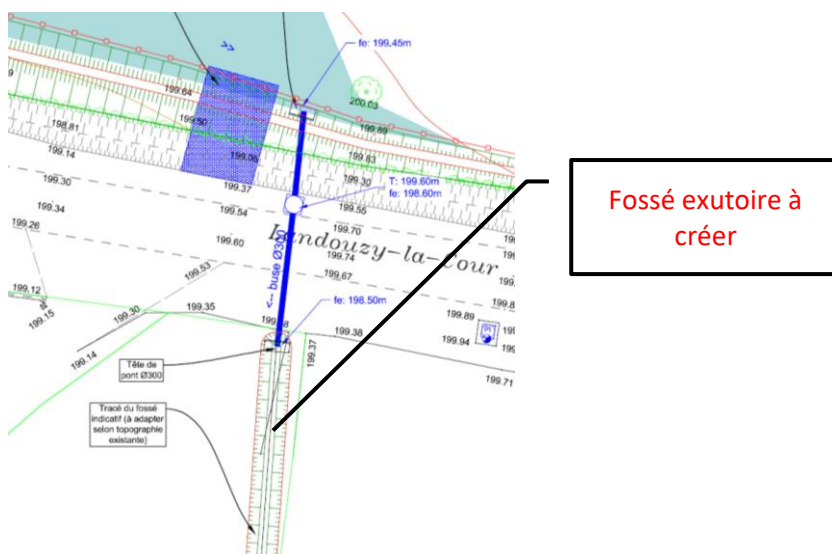

- Réfection des entrées de champs par la pose de cadre BA de section 1m * 0,4m. Les cadres vont être remplacés par la pose de canalisation BA de diamètre 600 mm. Des têtes de sécurité seront posées en amont et aval. De plus, la largeur du fossé actuel ne permet pas la pose d'un cadre tel que défini au marché et il n'y n'existe pas des têtes de sécurité pour cadre.

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



- Un Frêne est présent au droit du bornage de l'emprise de la digue. Celui-ci sera abattu et mis à la disposition du propriétaire dans la pâture, validé avec M. JAUQUET à ce jour.



Les travaux de la prairie inondable doivent être terminés le 13/04/2018 pour la remise en pâture des animaux.

• **POINTS TECHNIQUES VUS EN REUNION : LOT 2**


- Envoi d'un courrier à l'ensemble des exploitants ayant fait l'objet de plantations de haies pour leur demander la réception des travaux réalisés.
- Les plantations et paillages sont terminés hormis pour les haies 1037 et 1054.



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Concernant la haie 1054, il apparaît que celle-ci doit être plantée sur un accotement plus haut que le champ.

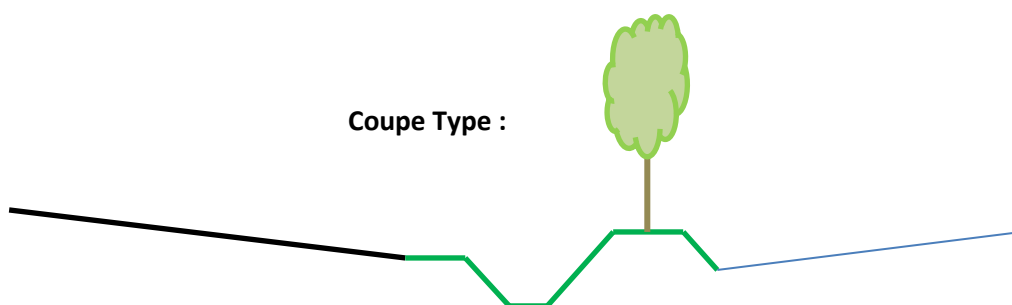

Il a été décidé en réunion, que cette haie qui n'a aucun impact sur le ruissellement ne sera pas plantée.

De plus, la plantation de la 1037 est en attente de validation par l'exploitant car elle est jugée inutile contre les ruissellements en amont de la pâture et difficile à implanter du fait de la présence d'arbres tout le long de la clôture.

En attente d'un nouvel emplacement pour la haie 1037 à voir avec M. JAUQUET.

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Vue sur le tronçon de la haie 172 qui ne pouvait être planté sans pose de tuteur

Avant



Après pose de tuteur



Seule la pose du paillage ne sera pas réalisée afin d'éviter un enlèvement de celui-ci lors de fortes précipitations.

Vues sur les haies 1023, 116 et 1024



Haie 1024



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.





Haie 116



Haie 1023




Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.





Vues sur la haie 128

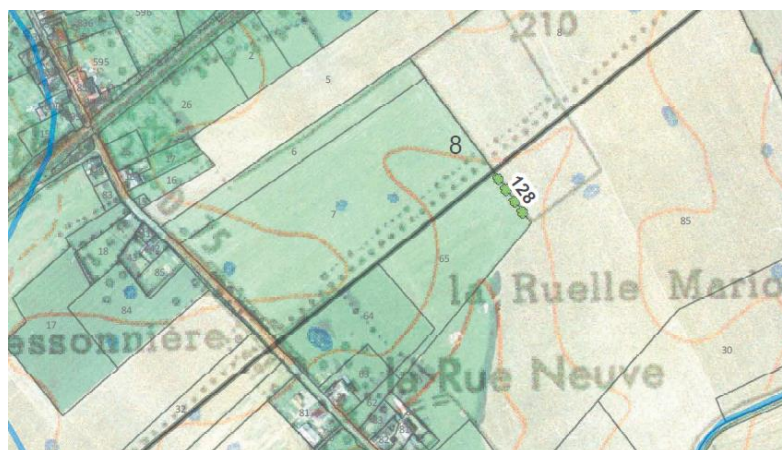

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Tableau récapitulatif de l'avancée du piquetage et des plantations des haies

							Exploitants
Numéro identifiant ouvrage	Type	Dimensions conventionnées	Dimensions piquetées	Parcelle concernée	Piquetage réalisé	Plantation réalisée	Marc Braidy
6	Haie	100	149	ZC 0030	X	X	Hervé Braidy
113	Haie	74	50	ZC 0028	X	X	Alain Dupont
116	Haie	273	286	ZB 0015	X	X	Jean-Luc Lindekens
172	Haie	50	26	ZA 0033	X	X	Thomas Herbert
				ZA 0005			
1023	Haie	124	128	ZB 0015	X	X	Pascal Herbert
1024	Haie	80	80	ZB 0014	X	X	Xavier Camus
128	Haie	15	30	ZB 107	X	X	Philippe Jauquet
				ZB 0065			
1021	Haie	162	125	ZA 0012	X	X	Francis Baurin
				ZA 0084			
180	Haie	100	100	ZH 013	X	X	
				ZH 0006			
1037	Haie	110	130	ZI 0043	Attente avis propriétaire		Terminée = Plantation + Paillage réalisé
1054	Haie	98	0	ZH 0009	Ne sera pas plantée		
146	Haie spéciale pâture	15	10	ZI 0006	X	X	
				ZI 0005			
160	Haie	50	40	ZI 0005	X	X	
161	Haie	40	36 + 20	ZI 0025	X	X	
163	Haie	40	40	ZI 0004	X	X	
165	Haie	47	65	ZI 0001	X	X	
166	Haie	55	55	ZI 0003	X	X	
167	Haie	57	47	ZI 0081	X	X	
1002	Haie	95	95	ZI 0028	X	X	
1005	Haie	130	130	ZI 0003	X	X	
1006	Haie	60	93	ZI 0001	X	X	
1007	Haie	140	140	ZI 0025	X	X	
1008	Haie	90	105	RD 1850	X	X	
1009	Haie	20	9	ZI 0001	X	X	
1046	Haie	53	50	ZI 0003	X	X	

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Prochaine réunion :

**Le mercredi 14 mars 2018 à 9h00 en mairie de Landouzy-la-Cour
pour le suivi des travaux de plantations et planning lot 1**

Objet :

Suivi des travaux du lot 1 et lot 2

- Piquetage à prévoir pour la haie 1037 (M. Jauquet)
- Tracé du fossé exutoire de la prairie inondable avec les propriétaires

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.

