

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT AMONT DE LA SERRE ET DU VILPION

Travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion

Bassin versant du ruisseau de Landouzy

Compte-rendu n°17 de la réunion du 16 mai 2018

• Lieu :	Mairie de Landouzy-la-Cour à 9h
-----------------	---------------------------------

• Maître d'ouvrage (MO) :	
Syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion M. LEFEBVRE: 06.11.92.55.79 jeanluc.lefebvre@free.fr	
• Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) :	• Maître d'œuvre (MOE)
Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques Melle BAUDRIER : 07.85.21.13.37 union-des-syndicats@griv.fr	Bureau d'études ECAA M. DANIEL : 07.70.29.68.53 gdaniel@ecaa02.fr
• Coordonnateur SPS	
SOCOTEC M. DE TIMMERMAN : 06.18.94.41.71 Benoit.detimmerman@socotec.com	
• Entreprise Lot 1 : Terrassements, aménagements hydrauliques et enrochements	• Entreprise Lot 2 : Plantations de haies, enherbement et clôtures
CGCR M. BAUDRY : 06.30.52.73.48 mederic.baudry@orange.fr	POTEAU Espaces Verts M. CHOLETTE : 07.84.24.95.92 direction@poteau-espacesverts.fr

PROCHAINE REUNION LE 23 MAI 2018 A 14H – MAIRIE DE LANDOUZY-LA-COUR

Les personnes convoquées à la prochaine réunion sont indiquées dans le tableau ci-après (en dernière colonne).

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



• Nom, Prénom :	• Fonction :	Présent	Absent	Excusé	Convocation prochaine réunion
LEFEBVRE Jean-Luc	Président du syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion	✓			✓
LE ROUX Patrice	Vice-Président du syndicat - pafler@aol.com		✓		✓
DEBESSE Laurent	Vice-Président du syndicat - laurent.debesse664@orange.fr		✓		✓
MODRIC Pierre	Vice-Président du syndicat	✓			✓
BOURGEOIS sylvain	Vice-Président du syndicat- commune-de-jeantes@orange.fr		✓		✓
PAYAN Claude	Maire de Landouzy-la-Cour 06.32.99.85.20 - claud.payan@laposte.fr		✓		✓
BAURIN Véronique	Adjointe et propriétaire à Landouzy-la-Cour		✓		✓
BRUGGEMAN Jean-Claude	Adjoint au maire de Landouzy-la-Cour	✓			✓
BOURY Christophe	Maire de Thenailles - maire.thenaille@wanadoo.fr				
PINCKERS Christiane	Maire d'Origny-en-Thiérache - origny02@orange.fr				
BRANQUART Marinella	Maire de Landouzy-la-Ville – landouzylaville-mairie@wanadoo.fr				
STEVENOT Cyrille	Maire de La Bouteille - mairiedelabouteille@wanadoo.fr				
BLARY René	Maire de Plomion - mairie.plomion@wanadoo.fr				
PRINCE Jean-Marc	Maire de Vervins - vervins@free.fr				
MALOT Delphine	Communauté de Communes des Trois Rivières d.malot@cc3r.fr		✓		✓
RAFFIN Vanessa	Communauté de communes de la Thiérache du Centre 06 38 25 18 30 - v.raffin@cc-tc.com		✓		✓
FEREZ Pascal	CD 02- Voirie Départementale 06.07.12.82.52 - pferez@aisne.fr		✓		✓
QUENTIN Damien	Direction Départementale des Territoires Aisne – Unité Police de l'Eau		✓		✓
AMBROSINO Stéphanie	Mission érosion -Chambre d'Agriculture 02 03.23.22.51.08 – stephanie.ambrosino@ma02.org		✓		✓
DE TIMMERMAN Benoit	SOCOTEC – coordination SPS 06.18.94.41.71- benoit.detimmerman@socotec.com		✓		✓

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



• Nom, Prénom :	• Fonction :	Présent	Absent	Excusé	Convocation prochaine réunion
SIRON Anne	Conseil Régional des Hauts de France (Fonds FEDER) 03.22.97.27.97 - Anne.SIRON@hautsdefrance.fr			✓	✓
DELANGE Claire	Agence de l'Eau Seine-Normandie 03.44.30.41.38- delange.claire@aesn.fr		✓		✓
HERBERT Thomas	Exploitant concerné par des aménagements 06.74.58.68.28 – thomas_herbert@orange.fr				
HERBERT Pascal	Exploitant concerné par des aménagements 06.08.03.49.62 – pascal.herbert2@wanadoo.fr				
CAMUS Xavier	Exploitant concerné par des aménagements 06.73.30.29.27 – xavier.camus02@orange.fr				
JAUQUET Philippe	Exploitant concerné par des aménagements 03.23.98.03.61	✓			✓
BRAIDY Hervé	Exploitant concerné par des aménagements 06.32.38.83.11 – braidy.herve@wanadoo.fr				
BAURIN Francis	Exploitant concerné par des aménagements 06.82.32.01.36				
BRAIDY Marc	Exploitant concerné par des aménagements 06.07.39.13.02 – marc.braidy@laposte.net				
DUPONT Alain	Exploitant concerné par des aménagements 06.44.14.49.75				
LINDEKENS Jean-Luc	Exploitant concerné par des aménagements 03.23.98.46.73				
BOUTILLIER Thierry	Exploitant agricole – 06.80.70.92.34				✓
BODCHON Jean-Luc	Propriétaire riverain - 06.98.40.44.63				✓
BAUDRY Médéric	CGCR 06.30.52.73.48 - mederic.baudry@orange.fr	✓			✓
POTEAU Jean-François	POTEAU Espaces Verts 03.23.58.47.36 – contact@poteau-espacesverts.fr		✓		✓
CHOULETTE Jérémy	POTEAU Espaces Verts 07.84.24.95.92 – direction@poteau-espacesverts.fr		✓		✓
BAUDRIER Mathilde	USAGMA – Assistant à maîtrise d'ouvrage	✓			✓
DANEL Guillaume	ECAA – Maître d'œuvre	✓			✓

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



- **PRESENTATION DES ENTREPRISES :**

LOT N°1:

CGCR - M. BAUDRY: 06.30.52.73.48
mederic.baudry@orange.fr

LOT N°2 :

POTEAU Espaces Verts - M. CHOLETTE : 07.84.24.95.92
direction@poteau-espacesverts.fr

- **ADMINISTRATIF :**

Lot 1 :

Notification du marché le 28/07/2017

Ordre de service n°1 de démarrage de la période de préparation à émettre – fait le 28/09

Ordre de service n°2 de démarrage des travaux au 23/10 – fait le 16/10/2017

Lot 2 :

Notification du marché le 28/07/2017

Ordre de service n°1 de démarrage de la période de préparation à émettre – fait le 28/09

Ordre de service n°2 de démarrage des travaux au 25/10 – fait le 18/10/2017.

Planning général :

Démarrage travaux du lot 1 : 23 octobre – option gabion en août 2018

Démarrage des plantations lot 2 : 24 octobre

Reprise des travaux le Lundi 9 Avril 2018

Documents transmis :

- Panneau de chantier posé
- **Courrier envoyé aux exploitants agricoles pour valider les haies – (date limite de réponse 25.04.2018)**

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



● **TRAVAUX :**

Organisation des travaux :

- Base vie installée sur la commune de Landouzy la cour,
- PPSPS à transmettre au coordinateur SPS,
- Stockage de matériaux : l'entreprise CGCR réalisera ses apports en matériaux depuis le dépôt de la société à Buire.

● **POINTS TECHNIQUES VUS EN REUNION : LOT 1**

TRAVAUX EN COURS

Prairie inondable :

Travaux réalisés à 60 %, il reste à poser la canalisation exutoire.
Les travaux sont en cours pour la pose des canalisations sous les entrées de champs.



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.






Une clôture électrique sera mise en place avant fin mai 2018 par l'entreprise CGCR le temps que l'engazonnement de type prairie pousse.

De plus, une clôture est prévue dans le marché du lot 2, la clôture va pouvoir être implantée en pied de digue.

Exutoire prairie inondable

Réalisation du fossé exutoire, abatage des arbres prévus le 25/05.

Il est important de noter que des conventions ont été signées avec les deux riverains. L'exploitant M. BOUTILLIER (06.80.70.92.34) a accepté que les entreprises passent par sa pâture pour abattre les arbres et créer le fossé à condition de remettre en état. Les arbres quant à eux seront disposés sur la propriété de M. BODCHON (06.98.40.44.63) ou évacués en décharge.

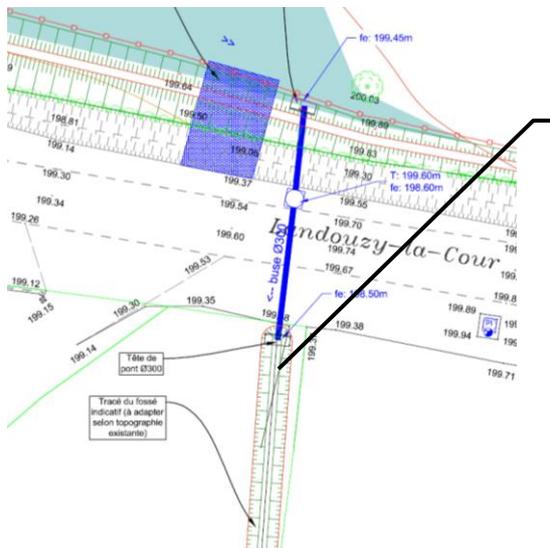

Fossé exutoire à créer



CGCR doit prendre contact avec les concessionnaires présents au droit de l'arbre à enlever qui supporte actuellement un câble Télécom. Pose de chandelle de part et d'autre de l'arbre.

CGCR a vu avec l'entreprise POTEAU les arbres à abattre. Devis transmis et sera acté en avenant au marché.

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Entrées de champs – fossés le long de la route départementale D75

Réfection des entrées de champs par la pose de cadre BA de section 1m * 0,4m.

Les cadres vont être remplacés par la pose de canalisation BA de diamètre 600 mm.

Des têtes de sécurité seront posées en amont et aval. De plus, la largeur du fossé actuel ne permet pas la pose d'un cadre tel que défini au marché et il n'y n'existe pas des têtes de sécurité pour cadre.

Une modification est faite pour l'entrée de champs en amont, par la pose d'une canalisation en diamètre 400 mm

FINITIONS RESTANTES A FAIRE

Fossé à redents 204 :



Pose des redents dans le fossé 204 à faire
Caniveau grille posé et enrobés réalisés

Vues sur le caniveau grille posé et les enrobés réalisés



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Fossé 203 :

Empierrement du fossé 203 réalisé
Redents implantés en amont du fossé

Reste à faire : Reprendre l'entrée au champ

Vues sur les redents en amont du chemin – prolongement du fossé 203



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Profilé renforcé 214 :

Profilé renforcé terminés
 Reste à faire la cunette vers le fossé

Vues des travaux terminés



La mise en œuvre de la terre végétale dans les cunettes créées ne sera pas faite dans l'immédiat. Le maître d'ouvrage se laisse le temps de voir comment l'ouvrage se comporte jusqu'au mois d'août.

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.




Vue sur l'accotement sens amont/aval – reprise de la cunette à faire/terminer



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Fossé à redents 206 :

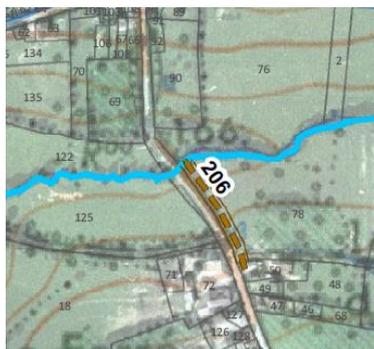

Travaux dans l'ensemble terminés

Un bourrage en béton est à faire sous la tête de pont afin d'éviter tout affaissement ainsi que la réalisation d'une petite descente d'eau en enrochements pour éviter l'érosion de la sortie de buse.



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.





Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



INSTRUCTIONS SUR LES TRAVAUX RESTANTS A FAIRE

Ouvrage 269



Réalisation d'une entrée de champ avec canalisation au droit du champ de M. CAMUS avec dérasement de l'accotement en amont.



Dérasement également à faire côté habitation jusqu'à la tête de sécurité.



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



TRAVAUX TERMINES

Ouvrage 266 : Travaux terminés

- **POINTS TECHNIQUES VUS EN REUNION : LOT 2**

- Courrier envoyé à l'ensemble des exploitants ayant fait l'objet de plantations de haies pour leur demander la réception des travaux réalisés.
- Les plantations et paillages sont terminés
- **La mise en place de la clôture le long de la haie 1037 est urgente pour permettre à M. JAUQUET de remettre ses bêtes en pâture**
L'entreprise POTEAU devait transmettre un devis à M. JAUQUET pour cette clôture – **Fait**
- **La mise en place de la clôture est possible à la prairie inondable.**

En retour aux courriers envoyés aux exploitants, certains milieux de haie seraient à reprendre à cause des fortes pluies, notamment les haies implantées sur les parcelles de M. CAMUS, M. HERBERT Thomas et M. HERBERT Pascal.

La réception des travaux de plantation sera faite avec en réserve la reprise des dégâts.

Il est demandé à l'entreprise POTEAU de procéder à l'enlèvement des copeaux de bois restants qui ont servi au paillage de la haie n°6.

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Région
Hauts-de-France



Tableau récapitulatif de l'avancée du piquetage et des plantations des haies

Numéro identifiant ouvrage	Type	Dimensions conventionnées	Dimensions piquetées	Parcelle concernée	Piquetage réalisé	Plantation réalisée	Exploitants	
6	Haie	100	149	ZC 0030	X	X	Marc Braidy	Hervé Braidy
113	Haie	74	50	ZC 0028	X	X	Alain Dupont	
116	Haie	273	286	ZB 0015	X	X	Jean-Luc Lindekens	
172	Haie	50	26	ZA 0033 ZA 0005	X	X	Thomas Herbert	
1023	Haie	124	128	ZB 0015	X	X	Pascal Herbert	
1024	Haie	80	80	ZB 0014	X	X	Xavier Camus	
128	Haie	15	30	ZB 107 ZB 0065	X	X	Philippe Jauquet	
1021	Haie	162	125	ZA 0012 ZA 0084	X	X	Francis Baurin	
180	Haie	100	100	ZH 013 ZH 0006	X	X		
1037	Haie	110	198 sur 1 rg	ZE 0013	X	X		
1054	Haie	98	0	ZH 0009	Ne sera pas plantée			
146	Haie spéciale pâture	15	10	ZI 0006 ZI 0005	X	X		Terminée = Plantation + Paillage réalisé
160	Haie	50	40	ZI 0005	X	X		
161	Haie	40	36 + 20	ZI 0025	X	X		
163	Haie	40	40	ZI 0004	X	X		
165	Haie	47	65	ZI 0001	X	X		
166	Haie	55	55	ZI 0003	X	X		
167	Haie	57	47	ZI 0081	X	X		
1002	Haie	95	95	ZI 0028	X	X		
1005	Haie	130	130	ZI 0003	X	X		
1006	Haie	60	93	ZI 0001	X	X		
1007	Haie	140	140	ZI 0025	X	X		

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



1008	Haie	90	105	RD 1850	X	X
1009	Haie	20	9	ZI 0001	X	X
1046	Haie	53	50	ZI 0003	X	X

Prochaine réunion :

**Le mercredi 23 mai 2018 à 14h00 en mairie de Landouzy-la-Cour
pour le suivi des travaux**

Objet :

Suivi des travaux du lot 1 et lot 2

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Région
Hauts-de-France

