

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT AMONT DE LA SERRE ET DU VILPION

Travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion

Bassin versant du ruisseau de Landouzy

Compte-rendu n°10 de la réunion du 24 janvier 2018

• Lieu :	Mairie de Landouzy-la-Cour à 9h	
• Maître d'ouvrage (MO) :	Syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion M. LEFEBVRE: 06.11.92.55.79 jeanluc.lefebvre@free.fr	
• Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO):	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques Melle BAUDRIER : 07.85.21.13.37 union-des-syndicats@griv.fr	• Maître d'œuvre (MOE) Bureau d'études ECAA M. DANIEL : 07.70.29.68.53 gdaniel@ecaa02.fr
• Coordonnateur SPS	SOCOTEC M. DE TIMMERMAN : 06.18.94.41.71 Benoit.detimmerman@socotec.com	
• Entreprise Lot 1 : Terrassements, aménagements hydrauliques et enrochements	CGCR M. BAUDRY : 06.30.52.73.48 mederic.baudry@orange.fr	• Entreprise Lot 2 : Plantations de haies, enherbement et clôtures POTEAU Espaces Verts M. CHOULETTE : 07.84.24.95.92 direction@poteau-espacesverts.fr

PROCHAINE REUNION LE 7 FEVRIER 2018 A 9H – MAIRIE DE LANDOUZY-LA-COUR

Les personnes convoquées à la prochaine réunion sont indiquées dans le tableau ci-après (en dernière colonne).

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



• Nom, Prénom :	• Fonction :	Présent	Absent	Excusé	Convocation prochaine réunion
LEFEBVRE Jean-Luc	Président du syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion	✓			✓
LE ROUX Patrice	Vice-Président du syndicat - pafler@aol.com		✓		✓
DEBESSE Laurent	Vice-Président du syndicat - laurent.debesse664@orange.fr		✓		✓
PAYAN Claude	Maire de Landouzy-la-Cour 06.32.99.85.20 - claud.payan@laposte.fr		✓		
BAURIN Véronique	Adjointe et propriétaire à Landouzy-la-Cour				
BRUGGEMAN Jean-Claude	Adjoint au maire de Landouzy-la-Cour		✓		
BOURY Christophe	Maire et délégué titulaire de Thenailles - maire.thenaille@wanadoo.fr				
PINCKERS Christiane	Maire d'Origny-en-Thiérache - origny02@orange.fr				
DUBREUIL Lionel	Délégué titulaire d'Origny-en-Thiérache au syndicat - lionel.dubreuil@cegetel.net				
BRANQUART Marinella	Maire de Landouzy-la-Ville – landouzyville-mairie@wanadoo.fr				
PELLET Claude	Délégué titulaire de Landouzy-la-Ville au syndicat - claudepellet@orange.fr				
STEVENOT Cyrille	Maire et délégué titulaire de La Bouteille - mairiedelabouteille@wanadoo.fr				
BLARY René	Maire de Plomion - mairie.plomion@wanadoo.fr				
BERNAILLE Vincent	Délégué titulaire de Plomion au syndicat				
PRINCE Jean-Marc	Maire de Vervins - vervins@free.fr				
MALOT Delphine	Communauté de Communes des Trois Rivières d.malot@cc3r.fr				
RAFFIN Vanessa	Communauté de communes de la Thiérache du Centre 06 38 25 18 30 - v.raffin@cc-tc.com		✓		
FEREZ Pascal	CD 02- Voirie Départementale 06.07.12.82.52 - pferez@aisne.fr		✓		
QUENTIN Damien	Direction Départementale des Territoires Aisne – Unité Police de l'Eau		✓		

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



• Nom, Prénom :	• Fonction :	Présent	Absent	Excusé	Convocation prochaine réunion
AMBROSINO Stéphanie	Mission érosion -Chambre d'Agriculture 02 03.23.22.51.08 – stephanie.ambrosino@ma02.org		✓		
DE TIMMERMAN Benoit	SOCOTEC – coordination SPS 06.18.94.41.71- benoit.detimmerman@socotec.com		✓		
SIRON Anne	Conseil Régional des Hauts de France (Fonds FEDER) 03.22.97.27.97 - Anne.SIRON@hautsdefrance.fr		✓		
MARTINET Fabrice	Agence de l'Eau Seine-Normandie 03.44.30.41.38- martinet.fabrice@aesn.fr		✓		
HERBERT Thomas	Exploitant concerné par des aménagements 06.74.58.68.28 – thomas_herbert@orange.fr			✓	
HERBERT Pascal	Exploitant concerné par des aménagements 06.08.03.49.62 – pascal.herbert2@wanadoo.fr	✓			✓
CAMUS Xavier	Exploitant concerné par des aménagements 06.73.30.29.27 – xavier.camus02@orange.fr				✓
JAUQUET Philippe	Exploitant concerné par des aménagements 03.23.98.03.61				✓
BRAIDY Hervé	Exploitant concerné par des aménagements 06.32.38.83.11 – braidy.herve@wanadoo.fr				✓
BAURIN Francis	Exploitant concerné par des aménagements 06.82.32.01.36				
BRAIDY Marc	Exploitant concerné par des aménagements 06.07.39.13.02 – marc.braidy@laposte.net				✓
DUPONT Alain	Exploitant concerné par des aménagements 06.44.14.49.75				
LINDEKENS Jean-Luc	Exploitant concerné par des aménagements 03.23.98.46.73				✓
STEVENOT Bertrand	Exploitant – 06.86.22.56.21				
DERUELLE Philippe	Exploitant				
BAUDRY Médéric	CGCR 06.30.52.73.48 - mederic.baudry@orange.fr	✓			✓
POTEAU Jean-François	POTEAU Espaces Verts 03.23.58.47.36 – contact@poteau-espacesverts.fr			✓	✓
CHOULETTE Jérémie	POTEAU Espaces Verts 07.84.24.95.92 – direction@poteau-espacesverts.fr			✓	✓
BAUDRIER Mathilde	USAGMA – Assistant à maîtrise d'ouvrage	✓			✓
DANEL Guillaume	ECAA – Maître d'œuvre	✓			✓

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



- **PRESENTATION DES ENTREPRISES:**

LOT N°1 :

CGCR - M. BAUDRY : 06.30.52.73.48
mederic.baudry@orange.fr

LOT N°2 :

POTEAU Espaces Verts - M. CHOULETTE : 07.84.24.95.92
direction@poteau-espacesverts.fr

- **ADMINISTRATIF:**

Lot 1 :

Notification du marché le 28/07/2017

Ordre de service n°1 de démarrage de la période de préparation à émettre – fait le 28/09

Ordre de service n°2 de démarrage des travaux au 23/10 – fait le 16/10/2017

Lot 2 :

Notification du marché le 28/07/2017

Ordre de service n°1 de démarrage de la période de préparation à émettre – fait le 28/09

Ordre de service n°2 de démarrage des travaux au 25/10 – fait le 18/10/2017.

Planning général :

Démarrage travaux du lot 1 : 23 octobre – option gabion en août 2018

Démarrage des plantations lot 2 : 24 octobre

Travaux actuellement en arrêt pour intempérie pour le lot 1 et 2.

Documents à remettre par les entreprises des lots 1 et 2 :

- **Planning Lot 1 avec l'ensemble des travaux sur les fossés**

Documents à transmettre aux entreprises :

- Modèle de panneau de chantier à mettre en place avant les travaux (AMO>CGCR) – **Fait et transmis, en attente de la pose.**

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



- **TRAVAUX:**

- **Organisation des travaux :**

- Base vie installée sur la commune de Landouzy la cour,
- PPSPS à transmettre au coordinateur SPS,
- Stockage de matériaux : l'entreprise CGCR réalisera ses apports en matériaux depuis le dépôt de la société à Buire,
- Réalisation des ouvrages en gabion : fabrication sur le site, pas de recours à la préfabrication
- Abattage d'arbres pour réalisation des accès aux ravines où sont situés les gabions, marquage sur site et selon avis des propriétaires.

- **POINTS TECHNIQUES VUS EN REUNION : LOT 1**

- **Travaux en arrêt pour cause d'intempérie.**

Une visite du site comprenant les ouvrages gabions n° 1017 et 1018 a été réalisé ce jour pour voir leurs états suites aux dernières importantes précipitations.

On peut remarquer que les ouvrages ont parfaitement assumé leur rôle et qu'une sédimentation importante s'est réalisé en amont de chaque ouvrage. Les canalisations de débit de fuites ont fonctionné malgré un colmatage par de nombreux matériaux (branches, feuilles, plastiques...).

Ouvrage 1017
Vue générale



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Etendue de la retenue amont



Canalisation de fuite comatée



Ouvrage 1018

Aval



Amont



Vue de la rétention amont



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Rappel des points techniques antérieurs

- **Ouvrages gabions n° 212 :**
Après visite du site, il apparaît que le terrain devant accueillir les gabions à fait l’objet depuis le conventionnement de l’ouvrage en 2015 de remblais rendant impossible la réalisation des ouvrages.
Une implantation est possible en aval à cheval sur les parcelles de M. JAUQUET et M. DERUELLE qui tamponnerait uniquement les eaux des deux sources présentes au Gravier Chardon.
M. DERUELLE s’oppose à cette réalisation sur son terrain puisqu’il ne veut pas qu’on endommage les sources qui permettent actuellement à ses vaches de s’abreuver et il affirme également que ce fossé ne fait pas l’objet de ruissellements importants.
- En effet, nous avons remarqué lors de cette visite que suite aux remblais de la zone, un écoulement d’eau plus localisé arrive en amont de cette zone, emprunte le chemin communal et crée sur celui-ci une forte érosion.



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



- **Ouvrages gabions n° 209 et 210 :**

Après visite du site, il apparaît que le terrain devant accueillir les gabions a fait l'objet de remblais divers imposant une modification de l'implantation des gabions vers l'aval de la ravine.

Vue sur l'encombrement de la ravine – Implantation du gabion 209 avant l'arbre



Vue de l'implantation en aval de la ravine du gabion 210 au droit des 2 arbres centraux




Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



• **POINTS TECHNIQUES VUS EN REUNION : LOT 2**

- **Plantations terminées sur les haies 1023, 116, 1024, 113 et n°6**

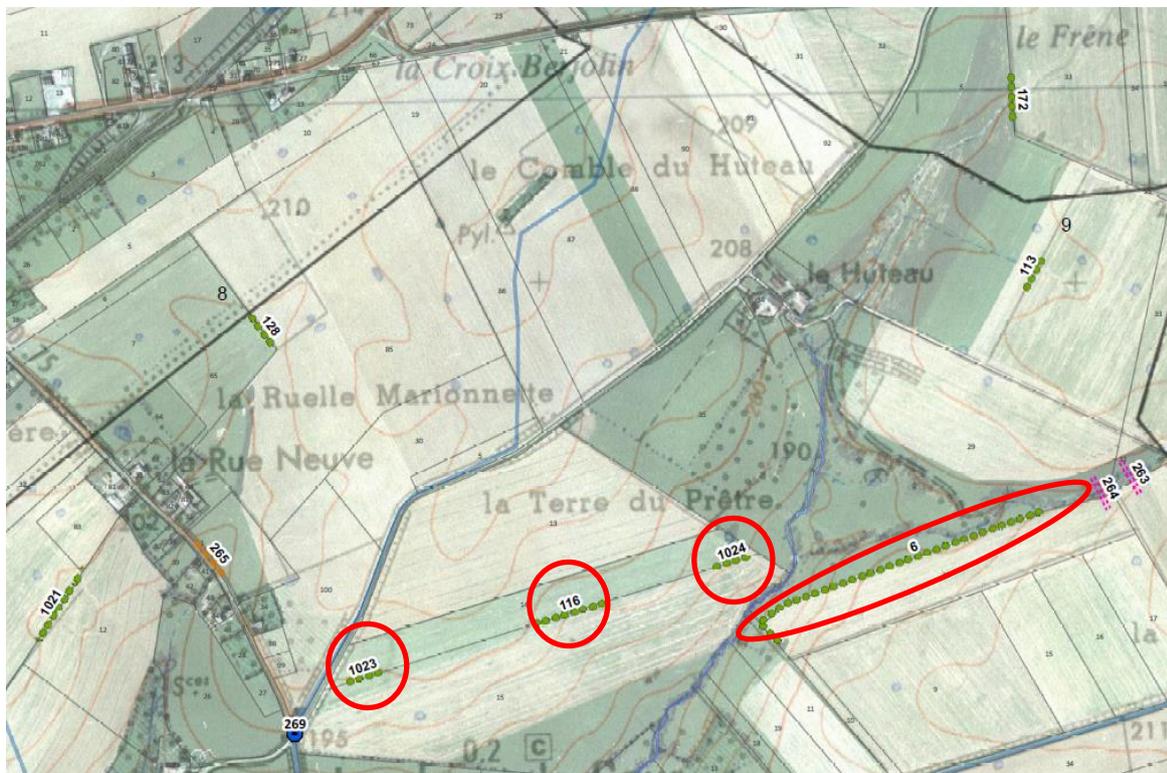

- **Travaux en cours sur les haies 1006, 1007, 1008 et 172**

Reste 1 rang à planter sur la 1007 et l'ensemble sur le 1006 puis à mettre les paillages + anti rongeur sur 1008.



Haie 1006



Haie 1007

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.





Reste 40 plants à planter sur la 172 au droit de l'écoulement d'eau actuellement en cours.

RAPPELS :

- Sont plantées à ce jour, les haies : 1021, 146, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 1002, 1005, 1009 et 1046, 1023, 116, 1024, 6 et 1008 soit un linéaire de 1 450 m.
- En cours de plantation : 1006 et 1007
- Allongement de la haie 161 de 20 ml suivant constat fait sur site ce jour (voir photographies ci-après)

Il est nécessaire de réaliser le paillage à l'avancement des plantations afin de libérer les terres pour les labours par les exploitants.

A faire pour le Lot 2 :

- **Plantations à venir sur les haies 128 et 180**
- Piquetage à prévoir des deux dernières haies 1037 et 1054
- Reprise à prévoir des milieux de haies arrachées ou couchées
- **Un plant a disparu dans la 1007, reste les accroches anti-rangeur....**



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Vues des dégâts suite aux intempéries des mois de décembre 2017 et janvier 2018

Ravinement au droit de la haie 161 – Allongement prévu sur 20 m.



Vue sur les dégâts des haies 166 et 146 – redressement/repiquage des plants



Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Tableau récapitulatif de l'avancée du piquetage et des plantations des haies

Avancée haies							Exploitants
Numéro identifiant ouvrage	Type	Dimensions conventionnées	Dimensions piquetées	Parcelle concernée	Piquetage réalisé	Plantation réalisée	
6	Haie	100	149	ZC 0030	X	X	Marc Braidy
113	Haie	74	50	ZC 0028	X	X	Hervé Braidy
116	Haie	273	286	ZB 0015	X	X	Alain Dupont
172	Haie	50	26	ZA 0005	X	X (sauf milieu)	Jean-Luc Lindekens
1023	Haie	124	128	ZB 0015	X	X	Thomas Herbert
1024	Haie	80	80	ZB 0014	X	X	Pascal Herbert
128	Haie	15	30	ZB 107	X		Xavier Camus
				ZB 0065			
1021	Haie	162	125	ZA 0012	X	X	Philippe Jauquet
				ZA 0084			
180	Haie	100	100	ZH 013	X		Francis Baurin
				ZH 0006			
1037	Haie	110		ZI 0043			Terminée = Plantation + paillage réalisés
1054	Haie	98		ZH 0009			
146	Haie spéciale pâture	15	10	ZI 0006	X	X	
				ZI 0005			
160	Haie	50	40	ZI 0005	X	X	
161	Haie	40	36	ZI 0025	X	X	
163	Haie	40	40	ZI 0004	X	X	
165	Haie	47	65	ZI 0001	X	X	
166	Haie	55	55	ZI 0003	X	X	
167	Haie	57	47	ZI 0081	X	X	
1002	Haie	95	95	ZI 0028	X	X	
1005	Haie	130	130	ZI 0003	X	X	
1006	Haie	60	93	ZI 0001	X		
1007	Haie	140	140	ZI 0025	X	X (1 rang)	
1008	Haie	90	105	RD 1850	X	X	
1009	Haie	20	9	ZI 0001	X	X	
1046	Haie	53	50	ZI 0003	X	X	

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Prochaine réunion :**Le mercredi 7 février 2018 à 9h00 en mairie de Landouzy-la-Cour****Objet :****Suivi des travaux du lot 2 à 9h**

Piquetage à prévoir pour les haies 1037 (M. Jauquet)

et 1054 (M. Lindekens) (Lot 2)

Visite aménagements à faire Lot 1 (aménagement 266 avec M. BRAIDY Hervé et profilé 214)

Les travaux de maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin versant du ruisseau de Landouzy sont cofinancés par le FEDER dans le cadre du programme opérationnel FEDER FSE pour la Picardie, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et du Conseil Régional des Hauts de France.



Région
Hauts-de-France

