

Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise

## Programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents

### Travaux du LOT 3

### TRANCHE 2 – Site Pilote

#### Compte-rendu de la réunion de chantier 24 juillet 2018

<b>Lieu :</b>	36 avenue Salvador Allende, 02200 SOISSONS à 14H00
---------------	--

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>Entreprise :</b>
Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	Lot 3 : MASCITTI NINO


<b>Nom, Prénom :</b>	<b>Organisme :</b>	Présent	Absent	Exclusé
GERAULT Nicolas	Président du Syndicat			√
REBEROT Nicolas	1 <sup>er</sup> Vice-président du Syndicat	√		
CHAUVET Eric	2 <sup>ème</sup> Vice-président du Syndicat			√
HUGE Maurice	Président d'honneur du Syndicat			√
MASCITTI Dominique	MASCITTI Nino	√		
HUCHET William	Union des Syndicats	√		
DECHAMPS Anne	Riverain	√		
PROVINI Claude	Riverain			√
	Agence de l'eau Seine-Normandie			√
	Direction Départemental des Territoires de l'Aisne			√
	Fédération de l'Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique			√

- Cette réunion concerne le suivi de chantier du Lot 3 de la tranche 2 – Site Pilote du programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise FORETS ET PAYSAGES – (Siège Social : Ferme de la Tour, 59330 BEAUFORT) pour le lot 1 (entretien du lit et des berges) et MASCITTI NINO (Siège Social :

Rue des Bûcherons, 02600 VILLERS-COTTERETS) pour les lots 2 (mise en défens de la rivière) et 3 (restauration du lit et des berges – restauration de la continuité écologique).

**SITUATION ACTUELLE :**

- Les travaux engagés sont localisés sur la commune de Soissons aux abords de l'avenue Salvador Allende.
- La carte ci-contre précise la localisation des travaux en cours de réalisation.

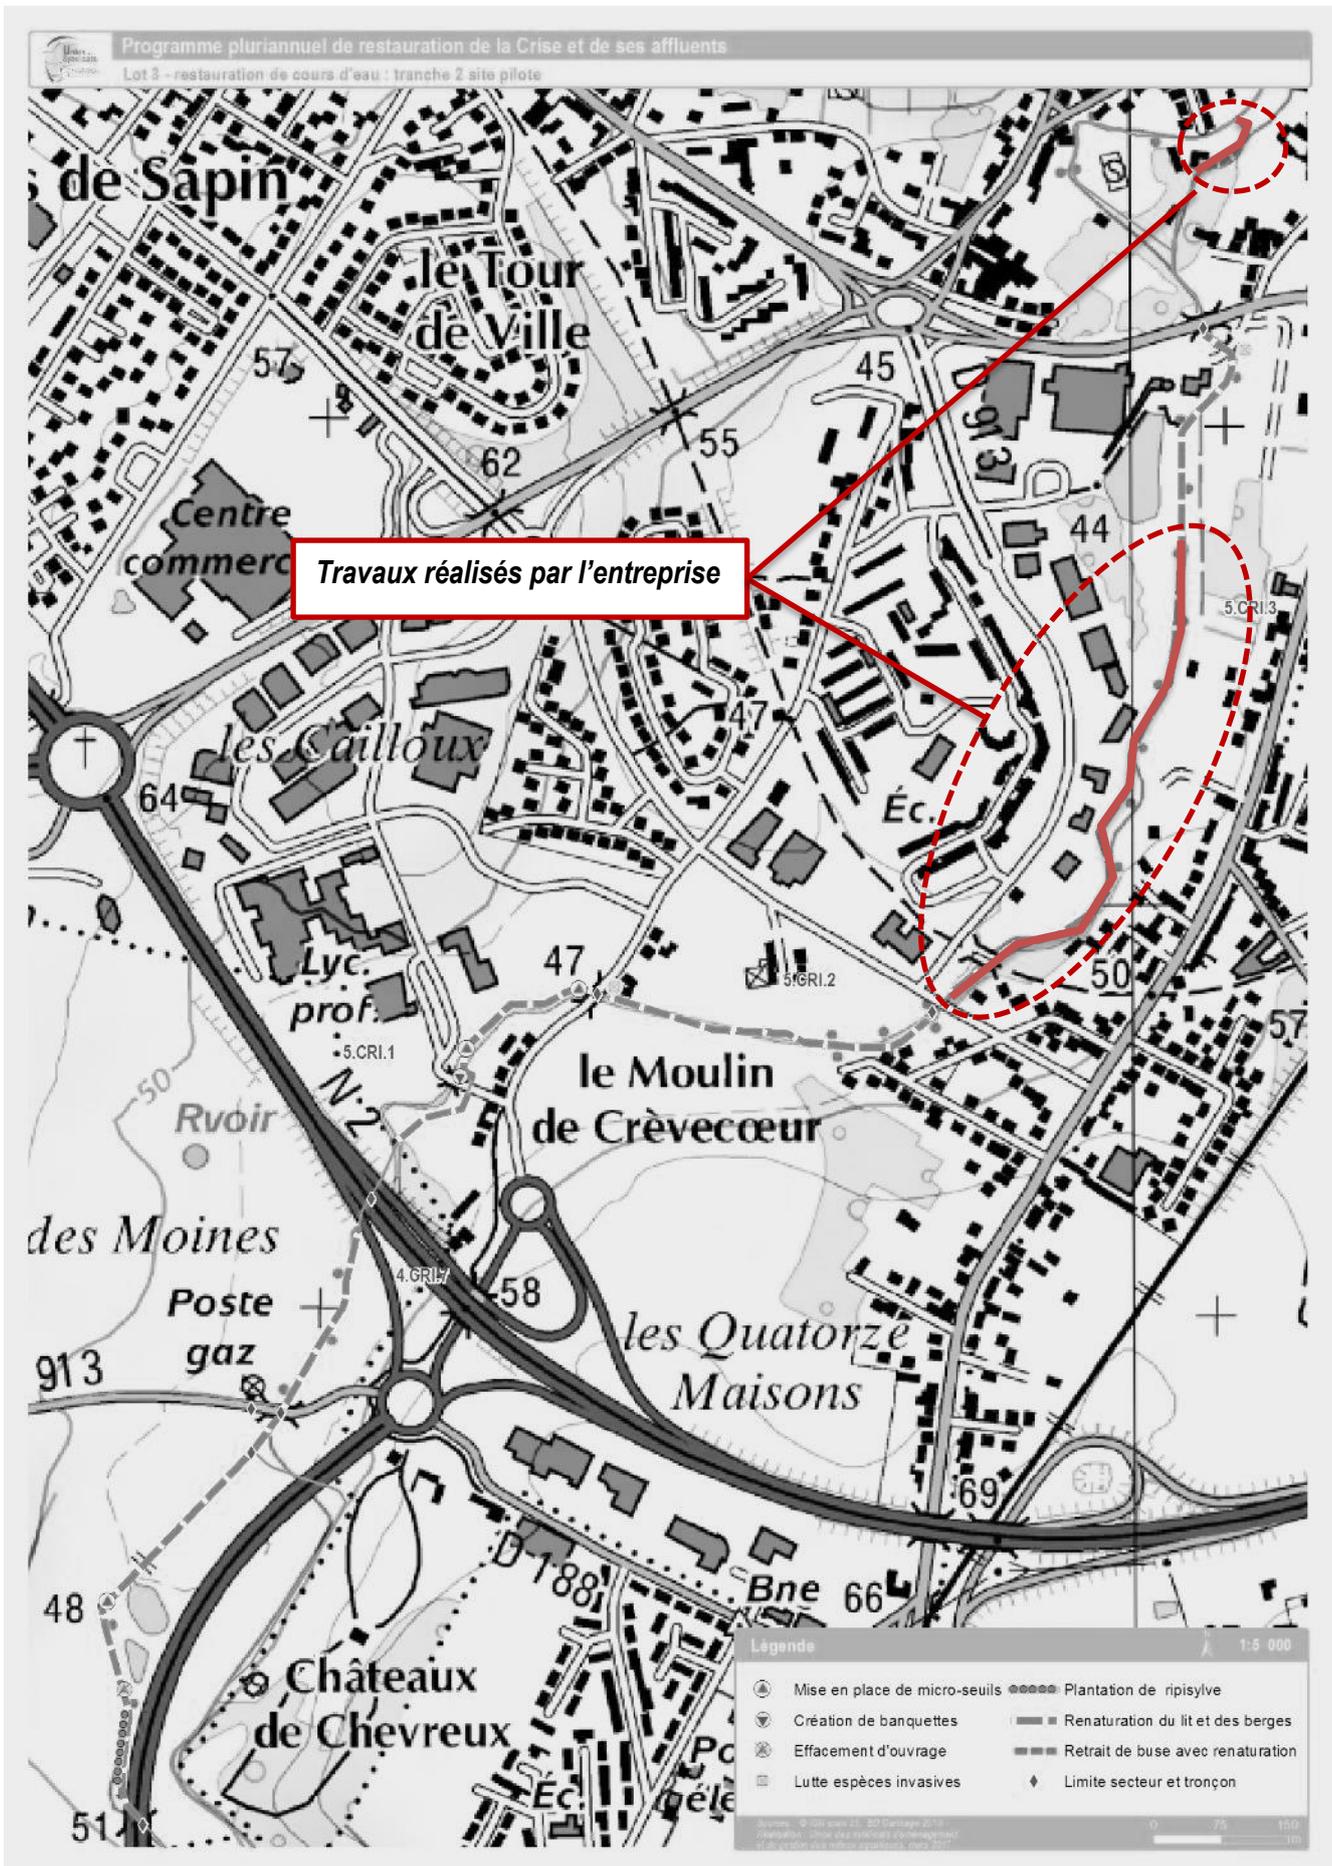

Localisation des travaux réalisés par l'entreprise MASCITTI NINO pour le LOT 3 – Tranche 2 – Site Pilote du PPRE de la Crise

## DETAIL DES TRAVAUX :

### Diversification des écoulements :


Sur le tronçon 5.CRI.3 la Crise présente une surlargeur du lit de la rivière avec un écoulement lentique. L'aménagement d'épis en bois et la création de banquettes d'hélophytes a donc été préconisé sur ce secteur.

Ils sont disposés en quinconce ou en parallèle tout le long du linéaire concerné, soit 685 ml.

- La plantation d'hélophytes sur les banquettes sera réalisée en Septembre après aménagement de l'ensemble du site pilote.
- Un ensemencement a été réalisé sur les banquettes afin d'assurer un bon maintien de celles-ci.



[Tronçon 5.CRI.3 \(Janvier 2018 avant entretien de la ripisylve\)](#)

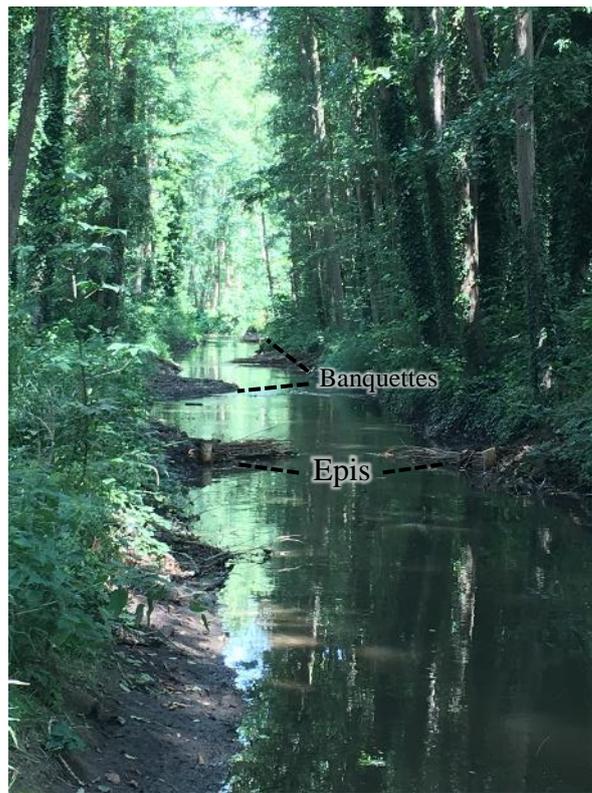

[Tronçon 5.CRI.3 \(Juillet 2018 après création de banquettes d'hélophytes et épis\)](#)

- Sur les zones où le phénomène d'érosion a été jugé significatif, des épis ont été aménagés pour rediriger les écoulements vers le centre du lit de la rivière.



[Tronçon 5.CRI.3 \(Janvier 2018 avant entretien de la ripisylve\)](#)



[Tronçon 5.CRI.3 \(Juillet 2018 après création d'épis sur la rive concave\)](#)

- La Crise au passage de la Fondation Mouvement Villages d'Enfants est busée sur 11 ml. Une remise à ciel ouvert du cours d'eau a pu être réalisée. Le talutage des berges est en cours de réalisation. Pour compléter l'aménagement, une strate arbustive sera mise en place sur le haut de berge ainsi qu'un ensemencement.



[Buse de 11 ml, diamètre 1000 mm avec renforcement béton](#)



[Sondage avant retrait de la buse](#)



[Retrait de la buse](#)



[Talutage des berges en cours de réalisation](#)

## À REALISER :

- Pour la suite du chantier l'entreprise MASCITTI NINO réalisera :
  - L'aménagement des banquettes sur la partie aval du tronçon 5.CRI.3

Les aménagements réalisés vous seront présentés lors de la prochaine réunion.

## FINANCEMENT

La réalisation de ce programme de travaux est possible grâce au soutien financier de :




## REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien et de restauration de la Crise et de ses affluents, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :
  - M. William HUCHET / Geoffrey PACAUD – Union des syndicats ..... 03.23.20.36.74 – 06.07.71.26.60
  - M. Dominique MASCITTI – Entreprise MASCITTI NINO SA ..... 06.12.43.28.43

## LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

- La prochaine réunion de chantier se déroulera **le lundi 30 juillet 2018 à 14h00, 5 Boulevard du Tour de Ville, 02200 SOISSONS.**

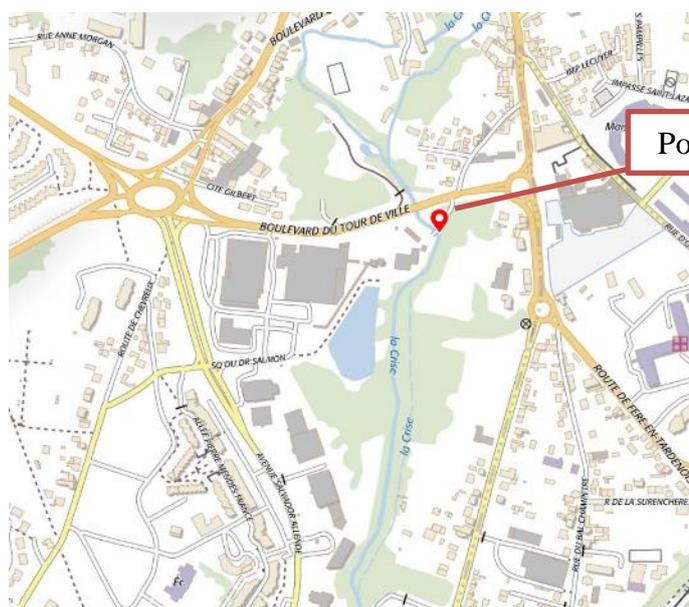

Le service technique,
