

Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise

Programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents

Travaux du LOT 3

TRANCHE 2 – Site Pilote

Compte-rendu de la réunion de chantier 30 juillet 2018

Lieu :	5 boulevard du Tour de Ville, 02200 SOISSONS à 14H00
---------------	--

Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :
Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	Lot 3 : MASCITTI NINO


Nom, Prénom :	Organisme :	Présent	Absent	Exclusé
GERAULT Nicolas	Président du Syndicat			✓
REBEROT Nicolas	1 ^{er} Vice-président du Syndicat	✓		
CHAUVET Eric	2 ^{ème} Vice-président du Syndicat			✓
HUGE Maurice	Président d'honneur du Syndicat			✓
MARQUES Maxime	MASCITTI Nino	✓		
HUCHET William	Union des Syndicats	✓		
DECHAMPS Anne	Riverain	✓		
PENART Marie Cecile	Riverain	✓		
PROVINI Claude	Riverain	✓		
GUERIN Marc	Délégué du Syndicat	✓		
BERSON Pascal	Délégué du Syndicat	✓		
LIEFOOGHE Alain	Communauté d'Agglomération du Soissonnais	✓		
QUEVAL Marie-Hélène	Communauté d'Agglomération du Soissonnais	✓		
	Agence de l'eau Seine-Normandie			✓

	Direction Départemental des Territoires de l'Aisne			√
	Fédération de l'Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique			√

- Cette réunion concerne le suivi de chantier du Lot 3 de la tranche 2 – Site Pilote du programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise FORETS ET PAYSAGES – (Siège Social : Ferme de la Tour, 59330 BEAUFORT) pour le lot 1 (entretien du lit et des berges) et MASCITTI NINO (Siège Social : Rue des Bûcherons, 02600 VILLERS-COTTERETS) pour les lots 2 (mise en défens de la rivière) et 3 (restauration du lit et des berges – restauration de la continuité écologique).

SITUATION ACTUELLE :

- Les travaux engagés sont localisés sur la commune de Soissons aux abords de l'avenue Salvador Allende.
- La carte ci-contre précise la localisation des travaux réalisés.

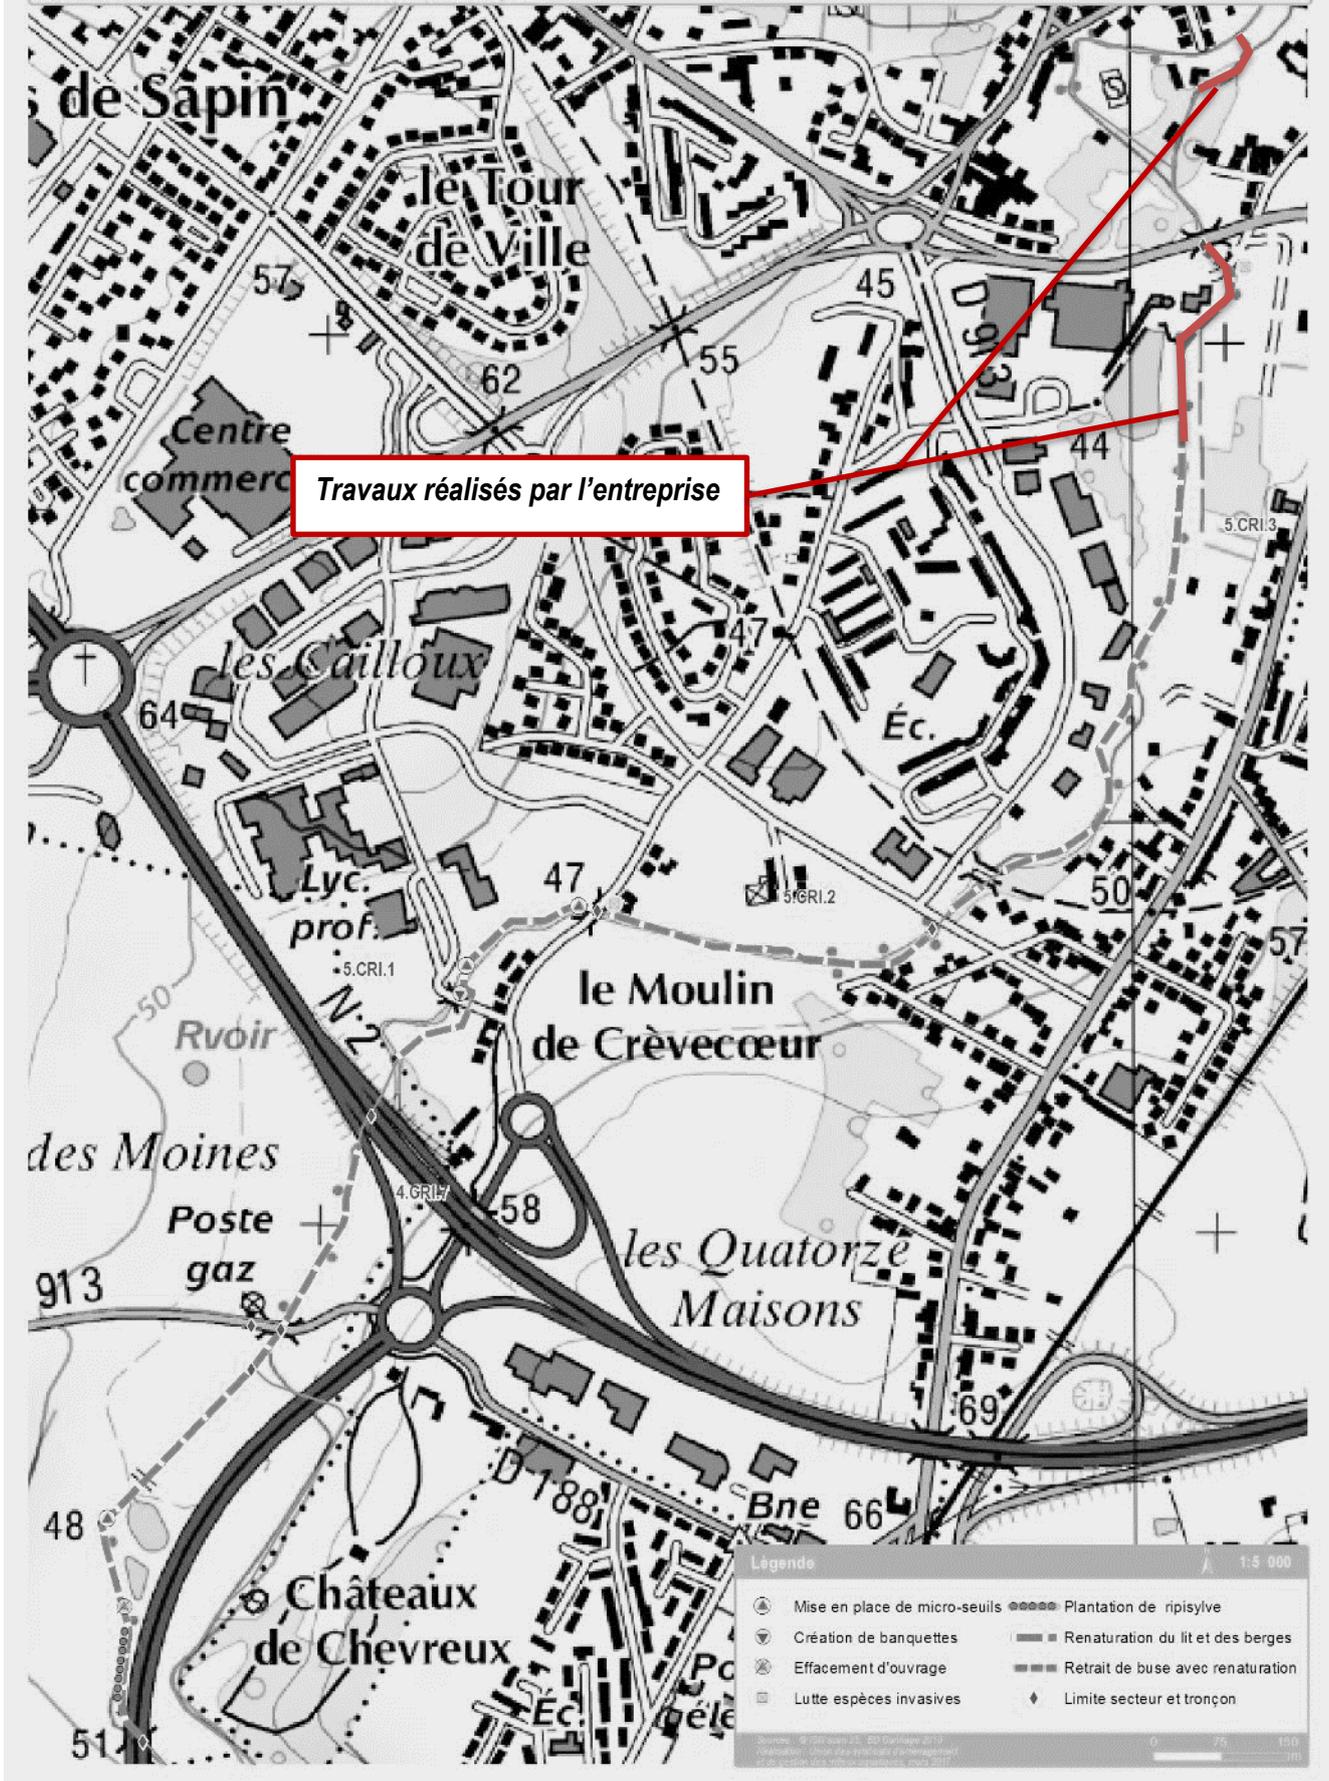

Localisation des travaux réalisés par l'entreprise MASCITTI NINO pour le LOT 3 – Tranche 2 – Site Pilote du PPRE de la Crise

DETAIL DES TRAVAUX :

Diversification des écoulements :

Sur le tronçon 5.CRI.3 la Crise présente une surlargeur du lit de la rivière avec un écoulement lentique. L'aménagement d'épis en bois et la création de banquettes d'hélophytes a donc été préconisé sur ce secteur.

Ils sont disposés en quinconce ou en parallèle tout le long du linéaire concerné, soit 290 ml.

- Un ensemencement a été réalisé sur les banquettes afin d'assurer un bon maintien de celles-ci.



Tronçon 5.CRI.3 (Juillet 2018 avant travaux de restauration)



Tronçon 5.CRI.3 (Juillet 2018 après création de banquettes d'hélophytes)

- Sur la fin du tronçon 5.CRI.3 des banquettes d'hélophytes ont été réalisées de manière alterne. Certaines banquettes préexistantes ont été reprises.
- Après travaux le cours d'eau retrouve un aspect sinueux et une diversité des faciès d'écoulements se met progressivement en place.



[Tronçon 5.CRI.3 \(retrait de la buse de 11 ml, diamètre 1000 mm\)](#)



[Tronçon 5.CRI.3 \(talutage des berges en pente douce\)](#)

- Le talutage des berges en pente douce après retrait de la buse sur la Crise au passage de la Fondation Mouvement Villages d'Enfants a été réalisé. Pour compléter l'aménagement, une strate arbustive sera mise en place sur le haut de berge au cours du mois d'Octobre si besoin.

REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Lors des différentes réunions de chantier, il a été constaté sur le tronçon 5.CRI.3 plusieurs rejets d'eaux usées. Des doutes ont été formulées sur la qualité physico-chimique de ces eaux. M. LIEFOOGHE du service assainissement de la Communauté d'Agglomération du Soissonnais conscient de ce problème a précisé qu'un diagnostic du réseau sur le secteur est en cours de réalisation. Cette première phase permettra d'identifier l'origine du problème.

A REALISER

- L'ensemble des aménagements du Site Pilote ont été réalisés. La plantation des hélophytes sur les banquettes sera effectuée au cours du mois de Septembre.

FINANCEMENT

La réalisation de ce programme de travaux est possible grâce au soutien financier de :



REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien et de restauration de la Crise et de ses affluents, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :
 - M. William HUCHET / Geoffrey PACAUD – Union des syndicats 03.23.20.36.74 – 06.07.71.26.60
 - M. Dominique MASCITTI – Entreprise MASCITTI NINO SA 06.12.43.28.43

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

- La prochaine réunion vous sera communiquée ultérieurement.

Le service technique,

