

Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise

## Programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents

### Travaux du LOT 3

### TRANCHE 2

#### Compte-rendu de la réunion de chantier 19 juin 2018

<b>Lieu :</b>	Place de la Mairie, 02200 Chacrise à 09H30
---------------	--

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>Entreprise :</b>
Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	Lot 3 : MASCITTI NINO


<b>Nom, Prénom :</b>	<b>Organisme :</b>	Présent	Absent	Exclusé
GERAULT Nicolas	Président du Syndicat			√
REBEROT Nicolas	1 <sup>er</sup> Vice-président du Syndicat			√
CHAUVET Eric	2 <sup>ème</sup> Vice-président du Syndicat	√		
HUGE Maurice	Président d'honneur du Syndicat	√		
BARBIER Mickael	Mascitti Nino	√		
HUCHET William	Union des Syndicats	√		
DE REKENEIRE	Délégué du Syndicat	√		
PROVINI Claude	Riverain	√		
	Agence de l'eau Seine-Normandie			√
	Direction Départemental des Territoires de l'Aisne			√
	Fédération de l'Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique			√

- Cette réunion concerne le suivi de chantier du Lot 3 de la tranche 2 du programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise FORETS ET PAYSAGES – (Siège Social : Ferme de la Tour, 59330 BEAUFORT) pour le lot 1 (entretien du lit et des berges) et MASCITTI NINO (Siège Social : Rue des Bûcherons, 02600 VILLERS-COTTERETS) pour les lots 2 (mise en défens de la rivière) et 3 (restauration du lit et des berges – restauration de la continuité écologique).

## SITUATION ACTUELLE :

- Les travaux engagés sont localisés entre les communes de Chacrise et Septmonts correspondant à la Tranche 2 du P.P.R.E de la Crise.

La carte ci-dessous présente la localisation des aménagements réalisés depuis le début des travaux.

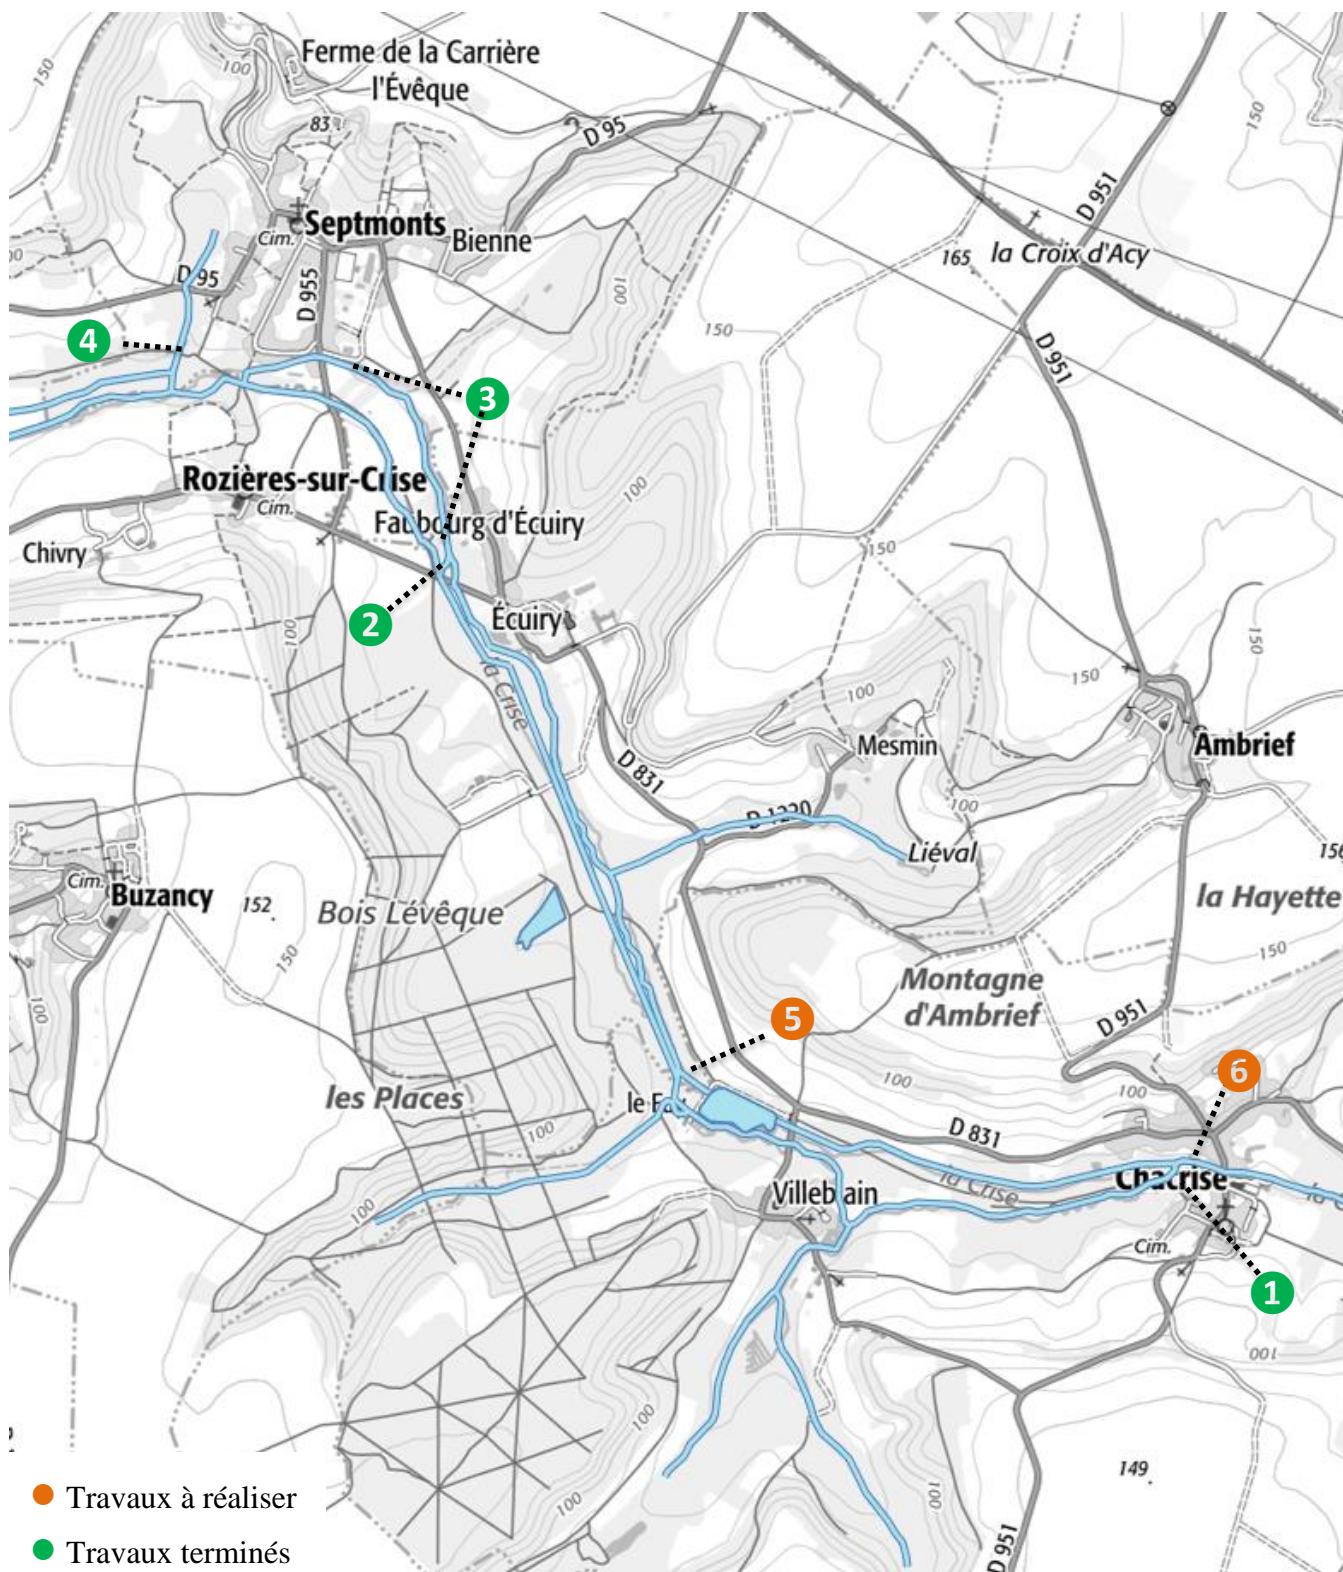

[Localisation des travaux réalisés par l'entreprise MASCITTI NINO pour le LOT 3 – Tranche 2 du PPRE de la Crise](#)



## Travaux sur le bras de la Fausse Crise 1

- **Commune** : Chacrise
- **Cours d'eau** : la Crise
- **Travaux réalisés** : Suppression d'un obstacle à l'écoulement ; réalisation de 2 micro-seuil et banquettes sous ouvrage



[Obstacle à l'écoulement sur la Fausse Crise, avant travaux](#)



[Suppression de l'obstacle et mise en place d'un micro-seuil](#)



[Création de banquettes sous le pont de l'ancienne voie ferrée](#)



[Mise en place d'un micro-seuil en aval du pont](#)

### DETAIL DES TRAVAUX :

La réalisation d'un micro-seuil sur le bras de la Fausse Crise permet de maintenir un débit constant sur ce bras tout en permettant la remontée du poisson.

Le micro-seuil en aval du pont permet de réduire la chute d'eau du radier du pont afin d'assurer la continuité écologique.

Des banquettes en pierre ont été aménagées sous le pont pour garantir une continuité amont-aval le long de la Crise pour la faune terrestre et semi-aquatique.



## Travaux sur la Crise, chemin de la rivière (Faubourg d'Ecuiry) ②

- **Commune** : Rozières-sur-Crise
- **Cours d'eau** : la Crise
- **Travaux réalisés** : Mise en place d'un micro-seuil



[Radier du pont de l'ancienne voie ferrée](#)



[Mise en place d'un micro-seuil en aval du pont](#)

### DETAIL DES TRAVAUX :

Le micro-seuil en aval du pont permet de réduire la chute d'eau du radier du pont (30 cm) afin de le rendre franchissable pendant la majeure partie de l'année.

## Travaux sur les foyers de Renouée du Japon (Faubourg d'Ecuiry et Septmonts) ③

- **Commune** : Septmonts
- **Cours d'eau** : la Crise
- **Travaux réalisés** : fauche de la Renouée du Japon



[Fauche de la Renouée du Japon](#)

## DETAIL DES TRAVAUX :

Lors de la mise en place du programme de travaux sur la Crise, la surface des foyers de Renouée du Japon estimée était de 70 m<sup>2</sup> sur la commune de Septmonts. Actuellement la surface de l'ensemble des foyers de Renouée du Japon est supérieure à 500 m<sup>2</sup>.

L'entreprise a pu intervenir sur 2 foyers de Renouée du Japon jugés prioritaires. Le protocole mis en place consiste à :

- Faucher les parties aériennes de la Renouée
- Brûler les résidus de coupe
- Planter une strate arbustive dense (5 plants/m<sup>2</sup>) pour apporter de la concurrence

Actuellement 340 m<sup>2</sup> de Renouée ont été traités. Des discussions sont en cours avec le Syndicat de l'Aisne Navigable concernant l'intervention sur les autres foyers de Renouées du Japon.

La commune de Septmonts réalise une gestion de la Renouée du Japon par une fauche régulière au cours de l'année par la technique du débroussaillage. La coupe régulière permet d'épuiser les rhizomes de la plante. Cependant l'utilisation d'une débroussailleuse augmente les risques de dissémination avec la projection des résidus de coupe.

### Travaux sur le renforcement d'une berge (rue de Noyant à Septmonts) ④

- **Commune** : Septmonts
- **Cours d'eau** : affluent de la Crise
- **Travaux réalisés** : Tressage



[Berge hétéroclite avant travaux](#)



[Réalisation d'un tressage et talutage de la berge](#)

## DETAIL DES TRAVAUX :

Sur un des affluents de la Crise (tronçon 3.CRI.4) au niveau de la rue de Noyant, l'entreprise FORETS ET PAYSAGES avait évacué des protections de berge (tôles + gravats) sur la propriété de M. BLONDELLE.

Par la suite, l'entreprise MASCITTI NINO a réalisé un tressage (technique de génie végétal) et un talutage avec ensemencement pour renforcer le pied de berge de la propriété de M. BLONDELLE.



## À REALISER :


- Pour la suite du chantier l'entreprise MASCITTI Nino réalisera les aménagements sur le Site Pilote au niveau des communes de Vauxbuin et Soissons.
- En parallèle du site pilote, l'aménagement des épis prévu en aval du moulin Le Fay (cf. carte 5) ainsi que la suppression du Sumac de Virginie (cf. carte 6) seront effectués. Ces travaux vous seront présentés lors de la prochaine réunion de chantier.

## REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien et de restauration de la Crise et de ses affluents, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :
  - M. William HUCHET / Geoffrey PACAUD – Union des syndicats ..... 03.23.20.36.74 – 06.07.71.26.60
  - M. Dominique MASCITTI – Entreprise MASCITTI NINO SA ..... 06.12.43.28.43

## LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

- La prochaine réunion de chantier se déroulera **le mardi 3 juillet 2018 à 9h30, rue Alain Langlet, 02200 VAUXBUIN** et concerne les travaux sur le Site Pilote.

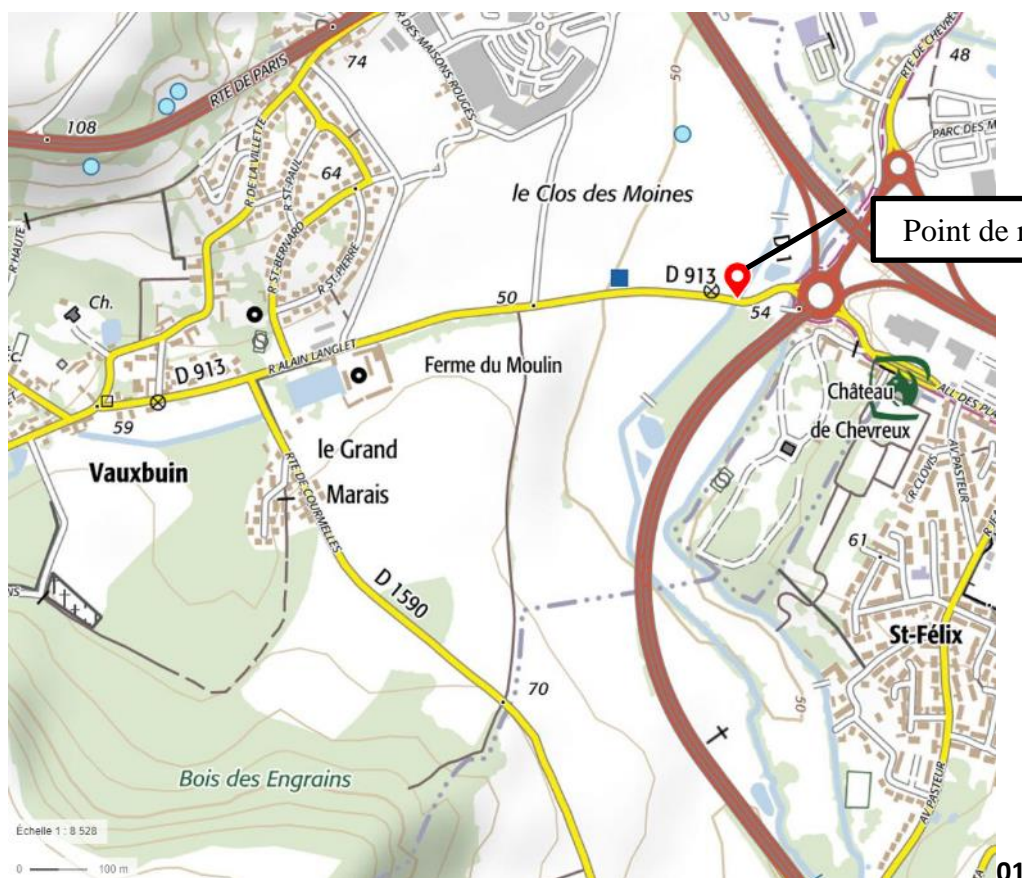

Le service technique,
