

Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise
Effacement du seuil de Cœuvres-et-Valsery

Ru de Retz

Continuité écologique

**Compte-rendu de la réunion de chantier
24 juillet 2018**

Lieu :	Rue de l'Abbaye, 02600 Cœuvres-et-Valsery à 9H30
---------------	--

Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :
Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	MASCITTI NINO

Nom, Prénom :	Organisme :	Présent	Absent	Excusé
GERAULT Nicolas	Président du Syndicat			✓
REBEROT Nicolas	1 ^{er} Vice-président du Syndicat			✓
CHAUVET Eric	2 ^{ème} Vice-président du Syndicat			✓
HUGE Maurice	Président d'honneur du Syndicat			✓
MASCITTI Dominique	MASCITTI Nino	✓		
HUCHET William	Union des syndicats	✓		
DUGUET Bernard	Riverain	✓		
DUGUET Philippe	Riverain	✓		
LEFEVRE Philippe	Propriétaire du seuil			✓
MOIRE Pascal	Agence Française pour la Biodiversité			✓
	Agence de l'eau Seine-Normandie			✓
	Direction Départemental des Territoires de l'Aisne			✓
	Fédération de l'Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique			✓

Cette réunion concerne la réunion de chantier des travaux pour l'effacement du seuil de Cœuvres-et-Valsery, ROE 39406. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise MASCITTI NINO (Siège Social : Rue des Bûcherons, 02600 VILLERS-COTTERETS).

DETAIL DES TRAVAUX :

- *Secteur amont de l'ouvrage :*

Un apport de matériaux graveleux a été réalisé dans l'objectif de recréer un lit naturel sur l'ensemble du linéaire travaillé. La granulométrie mise en place est la suivante :

- Cailloux non gélifs calibre 70/150 mm (1^{ère} couche) : permet de stabiliser l'assise du lit de la rivière
- Cailloux non gélifs calibre 20/40 mm (2^{ème} couche) : permet une meilleure cohésion des blocs



Ru de Retz avant travaux de curage



Ru de Retz après curage et recharge granulométrique (1^{ère} couche)

- *Préparation pour le fossé d'alimentation de l'étang*

L'entreprise MASCITTI NINO a réalisé un entretien des abords de l'étang. Une hauteur de vase supérieure à 1 m est constaté sur la partie amont de l'étang. Pour permettre un bon calage de la futur prise d'eau et assurer une pente suffisante, un curage de la partie amont de l'étang est nécessaire.



Travaux de curage à réaliser (1m de vase a extraire)



Etang avant travaux




Etang après les travaux d'entretien de la ripisylve

REMARQUES :

- Depuis plusieurs semaines le niveau d'eau du ru de Retz a fortement diminué. Ce constat s'explique par la rupture d'une berge en amont du secteur travaillé. Le ru de Retz a donc modifié naturellement son tracé pour rejoindre un affluent du ru de Retz.
- Avec l'accord du propriétaire de la parcelle, un retalutage de la berge sera réalisé afin de rétablir l'ancien cours des eaux conformément à l'article L.215-4 du Code de l'environnement. Le

rétablissement du débit du ru de Retz est primordial pour garantir le bon calage des aménagements.

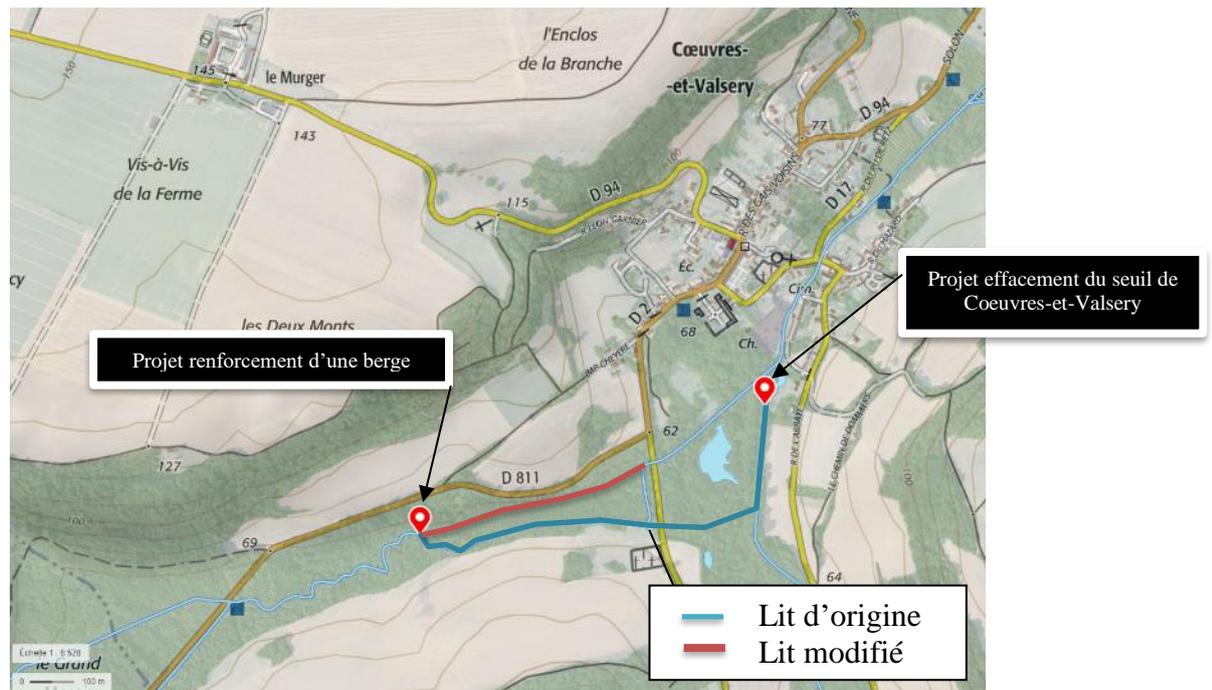

Localisation du lit modifié naturellement

SUITE DES TRAVAUX :

Pour la suite du chantier, en accord avec le maître d'œuvre, l'entreprise MASCITTI NINO réalisera en priorité les travaux sur le lit de la rivière à savoir :

- Un apport de matériaux graveleux (2^{ème} couche) pour assurer une meilleure cohésion des blocs.
- La mise en place des banquettes d'hélophytes avec géotextile sur l'ensemble du linéaire

FINANCEMENT

La réalisation de ce programme de travaux est possible grâce au soutien financier de :




REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'effacement du seuil de Cœuvres-et-Valsery, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :
 - M. William HUCHET / Geoffrey PACAUD – Union des syndicats 03.23.20.36.74 – 06.07.71.26.60
 - M. Dominique MASCITTI – Entreprise MASCITTI NINO SA 06.12.43.28.43

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

- La prochaine réunion de chantier se déroulera **le mardi 31 juillet 2018 à 09h30, rue de l'Abbaye 02600 Cœuvres-et-Valsery.**

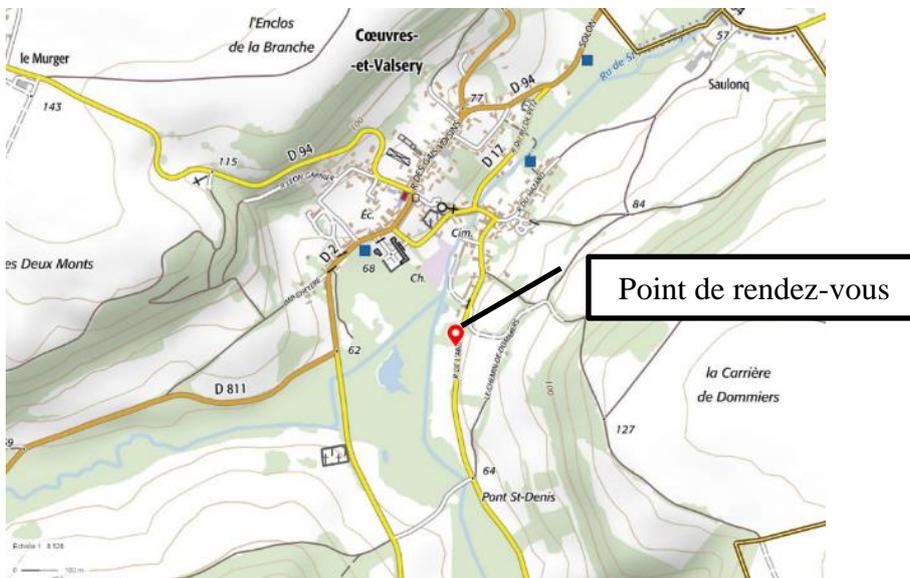

Le service technique,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.
