

Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable

## Programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents

### Travaux du LOT 1

### TRANCHE 3

#### Compte-rendu de la réunion de chantier 21 mars 2019

<b>Lieu :</b>	19 rue de la Vallée, 02200 Villemontoire
---------------	--

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>Entreprise :</b>
Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	Lot 1 : FORETS ET PAYSAGES

<b>Nom, Prénom :</b>	<b>Organisme :</b>	<b>Présent</b>	<b>Absent</b>	<b>Excusé</b>
GERAULT Nicolas	Président du syndicat			✓
CHAUVET Eric	2 <sup>ème</sup> Vice-Président du Syndicat			✓
LANSOY Daniel	Délégué de Villemontoire	✓		
LAURENT Sebastien	FORETS ET PAYSAGES	✓		
HUCHET William	Union des syndicats	✓		
BONNEMENT Edouard	Riverain du Visigneux	✓		
PROVINI CLAUDE	Riverain de la Crise	✓		
	Agence de l'eau Seine-Normandie			✓
	Direction Départemental des Territoires de l'Aisne			✓
	Fédération de l'Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique			✓
	Agence Française pour la Biodiversité			✓

- Cette réunion concerne le suivi de chantier du LOT 1 de la tranche 3 du programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise FORETS ET PAYSAGES – (Siège Social : Ferme de la Tour, 59330 BEAUFORT) pour le lot 1 (entretien du lit et des berges) et MASCITTI NINO (Siège Social : Rue des Bûcherons, 02600 VILLERS-COTTERETS) pour les lots 2 (mise en défens de la rivière) et 3 (restauration du lit et des berges – restauration de la continuité écologique).

## SITUATION ACTUELLE :

L'entreprise FORETS ET PAYSAGES a terminé l'entretien sur le ru de Buzancy. L'entretien de la végétation rivulaire sur la Tranche 3 est terminé.

### Entretien de la ripisylve sur les tronçons 7.BUZ.1 ; 7.BUZ.2 ; 7.VIL.2 et 7.VIL.3

- **Commune** : Villemontoire
- **Cours d'eau** : le Buzancy
- **Travaux réalisés** : Entretien ripisylve, 4 094 ml réalisés



[Photo avant travaux \(Tronçon 7.BUZ.1\)](#)



[Photo après travaux \(Tronçon 7.BUZ.2\)](#)



[Photo avant travaux \(Tronçon 7.BUZ.2\)](#)



[Photo après travaux \(Tronçon 7.BUZ.2\)](#)



[Photo avant travaux \(Tronçon 7.VIL.2\)](#)



[Photo après travaux \(Tronçon 7.VIL.2\)](#)

### **Observations :**

- L'entreprise FORETS ET PAYSAGES a réalisé 4 094 ml d'entretien depuis la dernière réunion de chantier sur le ru de Buzancy.
- Sur les secteurs définis en « entretien léger et patrimonial », l'entreprise a réalisé une gestion manuelle de la ripisylve. Pour les secteurs définis en « entretien poussé » les interventions ont été effectuées via une pelle mécanique à l'exception du tronçon situé en amont du pont de la D1 sur le ru de Buzancy où l'accès a été jugé complexe par l'entreprise.
- Sur le tronçon 7.VIL.3 au niveau de la pâture de M. MOQUET, 3 frênes atteints par la chalarose ont été abattus. Cet entretien permettra aussi de préparer les futurs aménagements de mise en défens préconisés dans le programme de travaux (Lot 2).
- Conformément à la dernière réunion de chantier, l'entreprise FORETS ET PAYSAGES a retiré sur le ru du Visigneux (Tronçon 8.VIS.2) :
  - 10 peupliers en travers du cours d'eau
  - 1 cépée de frêne en bordure de la route D179 jugée problématique lors de la dernière réunion de chantier.
- L'entretien de la ripisylve a permis de réaliser une sélection végétative des arbres en bordure de cours d'eau. Des trouées de lumière ont été ponctuellement réalisées, sur les zones les plus denses, afin de favoriser le développement des végétaux herbacés et arbustifs.
- Les arbres abattus ont été laissés à disposition des propriétaires des parcelles concernées. Les branches de petits diamètres ont été mises en andain (dégradation naturelle).
- Les embâcles, encombres et déchets ont été retirés du lit afin de restaurer la dynamique d'écoulement.

### **Suivi :**

- Un outil de suivi est mis à la disposition des personnes qui le souhaitent afin de suivre en temps réel l'avancement de l'entreprise.
- Cet outil permet de localiser les tronçons sur une carte dynamique et de suivre l'évolution des travaux.

L'outil est accessible via le lien ci-dessous :

<https://drive.google.com/open?id=1kjVGZnB8nZXSqMRJYBfonVcRSVRYU61a&usp=sharing>

## REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien et de restauration de la Crise et de ses affluents, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :
  - M. William HUCHET / Geoffrey PACAUD – Union des syndicats ..... 03.23.20.36.74 – 06.07.71.26.60
  - M. Sébastien LAURENT – Entreprise FORETS ET PAYSAGES ..... 07.76.01.80.28

## FINANCEMENT


La réalisation de ce programme de travaux est possible grâce au soutien financier de :




## LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

La prochaine réunion de chantier vous sera communiquée prochainement.

Le service technique,



Annexe 1 : Linéaire d'entretien de la végétation réalisé

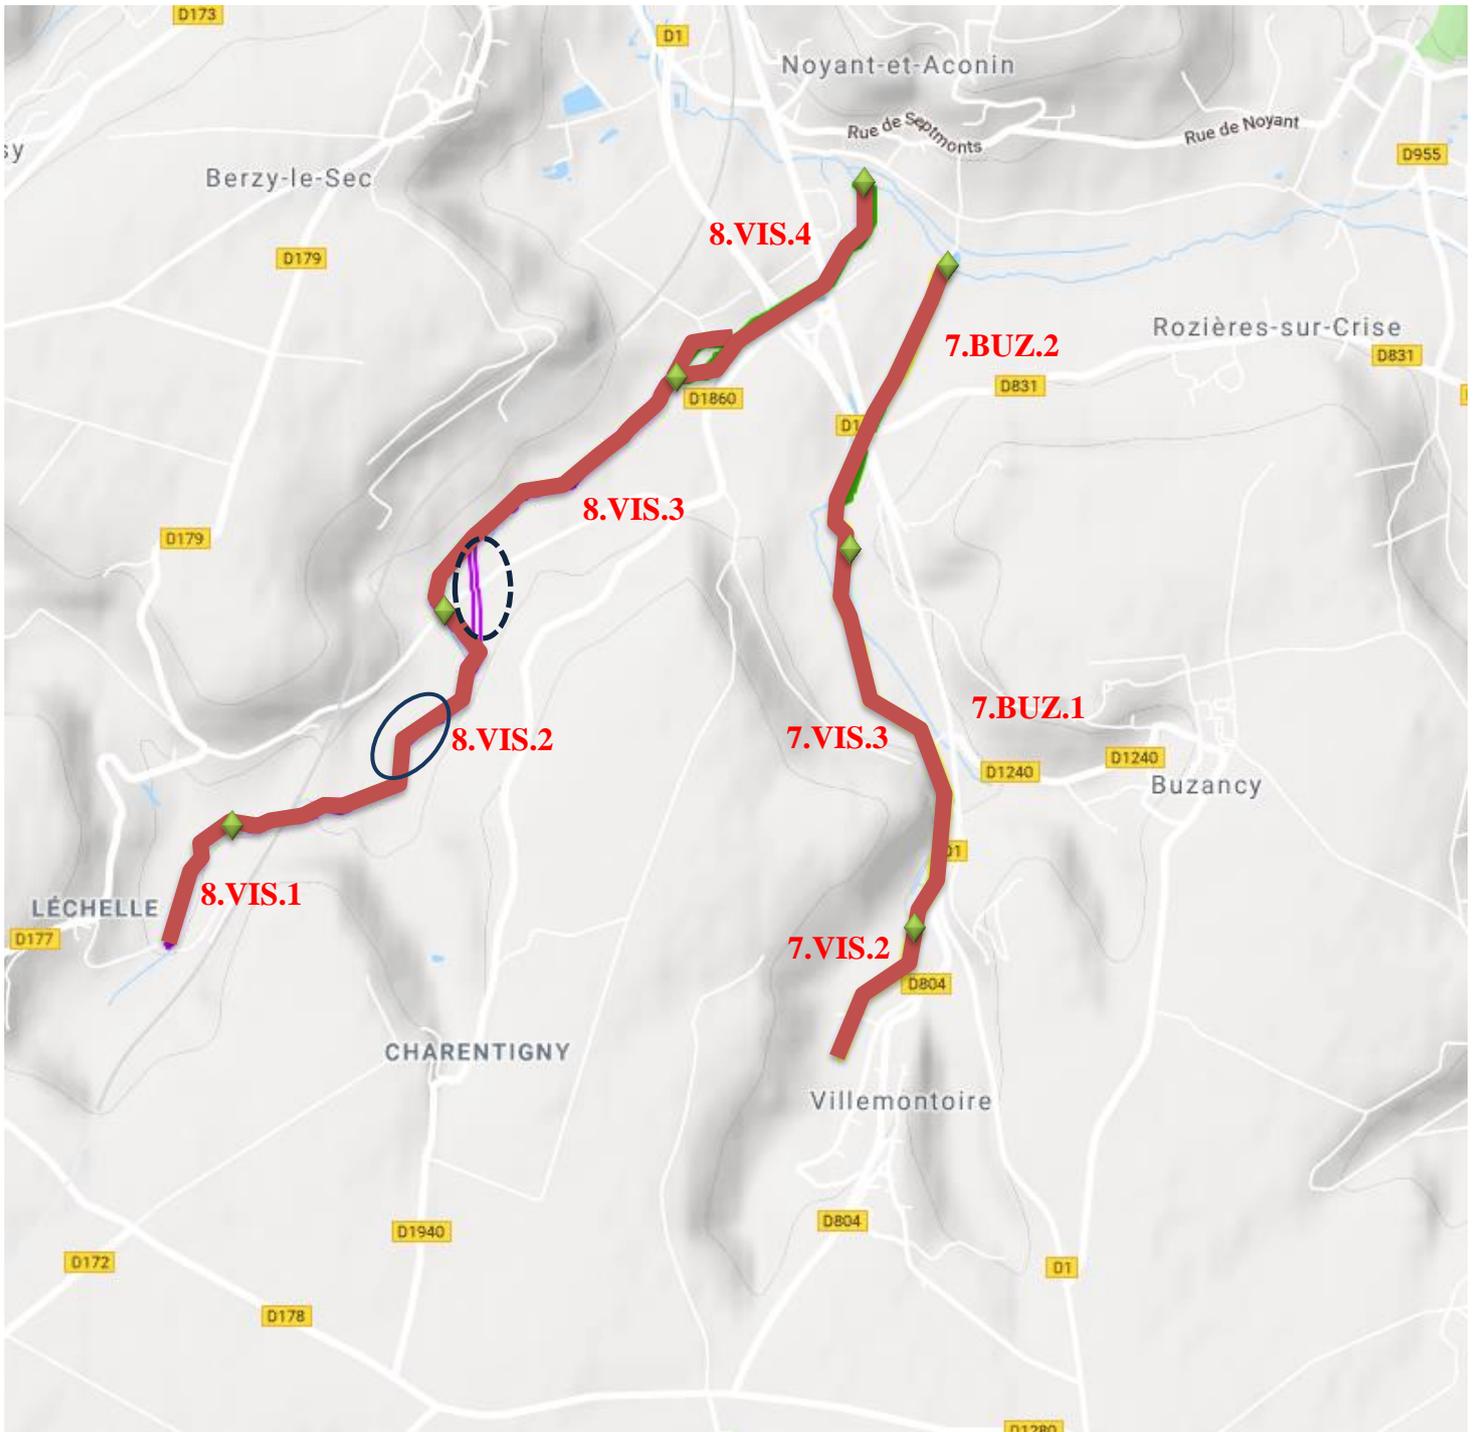

- Linéaire réalisé par l'entreprise
- Linéaire non réalisé : aucune connexion avec le cours d'eau
- ◆ Limite tronçon
- Retrait de 10 peupliers en travers du lit de la rivière
