



Syndicat intercommunal pour l'aménagement du ru de Retz et de ses  
affluents

## Travaux d'entretien du ru de Retz

### TRANCHE TRANSITOIRE

#### Compte-rendu de la réunion de chantier 4 aout 2016

<b>Lieu :</b>	Devant la mairie de d'Ambleny à 14h30
---------------	---------------------------------------

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>Entreprise :</b>
Syndicat intercommunal pour l'aménagement du ru de Retz et de ses affluents	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	FORETS ET PAYSAGES

<b>Nom, Prénom :</b>	<b>Organisme :</b>	Présent	Absent	Excusé
BIARD Daniel	Président du syndicat			√
AUBRY Vincent	Union des syndicats	√		
APPLINCOURT David	Entreprise FORETS ET PAYSAGES	√		
FOURREAUX David	Commune d'Ambleny	√		
PETIT Xavier	Commune d'Ambleny	√		
PETIT Charles-André	Commune d'Ambleny	√		
LAURENT Sebastian	Entreprise FORETS ET PAYSAGES	√		
LANGRAND Pierre	Commune d'Ambleny			
MENVIELLE Erwan	Agence de l'eau Seine-Normandie			√
COZETTE Philippe	Conseil Départemental de l'Aisne			√
LEBRETON Thomas	Entente Oise Aisne			√

- Cette réunion de chantier concerne les travaux d'entretien du ru de Retz (tranche transitoire). Ces travaux ont été confiés à l'entreprise FORETS ET PAYSAGES – (Siège Social : Ferme de la Tour, 59330 BEAUFORT).

## SITUATION ACTUELLE :


- Les travaux d'entretien du ru de Retz sont terminés.
- L'aménagement du seuil d'Ambleny et tous les tronçons ont bien été réalisés.

## DETAIL DES TRAVAUX :

- La majorité de l'entretien végétatif permet d'éviter le développement trop important des ronces et des aubépines sur le cours d'eau (tendance à une fermeture du milieu). Le retrait de la végétation dans le lit améliore l'écoulement de la lame d'eau et des sédiments.



Echancrure dans le seuil d'Ambleny

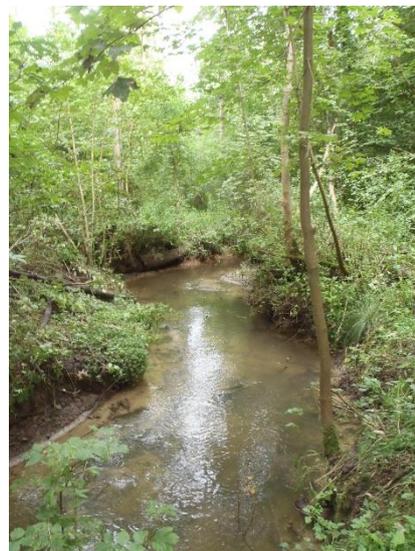

Tronçon Retz 3 après travaux

- Sur le seuil de déversoir de l'ancien moulin d'Ambleny (bras de contournement du seuil ROE 22128) :
  - l'entreprise a réalisé une échancrure de 40 cm dans le fer I
  - retrait des enrochements afin de rétablir la franchissabilité du seuil
- Le seuil ROE22128 est franchissable via le bras de contournement. Les travaux ont permis de rétablir une partie de la continuité écologique du ru de Retz.
- L'épi en technique végétal ne pouvait pas être réalisé dû à la nature du sol. Un épi en enrochement naturel a été réalisé avec les pierres se trouvant dans le lit de la rivière.
- La restauration du lit a permis de recréer un chenal central d'écoulement sur le ru de Retz. Les accélérations produites par la restauration favorisent la circulation des sédiments et limitent l'envasement des fonds. L'entreprise a veillé à conserver les ceintures végétatives intéressantes en pied de berge. Les héliophytes de type iris, jonc, carex, ... n'ont donc subi aucune intervention.
- L'assemblée apprécie la qualité du travail réalisé par l'entreprise.

## REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Les travaux ont été financés par l'Agence de l'Eau Seine Normandie (40%) et le Conseil Départemental de l'Aisne (15%) sur la totalité des travaux. L'Entente Oise Aisne participe au financement des travaux sur la partie continuité écologique à hauteur de 20%.


- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien du ru de Retz, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :

M. Vincent AUBRY – Union des syndicats ..... 03.23.20.36.74

**LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :**

- Cette réunion clôture la tranche transitoire des travaux d'entretien du ru de Retz.

Le service technique,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a long horizontal stroke that tapers to the right.
