

Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise  
**Effacement du seuil de Cœuvres-et-Valsery**

**Ru de Retz**

**Continuité écologique**

**Compte-rendu de la réunion de chantier  
31 juillet 2018**

<b>Lieu :</b>	Rue de l'Abbaye, 02600 Cœuvres-et-Valsery à 9H30
---------------	--

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>Entreprise :</b>
Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	MASCITTI NINO

<b>Nom, Prénom :</b>	<b>Organisme :</b>	Présent	Absent	Excusé
GERAULT Nicolas	Président du Syndicat			✓
REBEROT Nicolas	1 <sup>er</sup> Vice-président du Syndicat	✓		
CHAUVET Eric	2 <sup>ème</sup> Vice-président du Syndicat			✓
HUGE Maurice	Président d'honneur du Syndicat			✓
BRABANT Pierre	Délégué du Syndicat	✓		
GUERIM Marc	Délégué du Syndicat	✓		
BERSON Pascal	Délégué du Syndicat	✓		
MASCITTI Dominique	MASCITTI Nino	✓		
HUCHET William	Union des syndicats	✓		
BRUYANT Monique	Maire de Cœuvres-et-Valsery	✓		
DUGUET Bernard	Riverain	✓		
DUGUET Philippe	Riverain	✓		
LEFEVRE Philippe	Propriétaire du seuil			✓
MOIRE Pascal	Agence Française pour la Biodiversité			✓
	Agence de l'eau Seine-Normandie			✓

	Direction Départemental des Territoires de l'Aisne			√
	Fédération de l'Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique			√

Cette réunion concerne la réunion de chantier des travaux pour l'effacement du seuil de Cœuvres-et-Valsery, ROE 39406. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise MASCITTI NINO (Siège Social : Rue des Bûcherons, 02600 VILLERS-COTTERETS).


### DETAIL DES TRAVAUX :

- *Secteur amont de l'ouvrage :*
- Sur le secteur en amont de l'ouvrage, le pied de berge a été travaillé avec la mise en place de banquettes d'hélophytes.



Création de banquettes et mise en place d'un géotextile en fibre de coco

- Les banquettes ont une hauteur d'environ 30 cm et sont mises en place de manière alternes afin de retrouver un lit d'étiage plus sinueux.
- Un géotextile biodégradable en fibres de coco est disposé sur les banquettes afin de garantir leur stabilité le temps de la repousse des végétaux

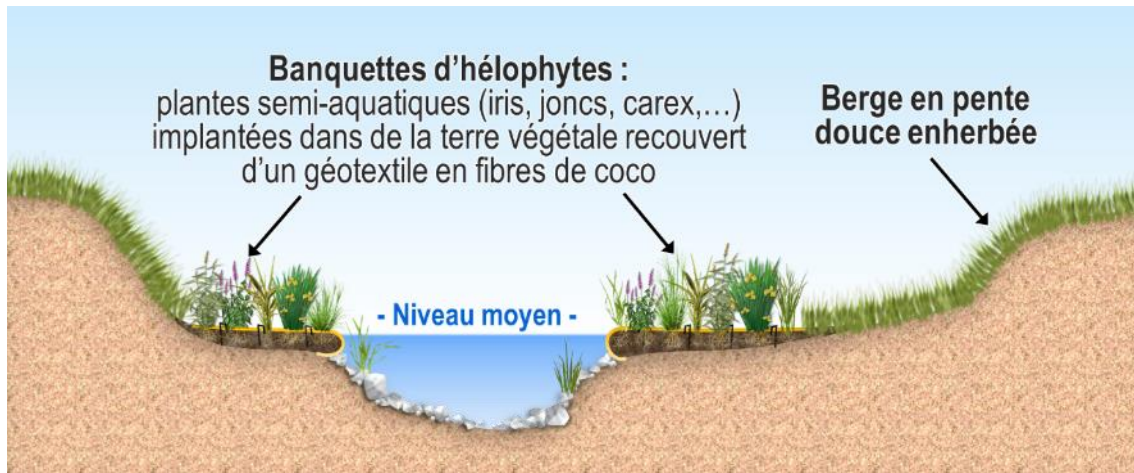

Coupe transversale d'une banquette végétalisée

- Comme indiqué lors de la réunion de chantier précédente, un apport de matériaux graveleux calibre 20/40 mm (2<sup>ème</sup> couche) a été apporté en complément dans le fond du lit de la rivière pour assurer une meilleure cohésion des blocs.
- *Secteur étang :*
- Au cours des travaux pour la création du fossé d'alimentation, l'entreprise a effectué au préalable un nettoyage de l'exutoire de l'étang. Lors du retrait de l'excédent de vase, une des piles de l'ouvrage s'est affaissée dans le cours d'eau.



Pile de l'ouvrage déstabilisée

Ouvrage à l'exutoire de l'étang détérioré.

- L'ouvrage en question se compose d'un béton cyclopéen non ferrillé. L'assise de l'ouvrage étant affouillée, après retrait des sédiments celui-ci a cédé sous son propre poids.
- Après concertation avec l'entreprise et le maître d'œuvre, l'ouvrage déstabilisé sera retiré. Un retalutage de la berge a été préconisé.

#### SUITE DES TRAVAUX :

- Les travaux sont arrêtés temporairement en raison de la fermeture annuelle de l'entreprise MASCITTI NINO.

#### FINANCEMENT

La réalisation de ce programme de travaux est possible grâce au soutien financier de :



#### REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'effacement du seuil de Cœuvres-et-Valsery, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :
  - M. William HUCHET / Geoffrey PACAUD – Union des syndicats ..... 03.23.20.36.74 – 06.07.71.26.60
  - M. Dominique MASCITTI – Entreprise MASCITTI NINO SA ..... 06.12.43.28.43

#### LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

- La prochaine réunion de chantier sera communiquée ultérieurement.

Le service technique,
