

Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise

Programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents

Travaux du LOT 1

TRANCHE 1

Compte-rendu de la réunion de chantier 10 janvier 2018

Lieu :	Etang Muret-et-Crouttes à 9H30
---------------	--------------------------------

Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :
Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	Lot 1 : FORETS ET PAYSAGES

Nom, Prénom :	Organisme :	Présent	Absent	Excusé
GERAULT Nicolas	Président du syndicat			✓
HUGE Maurice	Vice-Président du Syndicat		✓	
LAURENT Sebastien	FORETS ET PAYSAGES	✓		
DE REKENEIRE Claude	Délégué du Syndicat	✓		
HUCHET William	Union des syndicats			✓
	Agence de l'eau Seine-Normandie			✓
	Direction Départemental des Territoires de l'Aisne			✓
	Fédération de l'Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique			✓

- Cette réunion concerne le suivi de chantier du LOT 1 de la tranche 1 du programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise FORETS ET PAYSAGES – (Siège Social : Ferme de la Tour, 59330 BEAUFORT) pour le lot 1 (entretien du lit et des berges) et MASCITTI NINO (Siège Social : Rue des Bûcherons, 02600 VILLERS-COTTERETS) pour les lots 2 (mise en défens de la rivière) et 3 (restauration du lit et des berges – restauration de la continuité écologique).

SITUATION ACTUELLE :

- Après une coupure d'une semaine pendant la période de Noël, les travaux d'entretien de la ripisylve réalisés par l'entreprise Forêts et Paysages ont repris le 2 janvier 2018. Actuellement les tronçons LAU.5 ; LAU.6 sont terminés (cf carte p.5) et l'entreprise se situe sur le LAU.4.
- L'entretien de la ripisylve a permis de réaliser une sélection végétative des arbres en bordure de cours d'eau. Des trouées de lumière ont été ponctuellement réalisées, sur les zones les plus denses, afin de favoriser le développement des végétaux herbacés et arbustifs.
- Les secteurs en cours de réalisation permettront de préparer le terrain pour les futurs travaux dans le lit mineur (LOT 3 du P.P.R.E – Entreprise ETS MASCITTI NINO)
- Les arbres abattus ont été laissés à disposition des propriétaires des parcelles concernées. Les branches de petits diamètres ont été mises en andain (dégradation naturelle) ou brûlées in situ.

Entretien de la ripisylve sur les Tronçons LAU.5 ET LAU.6

- **Commune** : Muret-et-Crouettes
- **Cours d'eau** : la Crise
- **Travaux réalisés** : Entretien ripisylve, 3 380 ml réalisés



[Débroussaillage sur les ronciers et sélection sur la strate arborée](#)



[Tronçon amont seuil étangs de Muret-et-Crouttes avant travaux](#)



[Tronçon amont seuil étangs de Muret-et-Crouttes après travaux](#)

• **Observations :**

L'entreprise a réalisé 3 380 ml d'entretien depuis la dernière réunion de chantier.

Aucune remarque particulière n'a été formulée lors de la réunion.

À REALISER :

- Pour la suite du chantier, l'entreprise FORET ET PAYSAGE va continuer les travaux sur le tronçon Lau.4 en amont des étangs de Murets-et-Crouttes.

REMARQUES, OBSERVATIONS :


- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- En cours de chantier, l'entreprise informera dans la mesure du possible les riverains, de son passage au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour compléter l'information faite par les communes.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien et de restauration de la Crise et de ses affluents, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :
 - M. William HUCHET / Geoffrey PACAUD – Union des syndicats 03.23.20.36.74 – 06.07.71.26.60
 - M. Sébastien LAURENT – Entreprise FORETS ET PAYSAGES 07.76.01.80.28

FINANCEMENT

La réalisation de ce programme de travaux est possible grâce au soutien financier de :



LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

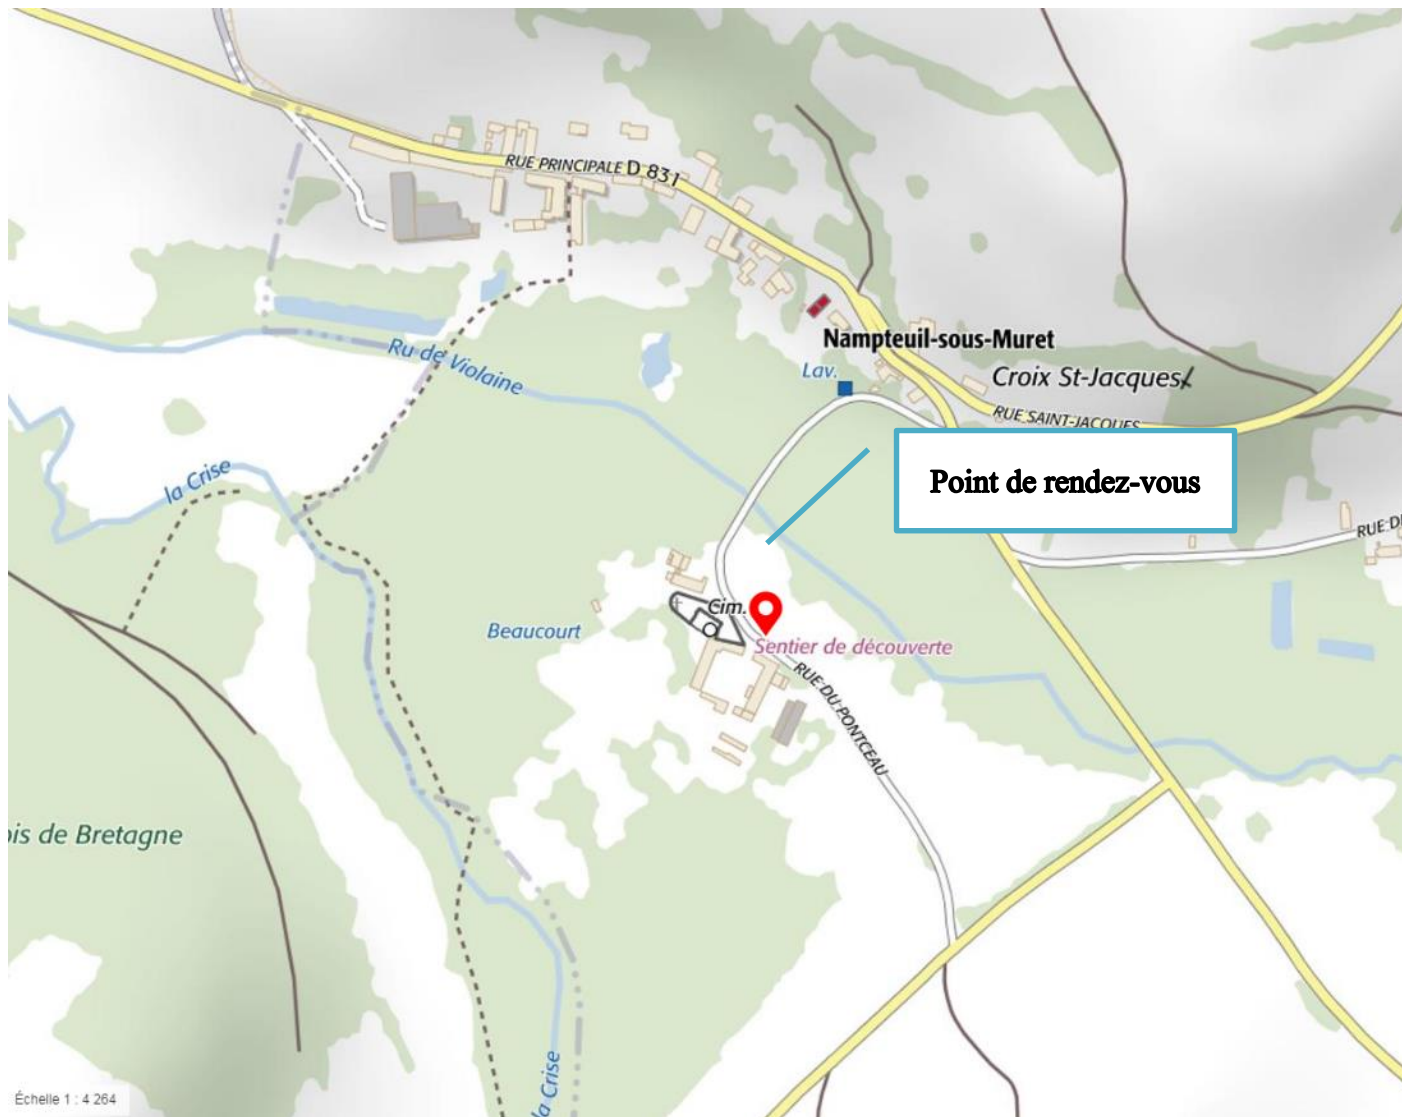

La prochaine réunion de chantier est prévue le **jeudi 25 janvier 2018 à 9h30**, rue du Pontceau, 02200 Nampteuil-sous-Muret


Le service technique,





Programme pluriannuel de restauration de la Crise et de ses affluents

Lot 1 - entretien du lit et des berges : tranche 1

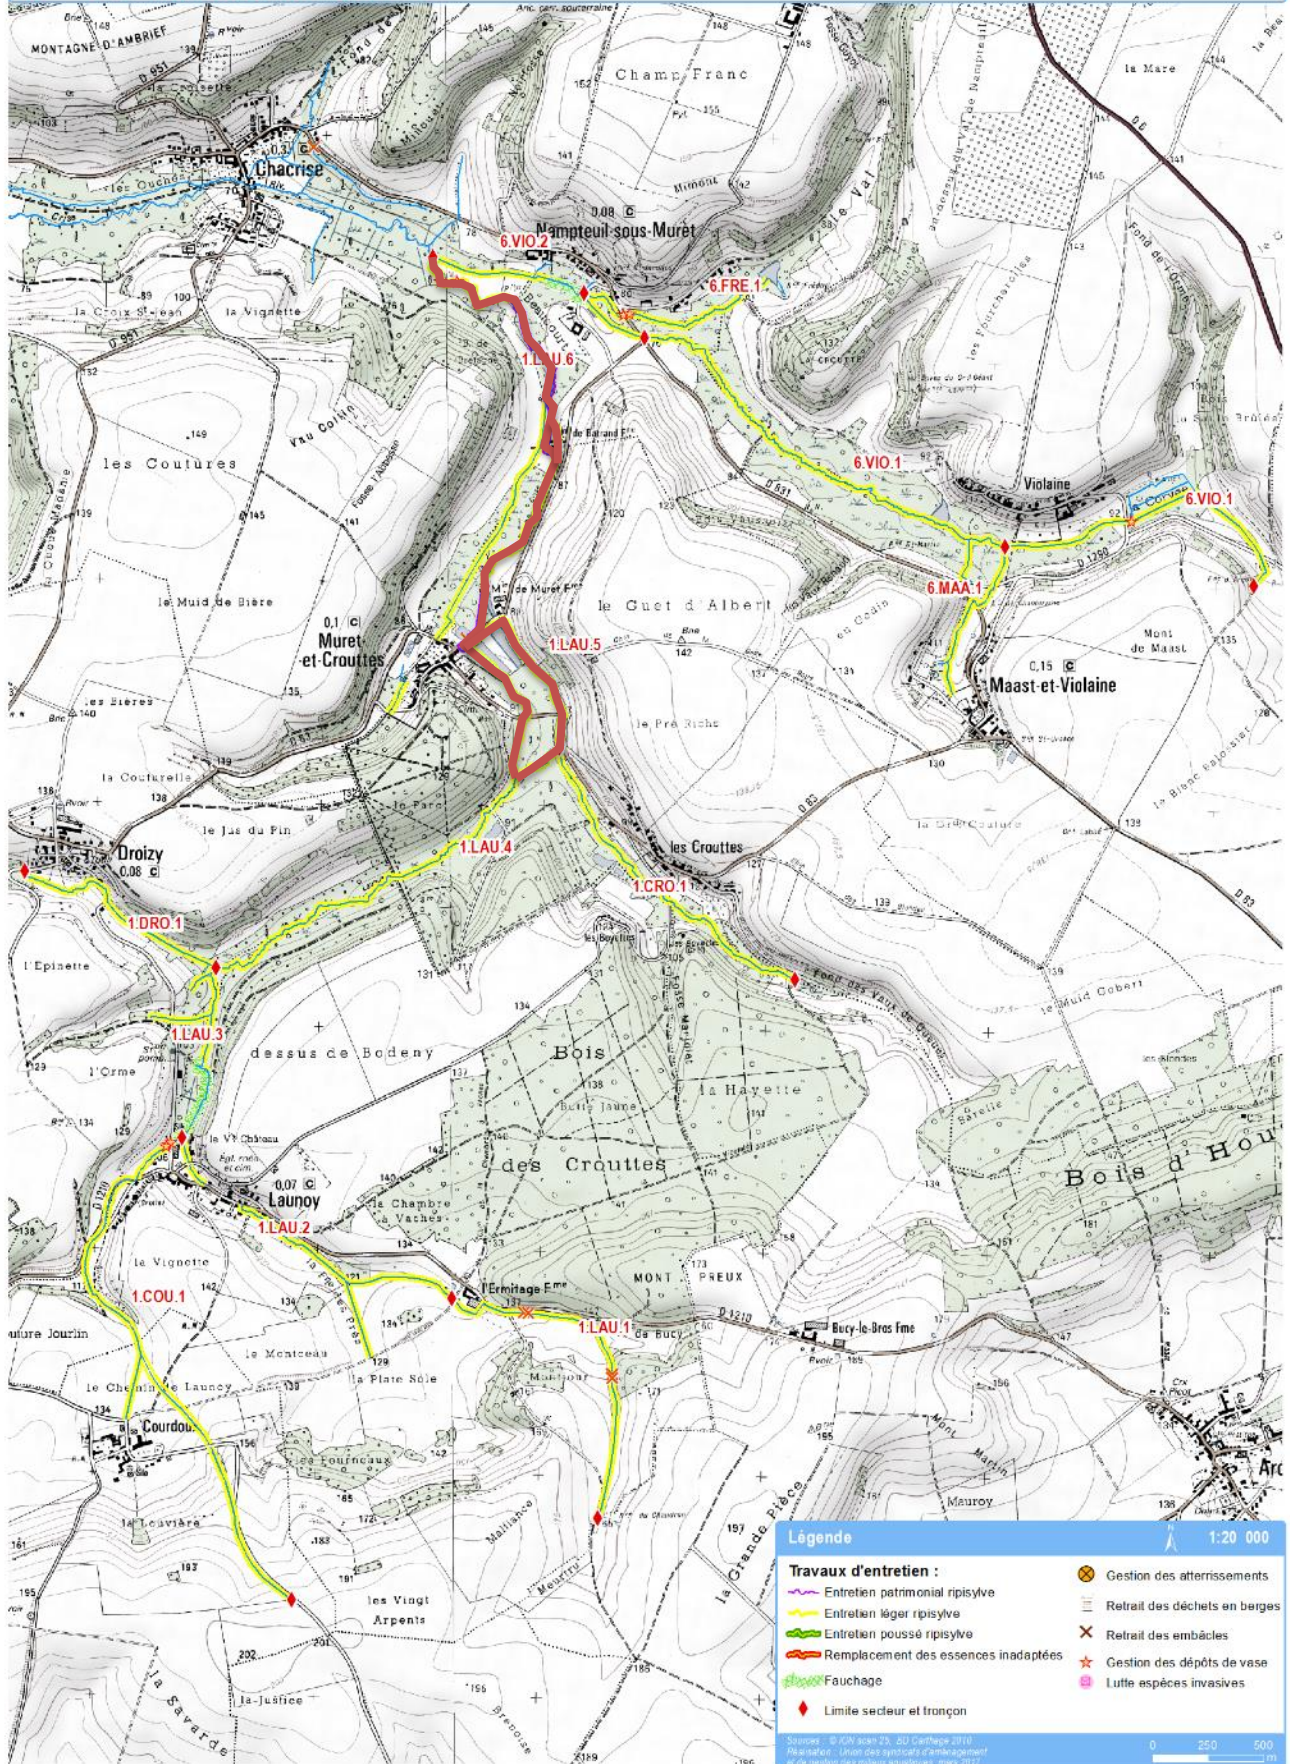

Linéaire réalisé par l'entreprise
