

UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise

Programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents

Travaux du LOT 1 TRANCHE 2 – Site Pilote

Compte-rendu de la réunion de piquetage 15 mars 2018

Lieu:	38 avenue Salvador Allende, 02200 SOISSONS			
Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :		
Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	FORETS ET PAYSAGES		

Nom, Prénom :	Organisme :	Présent	Absent	Excusé
GERAULT Nicolas	Président du syndicat			٧
HUGE Maurice	Vice-Président du Syndicat			
HUCHET William	Union des Syndicats			
PETIT Davy	FORETS ET PAYSAGES			
LEPAGE Dominique	ominique Ville de Soissons Fédération de Pêche			
				٧
	Agence de l'eau Seine-Normandie			٧
	Direction Départemental des Territoires de l'Aisne			٧
Agence Française pour la Biodiversité				٧

Cette réunion concerne le suivi de chantier du LOT 1 de la tranche 2 -Site Pilote- du programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise FORETS ET PAYSAGES – (Siège Social : Ferme de la Tour, 59330 BEAUFORT) pour le lot 1 (entretien du lit et des berges) et MASCITTI NINO (Siège Social : Rue des Bûcherons, 02600 VILLERS-COTTERETS) pour les lots 2 (mise en défens de la rivière) et 3 (restauration du lit et des berges – restauration de la continuité écologique).

SITUATION ACTUELLE:

• L'entreprise FORETS ET PAYSAGES se situe actuellement en aval du tronçon 5.CRI.3 au niveau du pont du boulevard du Tour de Ville.

Entretien de la ripisylve sur le tronçon 5.CRI.3 (parc communal)

• Commune : Soissons

Cours d'eau : la Crise



Avant travaux



Avant travaux

• Travaux réalisés : Entretien ripisylve, 920 ml réalisés



Après travaux



Après travaux



Etêtage à réaliser sur 3 saules

Observations:

- L'entreprise FORETS ET PAYSAGES a réalisé 920 ml d'entretien depuis la dernière réunion de chantier.
- L'entretien de la ripisylve a permis de réaliser une sélection végétative des arbres en bordure de cours d'eau.
 Des trouées de lumière ont été ponctuellement réalisées, sur les zones les plus denses, afin de favoriser le développement des végétaux herbacés et arbustifs.
- Les embâcles ont été retirés du lit afin de restaurer la dynamique d'écoulement
- L'étêtage de 3 saules reste à réaliser sur le tronçon 5.CRI.3.
- Un passage de l'entreprise FORETS ET PAYSAGES sur l'ensemble du linéaire sera effectué pour ramasser et évacuer les déchets présents sur les berges.

À REALISER:


• Pour la suite du chantier, l'entreprise FORETS ET PAYSAGES va continuer les travaux d'entretien de ripisylve sur le secteur de Vauxbuin en amont de la N2 (tronçon 4.CRI.7).

REMARQUES, OBSERVATIONS:

- En cours de chantier, l'entreprise informera dans la mesure du possible les riverains, de son passage au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
- Lors de la phase travaux, l'accès au public sera interdit sur les secteurs en cours de réalisation. Le périmètre d'intervention sera matérialisé par de la rubalise ainsi que des panneaux de chantier.
- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien et de restauration de la Crise et de ses affluents, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

La prochaine réunion de chantier est prévue le **jeudi 29 mars 2018 à 11h00**, rue Alain Langlet 02200 VAUXBUIN.

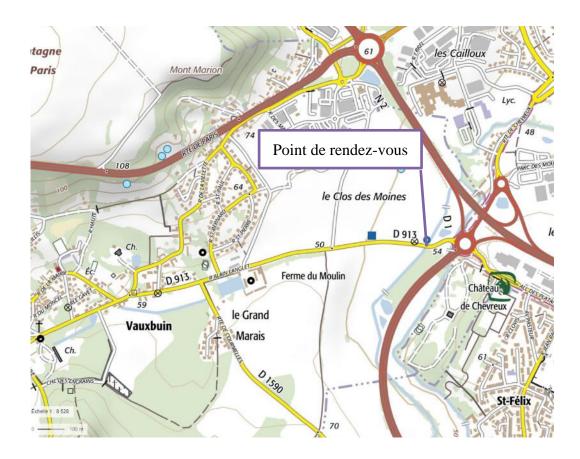

Le service technique,



