

Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise

## Programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents

### Travaux du LOT 1

### TRANCHE 3

#### Compte-rendu de la réunion de chantier 21 février 2019

<b>Lieu :</b>	4 rue Marie Thérèse Aubert 02200 Berzy-le-Sec (lieudit Léchelle)
---------------	--

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>Entreprise :</b>
Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	Lot 1 : FORETS ET PAYSAGES

<b>Nom, Prénom :</b>	<b>Organisme :</b>	Présent	Absent	Excusé
GERAULT Nicolas	Président du syndicat			✓
CHAUVET Eric	2 <sup>ème</sup> Vice-Président du Syndicat			✓
LANSOY Daniel	Délégué de Villemontoire	✓		
LAURENT Sebastien	FORETS ET PAYSAGES	✓		
PREVOST Jean-Marie	FORETS ET PAYSAGES	✓		
HUCHET William	Union des syndicats	✓		
BONNEMENT Edouard	Riverain du Visigneux	✓		
PROVINI CLAUDE	Riverain de la Crise			✓
	Agence de l'eau Seine-Normandie			✓
	Direction Départemental des Territoires de l'Aisne			✓
	Fédération de l'Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique			✓
	Agence Française pour la Biodiversité			✓

- Cette réunion concerne le suivi de chantier du LOT 1 de la tranche 3 du programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Crise et de ses affluents. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise FORETS ET PAYSAGES – (Siège Social : Ferme de la Tour, 59330 BEAUFORT) pour le lot 1 (entretien du lit et des berges) et MASCITTI NINO (Siège Social : Rue des Bûcherons, 02600 VILLERS-COTTERETS) pour les lots 2 (mise en défens de la rivière) et 3 (restauration du lit et des berges – restauration de la continuité écologique).

## SITUATION ACTUELLE :

L'entretien de la végétation rivulaire a débuté sur le cours d'eau du Visigneux.

### Entretien de la ripisylve sur les tronçons 8.VIS.1, 8.VIS.2 et 8.VIS.3

- **Commune** : Berzy-le-Sec
- **Cours d'eau** : le Visigneux
- **Travaux réalisés** : Entretien ripisylve, 3 431 ml réalisés



[Photo après travaux \(Tronçon 7.VIS.1\)](#)



[Photo après travaux \(Tronçon 8.VIS.2\)](#)



[Photo après travaux \(Tronçon 7.VIS.3\)](#)



[Photos tronçons 8.VIS.3 : frênes problématiques](#)

- **Observations :**

- L'entreprise FORETS ET PAYSAGES a réalisé 3 431 ml d'entretien depuis le début du chantier sur le ru du Visigneux.
- Un premier passage est réalisé manuellement puis un second sera effectué l'aide d'une pelle mécanique sur certains secteurs. Le second passage va permettre de retirer 10 peupliers en travers du cours d'eau ainsi qu'une cépée de frêne en bordure de la route D179.
- L'entretien de la ripisylve a permis de réaliser une sélection végétative des arbres en bordure de cours d'eau. Des trouées de lumière ont été ponctuellement réalisées, sur les zones les plus denses, afin de favoriser le développement des végétaux herbacés et arbustifs.
- Les arbres abattus ont été laissés à disposition des propriétaires des parcelles concernées. Les branches de petits diamètres ont été mises en andain (dégradation naturelle).
- Les embâcles, encombres et déchets ont été retirés du lit afin de restaurer la dynamique d'écoulement.

### À REALISER :

- L'entreprise FORETS ET PAYSAGES va débiter un premier passage (entretien manuel) sur le ru de Buzancy sur les tronçons 7.VIL.2 et 7.VIL.3
- - **Suivi :**
    - Un outil de suivi est mis à la disposition des personnes qui le souhaitent afin de suivre en temps réel l'avancement de l'entreprise.
    - Cet outil permet de localiser les tronçons sur une carte dynamique et de suivre l'évolution des travaux.

L'outil est accessible via le lien ci-dessous :

<https://drive.google.com/open?id=1kjVGZnB8nZXSqMRJYBfonVcRSVRYU61a&usp=sharing>

## REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien et de restauration de la Crise et de ses affluents, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :
  - M. William HUCHET / Geoffrey PACAUD – Union des syndicats ..... 03.23.20.36.74 – 06.07.71.26.60
  - M. Sébastien LAURENT – Entreprise FORETS ET PAYSAGES ..... 07.76.01.80.28

## FINANCEMENT

La réalisation de ce programme de travaux est possible grâce au soutien financier de :




## LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

La prochaine réunion de chantier vous sera communiquée prochainement.

Le service technique,

Annexe 1 : Linéaire d'entretien de la végétation réalisé

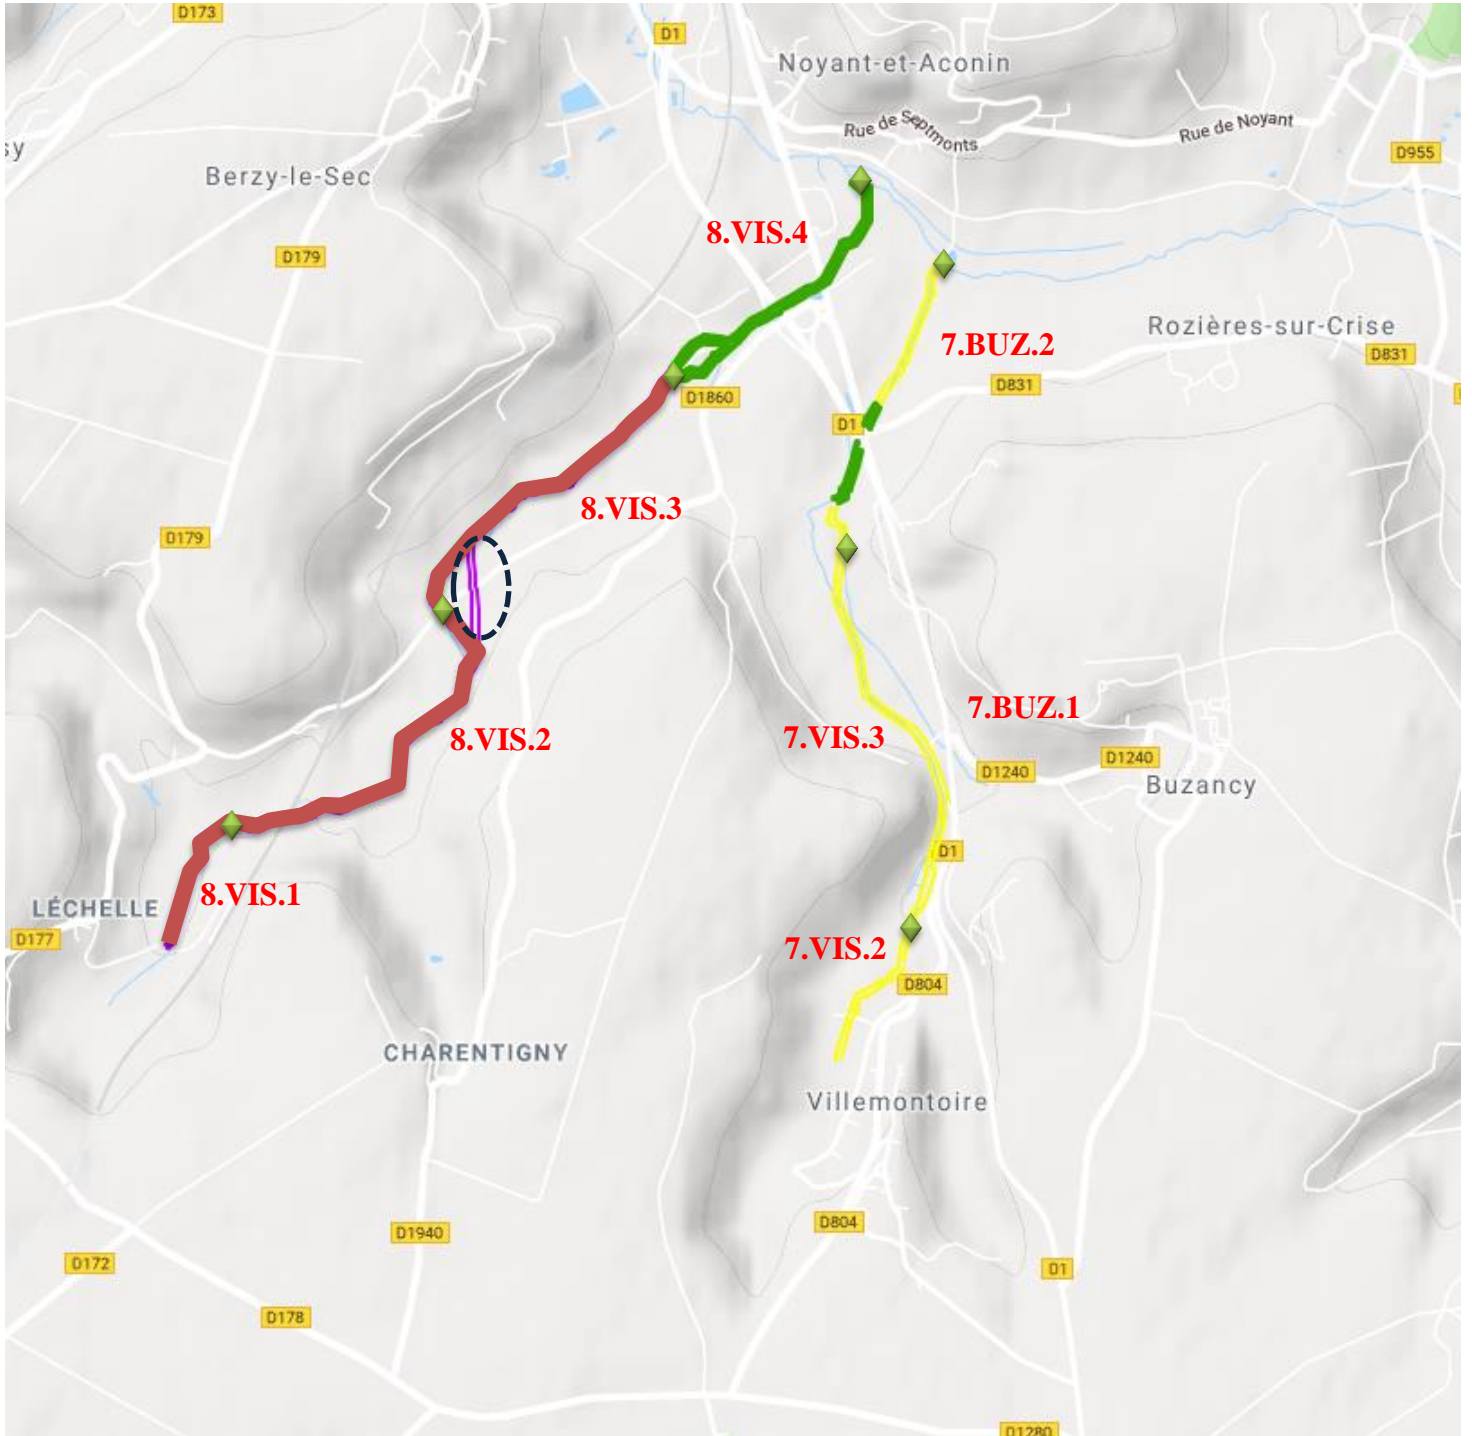

- Linéaire réalisé par l'entreprise
- Linéaire non réalisé : aucune connexion avec le cours d'eau
- ◆ Limite tronçon
