



UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT  
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT POUR LA GESTION  
DU BASSIN VERSANT DE L'OURCQ AMONT

«Civilité» «Nom\_prénom»

«Adresse\_1»

«Adresse\_2»

«Code\_Postal» «Ville»

## Programme de Restauration du ru d'Allan

### Tranche 2

#### Compte-rendu de la réunion de chantier 14 avril 2015

• <b>Lieu :</b>	Devant la mairie de Priez à 09h30
-----------------	-----------------------------------


• <b>Maître d'ouvrage :</b>	• <b>Maître d'œuvre :</b>	• <b>Entreprise :</b>
Syndicat intercommunal pour la Gestion du Bassin Versant de l'Ourcq amont	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques <i>(mise à disposition du Syndicat)</i>	Forêts et Paysages

• <b>Nom, Prénom :</b>	• <b>Organisme :</b>	Présent	Absent	Excusé
LEVEQUE Yves	Président du syndicat			✓
AUBRY Vincent	Union des syndicats d'aménagement	✓		
APPLINCOURT David	Entreprise Forêts et Paysages			✓
BAHU Yves	Maire de Priez	✓		
MANGELINCK Ludovic	Agent technique du syndicat	✓		
KRAMP Jean-Claude	Agent technique du syndicat	✓		
LEGUILLETTE Jean-Marie	Adjoint mairie de Sommelans	✓		
HANCART Jérémy	Entreprise Forêts et Paysages	✓		
KAMICHE Éric	Commune de St Gengoulph	✓		
LABOUREL Sabine	Agence de l'Eau Seine-Normandie			✓
GUYOT Pascal	Entente Marne			✓

Le programme pluriannuel de restauration du ru d'Allan a été confié, après appel d'offres, à l'entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)


- SITUATION ACTUELLE :

- Les travaux de restauration du ru d'Allan et de ses affluents se poursuivent. Les tronçons ALD et ALF sont terminés.
- L'entreprise se trouve actuellement sur le tronçon ALC.

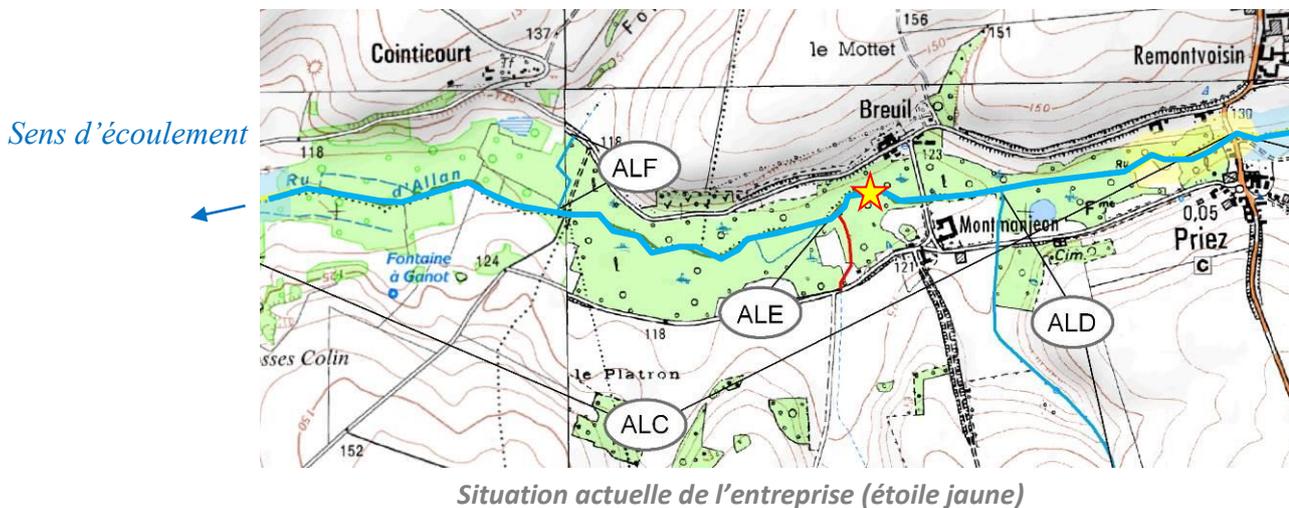

- DETAIL DES TRAVAUX :

- La gestion réalisée jusqu'à présent est manuelle. Les bucherons n'ont pas eu besoin d'assistance mécanique particulière. L'arrivée de la pelle se fera en fin de chantier afin de réaliser les enlèvements d'embâcles et les abattages d'arbres complexes.
- Dans le secteur boisé du tronçon ALC, l'entreprise laissera volontairement dans le lit de la rivière des amalgames ligneux afin de dynamiser les écoulements et créer des zones d'accélération potentielles au désenvasement des fonds (*apparition potentielle de substrat grossier dans les zones décolmatées, celui-ci servira d'habitat pour la faune local : piscicoles, microinvertébrés*).

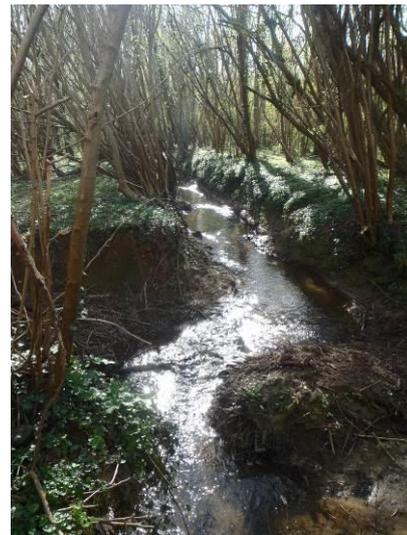

Ru d'Allan après la gestion de la ripisylve et du lit

- L'entreprise repassera en fin de semaine sur tous les abreuvoirs afin de couper les tiges filetées trop longues et de retirer un excès de cailloux au pied du basting coté cours d'eau sur l'abreuvoir le plus en amont.



Exemple des tiges filetées trop longues



Abreuvoir après rehausse des lisses

- Les consignes du maître d'œuvre, basées sur le retrait de la végétation encombrante et sur la sélection végétative des ligneux, ont été correctement appliquées. Le ru d'Allan a ainsi retrouvé sur ce secteur un bon écoulement et une dynamique intéressante via les embâcles naturels conservés (souches, branches ...).

• **REMARQUES, OBSERVATIONS :**

- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. APPLINCOURT David – Entreprise Forêts et Paysages ..... 06.07.87.95.13  
 M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats ..... 03.23.20.36.74  
 Les agents du Syndicats de l'Ourcq amont ..... 06.81.73.01.72  
 ..... 06.26.79.45.38

• **LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :**

- La prochaine réunion de chantier aura lieu **le mardi 21 avril 2015, à 09h30 devant la Mairie de PRIEZ.**

*Voir plan ci-contre*

Le service technique,

